


Rapport technique et financier des 5 forages « Eau pour tous »

Ce rapport fait partie des exigences du contrat 191 du 14/09/2020, pour la remise des 20% restants de la première tranche de subventions PPECF (correspondant à 4 133 Euros).

Ces 5 forages (voir carte ci-dessous) ont été construits par la société ASPERBRAS, attributaire d'un marché d'hydraulique villageoise de 4.000 forages (toujours en cours d'exécution appelé « Eau pour tous » sous la maîtrise d'ouvrage de l'Agence Nationale de l'Hydraulique rurale. Ces forages sont situés dans le district de Mokéko, Sous -Préfecture.

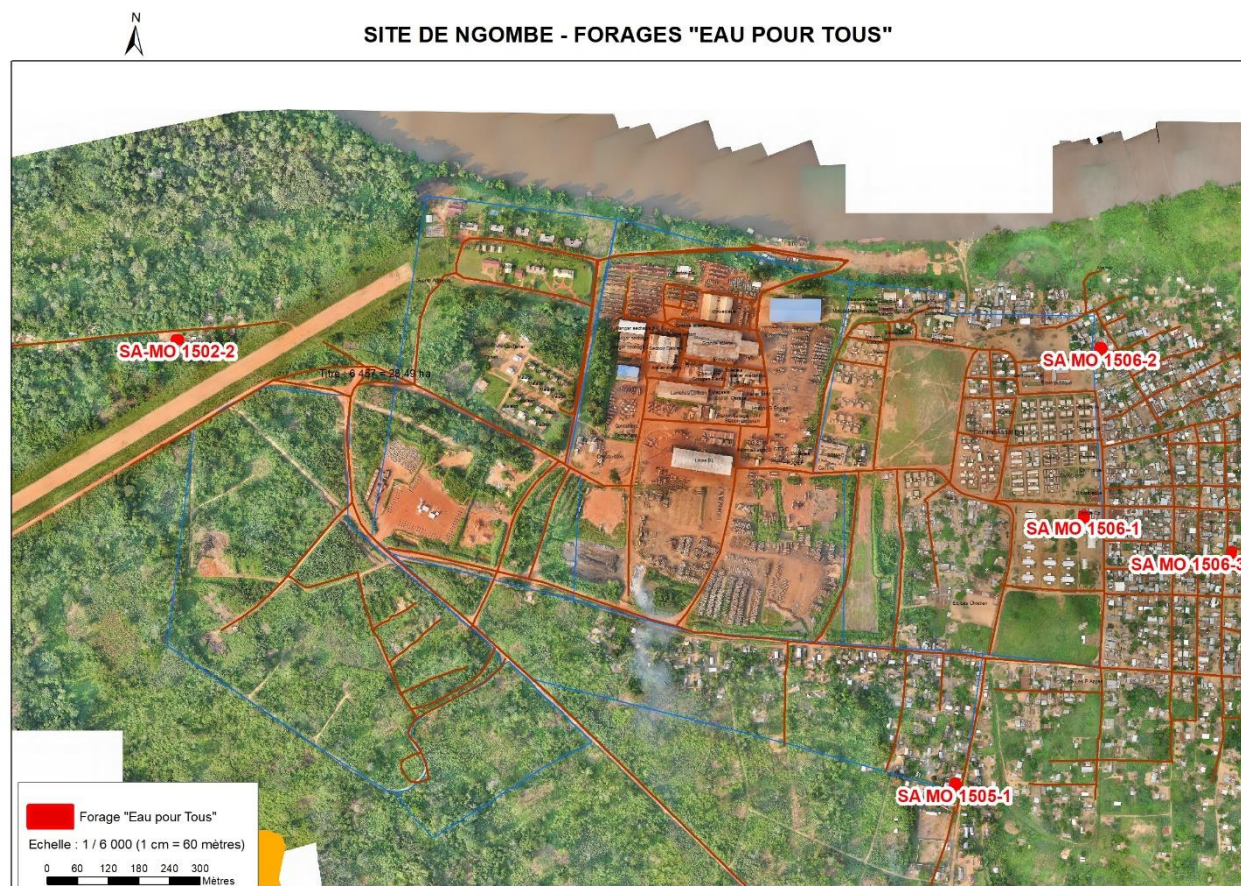

1. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES¹

- Signature d'un contrat 191 entre IFO et PPECF : 14 Sept 2020
- Mission initiale ASPERBRAS d'évaluation des réparations (2 techniciens) : Août 2020 (rapport)
- Mission 1 ASPERBRAS de réparations (2 techniciens) : 07 au 09 Février 2021 (rapport)
- Signature d'un avenant 1 au Contrat 191 : 13 Avril 2021
- Mission 2 ASPERBRAS de réparations (2 techniciens) : 16 au 19 Avril 2021
- Signature d'un Accord de Gestion par les représentants du village de Ngombé (21 Avril 2021)
- Réception par la Sous - Préfecture de Mokéko, des forages Eau pour tous (Compte-Rendu) : 5 Juin 2021

¹ Documents en annexe

2. CHRONOGRAMME DES PAIEMENTS

3. EXPLICATIONS

La société ASPERBRAS, maître d'œuvre des Forages « Eau pour tous » a effectué 3 missions successives, dont deux pour réparer 5 forages de la localité de Ngombé. Une réunion de consultation / sensibilisation a été effectuée avec les représentants du village (Comité) pour préciser le mode de gestion de ces forages, résumé dans le document d'accord de gestion. La gestion de ces forages relève du Comité du village

Comme il est indiqué dans les rapports de travaux ASPERBRAS, après chaque mission, les forages ont subi des actes de vandalisme.

Constat initial Aout 2020 : 1 forage en panne / 4 forages vandalisés, vol de matériel

Constat avant le 07 Février 2021 : 5 forages vandalisés, vol de matériel

Constat avant le 16 avril 2021 : 1 forage inutilisable (casse de matériel)

Cela a contribué à :

- Augmenter le devis initial de demande de subvention (20 661 euros)
- Faire un avenant au Contrat initial pour une subvention complémentaire (3 100 euros) début avril
- Un forage parmi les 5 forages (SA- MO 1506-1), n'a pas pu être remis en état après la mission d'avril 2021 : acte de vandalisme entre le mois de février et le mois d'avril 2021. Il s'agissait de refaire entièrement ce forage, selon l'avis des techniciens ASPERBRAS
- Une enquête est en cours, par le commissariat de Police de Ngombé, pour identifier les personnes ayant vandalisé le 5^{ème} forage (entre février et avril)
- Après la mission du mois d'avril 2021, un autre forage est tombé en panne (SA-MO 1506-3) en date du 09 mai 2021 (problème pour enclencher le captage d'eau, qui sera réglé avec la transmission du manuel d'utilisation des forages), ainsi 3 forages sont actuellement actifs.

Le comité de gestion des forages est actuellement en place et veille au bon fonctionnement. L'investissement et l'entretien des forages sont indispensables pour fournir de l'eau potable à la population de Ngombé, supporter les actions contre le Coronavirus (trop des personnes devant peu des forages d'eau ; risque de contamination avec le virus) et d'éviter une surconsommation d'eau destinée aux ayants droits de IFO. Ce qui pourrait augmenter la consommation de la station de traitement de IFO, qui risque d'atteindre saturation.

Travail encore à programmer avec Asperbras :

- Protection des panneaux solaires sur 4 forages

Interventions ASPERBRAS et forages finalisés et fonctionnels

SA MO 1506 - 1



SA MO 1505-1



SA MO 1506-2



SA MO 1506-3



SA MO 1505-2

