



# COMMISSION DES FORÊTS D'AFRIQUE CENTRALE COMIFAC

## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'EXPLOITATION CERTIFIÉE DES FORÊTS PHASE II & III (PPECF II & III)

BMZ 2015 68 203 & BMZ 201867845



Septembre 2023

12<sup>ème</sup> rapport semestriel

Avril 23 à Septembre 23

Un projet cofinancé par  
la République Fédérale  
d'Allemagne au travers de  
la KfW Entwicklungsbank



Ce rapport a été préparé par :

- Romain LORENT, chef d'équipe
- Nicolas PERTHUISOT, expert en certification forestière
- Eric DASSIE, expert en suivi & évaluation et communication
  
- Michel MIDRÉ (Backstopping ECO Consult)
- Jean-Paul GRANDJEAN (Backstopping Oréade-Brèche)

Pour  
**Le Secrétariat exécutif de la COMIFAC**  
Yaoundé, Cameroun  
et  
**La Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)**  
Francfort, Allemagne et  
Yaoundé, Cameroun

Contact :

**Romain LORENT**

Coordinateur du Programme « Promotion de l'exploitation certifiée des forêts »

Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)

Téléphone : + 237 6 70 66 85 16

Email : [romain.lorent@eco-consult.com](mailto:romain.lorent@eco-consult.com)

Skype : romain\_lorent

Site web: [www.ppecf-comifac.com](http://www.ppecf-comifac.com)

Les services de consultant sont apportés par :

**Chef de file :**

ECO Consult Sepp &  
Busacker  
Partnerschaft  
Hersfelder Straße 17  
36280 Oberaula, Allemagne  
Tél. : +49 (0) 66 28 83 73  
Fax : +49 (0) 66 28 80 16



**en association avec :**

Oréade Brèche  
70, Rue de l'Église  
67130 Schirmeck, France  
Tél. : +33 (0) 3 88 49 64 35  
Fax : +33 (0) 3 88 49 66 24



## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. RESUME DES ACTIONS DU SEMESTRE</b>                                                                 | <b>7</b>  |
| PREAMBULE                                                                                                | 7         |
| RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES GROUPES-CIBLES                                                               | 7         |
| <b>2. BREF RESUME DU PROGRAMME</b>                                                                       | <b>12</b> |
| <b>3. MESURES/ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PENDANT LE SEMESTRE</b>                                           | <b>18</b> |
| 3.1. AXE I : LES CONDITIONS CONCEPTUELLES ET INSTITUTIONNELLES POUR LA CERTIFICATION SONT MISES EN PLACE | 18        |
| 3.2. AXE II : LA QUALITE DE L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE EST AMELIOREE                                    | 25        |
| 3.3. AXE III : « LA COMMUNICATION »                                                                      | 53        |
| 3.4. DEMANDES DE NON OBJECTION (DNO) EN COURS                                                            | 57        |
| <b>4. SUIVI EVALUATION DE LA CgP</b>                                                                     | <b>58</b> |
| 4.1. SUIVI-ÉVALUATION DES INTERVENTIONS DU PROGRAMME                                                     | 58        |
| 4.2. SUIVI ÉVALUATION DES INDICATEURS DU PROGRAMME                                                       | 59        |
| <b>5. TABLEAU DES ENGAGEMENTS AU 30 SEPTEMBRE 2023 (PPECF II ET PPECF III)</b>                           | <b>62</b> |
| <b>6. RECOMMANDATIONS</b>                                                                                | <b>79</b> |
| <b>7. RECAPITULATIF DES PRINCIPALES ACTIVITES DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE</b>                              | <b>82</b> |
| 7.1. PRÉPARATION/SUIVI DES DNO                                                                           | 82        |
| 7.2. PARTICIPATION DE LA CgP AUX RÉUNIONS                                                                | 83        |
| 7.3. MISSIONS DE DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DU COACHING PPECF                                              | 84        |

## Sigles et abréviations

---

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AAC     | Assiette annuelle de coupe                                                       |
| ACV     | Analyse du cycle de vie                                                          |
| AFD     | Agence Française de Développement                                                |
| APV     | Accords de Partenariat Volontaires                                               |
| ANO     | Avis de non-objection                                                            |
| ATIBT   | Association Technique Internationale des Bois Tropicaux                          |
| BAD     | Banque Africaine de Développement                                                |
| BMZ     | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung             |
| BV      | Bureau Veritas                                                                   |
| CAFI    | Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale                                      |
| CDO     | Comité de Décision et d'Orientation                                              |
| CEEAC   | Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale                            |
| CEFDHAC | La Conférence sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale |
| CEMAC   | Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale                            |
| CgP     | Cellule de gestion du PPECF                                                      |
| CIB     | Carrefour International du Bois                                                  |
| CIFOR   | Centre International de Recherches sur les Forêts                                |
| COC     | Chain of Custody                                                                 |
| CLIP    | Consentement Libre Préalablement Informé                                         |
| COMIFAC | Commission des forêts d'Afrique centrale                                         |
| Cnn     | Contrat n° nn                                                                    |
| CPI     | Court Pénale Internationale                                                      |
| CU      | Control Union                                                                    |
| CW      | Control Wood                                                                     |
| CTWPDA  | China Timber & Wood Products Distribution Association                            |
| DNO     | Demande de non objection (KfW ou COMIFAC) portant sur un ANO                     |
| DREIC   | Délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération      |
| EFI     | European forest institute <sup>1</sup>                                           |
| EFI(R)  | Exploitation forestière à impact réduit                                          |
| F&P     | Fair&Precious                                                                    |
| FAQ     | Foire aux questions                                                              |
| FDES    | Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire                               |
| FLEGT   | Forest Law Enforcement, Governance and Trade                                     |

---

<sup>1</sup> <https://efi.int/barcelona>

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FSC®       | Forest Stewardship Council                                                       |
| FSC® -CW   | FSC® -Controlled Wood                                                            |
| FSC® -FM   | FSC® -Forest management                                                          |
| GES        | Gaz à effet de serre                                                             |
| GFBC       | Groupeement de la Filière Bois du Cameroun                                       |
| GGSC       | Global Green Supply Chain                                                        |
| GIE        | Groupeement d'intérêt économique                                                 |
| HSE        | Hygiène Sécurité Environnement                                                   |
| HVC        | Haute Valeur de Conservation                                                     |
| ICV        | Inventaire du cycle de vie                                                       |
| IFL        | Intact Forest Landscapes (Paysages forestiers intacts)                           |
| INC        | Industriel Non Concessionnaire                                                   |
| ISEAL      | International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (UK) |
| ITTO/ OIBT | International Tropical Timber Organization                                       |
| KFW        | Kreditanstalt für Wiederaufbau                                                   |
| LDI        | Lutte contre la déforestation importée                                           |
| LKTS       | Lesser Known Timber Species                                                      |
| LS         | LegalSource (Preferred by nature)                                                |
| MGR        | Malaysian Grading Rules                                                          |
| MIT        | <a href="https://www.mit.edu/">https://www.mit.edu/</a>                          |
| OC         | Organisme de certification (Bureau Veritas, Control Union, Preferred by nature)  |
| ODD        | Objectif de développement durable des Nations Unies                              |
| OLB        | Origine de Légalité des Bois                                                     |
| ONG        | Organisation Non Gouvernementale                                                 |
| PACL       | Peuples autochtones et communautés locales                                       |
| PAFC       | Pan African Forest Certification                                                 |
| P by N     | Preferred by Nature                                                              |
| PCI        | Principes, Critères et Indicateurs des standards de gestion forestière           |
| PPECF      | Programme de Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts                    |
| PIPC       | Permanent Indigenous Peoples' Committee (FSC®)                                   |
| PSRF       | Programme de sécurisation des recettes forestières                               |
| PTBA       | Plan de Travail et Budget Annuel                                                 |
| QHSE       | Qualité Hygiène Sécurité Environnement                                           |
| RCA        | République Centre Africaine                                                      |
| RBUE       | Règlement Bois de l'Union Européenne                                             |
| RDC        | République Démocratique du Congo                                                 |

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| RDUE       | Règlement sur la Déforestation de l'Union Européenne              |
| RIL-C      | Reduced impact logging for climate change mitigatio               |
| SE COMIFAC | Secrétaire exécutif de la COMIFAC                                 |
| SDR        | Système de diligence raisonnée                                    |
| TDR        | Termes De Références                                              |
| TTT        | Tropical timber trade facility (futur programme GIZ)              |
| TLV        | Timber Legality Verification (Control Union)                      |
| TUNAC      | Tunisian Accreditation Council / Conseil Tunisien d'accréditation |
| UE         | Union européenne                                                  |
| UFA        | Unité Forestière d'Aménagement                                    |
| UFIAG      | Union forestière des industries asiatiques du Gabon               |
| UFIGA      | Union des Forestiers Industriels du Gabon et Aménagistes.         |
| VIE        | Volontaire international expatrié                                 |
| VLC        | Verification of Legal Compliance                                  |
| WCS        | Wildlife Conservation Society                                     |

## 1. Résumé des actions du semestre

### Préambule

---

Un nouveau plaidoyer en faveur d'une exploitation durable des forêts naturelles, pourrait venir du fait que de nombreux scientifiques nous avertissent aujourd'hui, que la plantation massive d'arbres qui réduisent les forêts à des masses homogènes, risquerait de faire plus de mal que de bien, en particulier dans les régions tropicales, où la monoculture peut conduire à la disparition d'écosystèmes complexes.

*« La société a réduit la valeur de ces écosystèmes à un seul paramètre : le carbone », écrivent les scientifiques d'universités britanniques et sud-africaines. La capture du carbone est « un petit élément des fonctions écologiques essentielles que remplissent les forêts tropicales et les écosystèmes herbeux », expliquent-ils dans un article publié dans la revue Trends in Ecology and Evolution<sup>2</sup>.*

L'un de ces scientifiques, Jesus Aguirre Gutierrez<sup>3</sup>, cite des exemples dans le sud du Mexique et au Ghana, où des forêts autrefois diverses « se sont transformées en masses homogènes ». Cela les rend « très vulnérables aux maladies et a un impact négatif sur la biodiversité locale », explique le chercheur de l'Institut du changement environnemental de l'Université d'Oxford.

En effet, ces plantations sont dominées par cinq espèces d'arbres choisies en grande partie pour leur valeur en bois et en pâte à papier, ou pour leur vitesse de croissance. Les arbres seront finalement abattus, ce qui libérera du carbone. Parmi ces espèces, le teck, qui peut prendre le pas sur les espèces d'origine, « posant des risques supplémentaires pour les plantes indigènes et l'écosystème », ajoute Jesus Aguirre Gutierrez.

**En creux, il vaudrait donc beaucoup mieux, de continuer à exploiter des massifs de forêts naturelles, pour autant, que les principes de leurs gestions durables soient au cœur de l'activité industrielle de la filière bois tropical.**

### Rappel des objectifs et des groupes-cibles

---

Pour rappel, depuis septembre 2017, après une première phase de 60 mois, le PPECF, a priorisé les objectifs suivants :

- mettre en place des actions et des outils opérationnels au sein des entreprises à travers une démarche d'accompagnement technique sur le long terme (le coaching d'entreprises vers un certificat de leur choix) ;
- élargir l'offre de certification en proposant des appuis de formation (coaching) à la fois pour les certificats de gestion durable (FSC® et PAFC) mais également, pour les certificats de légalité (OLB, LS) ;
- s'adresser à des entreprises qui ont peu ou moins bénéficié des résultats du PPECF I, en particulier les entreprises nationales (secteur Sud Congo, par exemple) et les entreprises à capitaux asiatiques ;
- accentuer les actions en lien direct avec les aspects sociaux (conditions de vie, droits, santé, sécurité des travailleurs (développement local, prise en compte des peuples autochtones) et avec la préservation de la biodiversité qui sont généralement les points « à

---

<sup>2</sup> <https://metro.co.uk/2023/10/04/climate-change-carbon-offset-trees-forest-biodiversity-warning-19601058/>

<sup>3</sup> <https://www.researchgate.net/profile/Jesus-Aguirre-Gutierrez>



problèmes » dans les audits de conformité à un schéma de certification (légalité ou gestion durable) ;

- améliorer le monitoring écologique des concessions certifiées, notamment par la mise en place de plans de gestion et de protection de la faune qui sont également, l'objet de demandes d'actions correctives récurrentes ; vu les exigences croissantes des certificats sur la préservation de la biodiversité<sup>4</sup> ;
- promouvoir des modèles d'exploitation compatibles avec la gestion durable et les faire connaître dans l'aval de la filière jusqu'aux consommateurs finaux ;
- proposer des interventions innovantes, centrées sur la mise à disposition d'outils numériques<sup>5</sup> (tutoriels, logiciels, guides [en partie traduits en Mandarin]) pour toutes les entreprises et notamment, celles qui pensent que la certification leur est inaccessible

### **Composante 1 : les conditions conceptuelles et institutionnelles pour la certification sont mises en place**

*Depuis mars 22, la stratégie de l'Union européenne pour lutter contre la déforestation importée (LDI) consiste à renforcer la due diligence sur le commerce des « commodities », par de nouvelles exigences de traçabilité<sup>6</sup>, telle que la géolocalisation.*

Ainsi, le 29 juin 23, a été organisé par le FSC France, une table ronde sur le nouveau règlement acteurs engagés à la norme FSC, de bien comprendre les enjeux et de poser leurs questions

- Le règlement élargit la liste des produits bois concernés ;
- Les produits bois importés ou commercialisés sur le marché UE doivent ne pas avoir contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts et avoir été produits de façon légale (dont la définition est élargie aux aspects sociaux) dans leur pays de production ;
- Les opérateurs sont toujours les entreprises qui mettent des produits bois sur le marché UE, mais aussi celles qui exporte depuis le marché UE.
- Les « grands » commerçants (autres que PME - cf. dernière page) doivent également faire preuve de diligence raisonnée ;
- Le moyen d'évaluation reste la diligence raisonnée (collecte d'information, analyse du risque et réduction du risque), avec quelques dispositions particulières :
  - avant la mise sur le marché ou l'exportation, l'opérateur (ou le « grand » commerçant) doit soumettre une déclaration de diligence raisonnée indiquant la conformité via un Système d'Information (mis en place par la Commission Européenne),
  - la Commission Européenne a prévu une classification des pays producteurs (UE et hors UE), qui permettra d'appliquer une Diligence Raisonnée simplifiée si le pays est classifié en risque faible.
- Dans les informations à collecter, il faut obtenir la géolocalisation de toutes les parcelles où les bois ont été produits ainsi que la date ou la période de production ;
- Le Règlement sera applicable fin 2024 environ (mi 2025 pour les PME), et le RBUE s'appliquera encore 3 ans (selon certaines conditions).

---

<sup>4</sup> <https://www.thegef.org/newsroom/publications/innovative-finance-nature-and-people>

<sup>5</sup> En facilitant la gestion qualitative d'une gestion durable, au quotidien.

<sup>6</sup> L'Ong TRAFFIC publiait une étude relative à « l'état des lieux des systèmes de traçabilité du bois dans les pays du bassin du Congo ». Il en ressort qu'au cours des deux dernières décennies, malgré les efforts des états pour déployer des systèmes de traçabilité nationaux et de Gestion durable, le bassin du Congo a perdu plus de 5,6 % de sa couverture forestière. La détérioration des forêts est aggravée par la surexploitation due à une corruption endémique, et à l'exploitation illégale des forêts. L'étude débouche sur des défis et difficultés que les pays du Bassin du Congo doivent surmonter pour disposer de systèmes de traçabilité du bois adéquats.



sur les compatibilités entre FSC et ce nouveau règlement. Pour la filière bois , ci-dessous, un résumé de ce qu'il faut en retenir:

Pour informer les acteurs de la filière bois d'importation<sup>7</sup> en UE, le projet LIFE LEGAL WOOD de l'UE, en collaboration avec Preferred By Nature (NEPCON) Afrique organisent régulièrement, des webinaires sur le Règlement sur la Déforestation de l'Union Européenne (RDUE), dans lequel, il faut encore noter que les certifications privées semblent reléguées à un rôle d'auxiliaires de contrôles de due diligence, avec pour risque de voir déplacer les flux commerciaux davantage vers l'Asie.

Par ailleurs, au niveau sous régional africain, fin juillet 23, à Douala, s'est tenue une session du Groupe de Travail sur la Gouvernance Forestière (GTGF) de la COMIFAC, qui a permis de mener des réflexions sur les grands enjeux du nouveau Règlement UE sur la déforestation, et sur d'autres sujets d'actualité<sup>8</sup>, afin de proposer des positions communes aux Etats membres de la COMIFAC.

**Dans ce contexte très évolutif, l'action majeure du PPEC est de continuer à soutenir la certification vérifiée tierce partie, par une promotion des standards de certification FSC®-FM<sup>9</sup> et PAFC-BC<sup>10</sup> et par une meilleure reconnaissance commerciale et institutionnelle, aussi bien par les pays importateurs qu'exportateurs d'Afrique centrale.**

Ainsi, malgré la suspension de deux certificats de Légalité (récemment accordés), respectivement chez SBL (326 985 ha) en juillet, et chez GWI/BSG (402 462 ha) en août, la dynamique globale reste positive (voir le § 2.5.2 sur le coaching). En effet, deux sociétés AEH et GWI/BSG du Gabon viennent d'être admises au coaching PPECF vers le certificat PAFC-BC, tandis qu'une autre, la STUG<sup>11</sup>, a déposé son dossier (DNO n° 385], pour bénéficier d'un appui coaching vers l'OLB.

Ainsi, au cours du semestre, les superficies certifiées « Gestion durable » dans le bassin du Congo sont restées stables (6,2 Mois d'ha), et les surfaces certifiées « Légalité » ont diminué à 6,7 Mios d'ha (contre 7,3 au semestre précédent).

En outre le PPECF se doit d'aider la filière bois du bassin du Congo, à s'adapter aux nouvelles contraintes qui peuvent affecter l'exploitation des bois tropicaux. C'est ainsi que le PPECF a répondu favorablement à une requête de l'ATIBT [DNO n° 384], visant à renforcer les capacités des pays producteurs d'Afrique centrale, à répondre aux exigences des <Avis de Commerce Non

---

<sup>7</sup> Le Consultant Ernst & Young et Mays Mouissi Consulting, montre qu' au Gabon, entre 2014 et 2022, le chiffre d'affaires du secteur forestier a augmenté de 28 milliards de francs CFA pour atteindre 93 milliards de francs CFA (+232%).

<sup>8</sup> Le Ministre des Eaux, des Forêts et de la Faune du Cameroun (MINFOF), a publié, le 1er juin 2023, des informations sur l'arrêt de l'exportation des grumes au Cameroun. Ainsi, au terme de l'année 2024, 45 essences deviendront interdites et seront suivies, fin 2025, par 31 essences supplémentaires. Ainsi, dès le 1er Janvier 2026, l'exportation de bois sous forme de grumes ne concernera plus que 5% des essences de promotion.

<sup>9</sup> A noter qu'une troisième subvention au Forest Stewardship Council [C236] poursuit l'objectif de délivrer une attestation pour services écosystémiques, jointe aux audits initiaux ou de surveillance .Objectif atteint, par une première certification pour services écosystémiques chez IFO au Congo.

<sup>10</sup> Plusieurs entreprises en progression vers le certificat PAFC-BC, pourront se faire certifier dans les mois à venir par le Bureau Veritas accrédité, par le TUNAC. Ces premiers audits PAFC-BC, vont par ailleurs devoir satisfaire à la condition pour maintenir l'accréditation, de réaliser au moins un audit PAFC-BC avant le 21 septembre 2023. A noter que le PPECF finance le développement d'outils de gestion des émissions carbone pour répondre à l'indicateur 7.1 du standard PAFC-BC.

<sup>11</sup> 290.000 ha

Préjudiciables-CITES >(ACNP) qui touchent aujourd'hui , les genres *Afzelia*, *Khaya* et *Pterocarpus*, récemment classés en annexe II de la CITES.

### **Composante 2 : la qualité de l'exploitation industrielle est améliorée**

- L'application <Assistant numérique de contrôle> EFIR [contrat C231] qui a fait l'objet d'une formation à Libreville, au siège de l'UFIGA, du 8 au 10 février 2023, est entré en phase tests de terrain ;
- Fin septembre 2023, trente-cinq (35) entreprises se sont inscrites à l'appui « coaching » pour un total de 10 284 199 ha de superficie. Au 31 mars 2023, vingt-six (26) entreprises ont été diagnostiquées pour un total de 8.580.818 ha, et le processus d'appui coaching a été réellement engagé pour treize (13) d'entre elles, soit 4.614.802 ha<sup>12</sup> de superficies forestières. En outre, six (6) entreprises<sup>13</sup> se sont à nouveau réengagées dans un processus de coaching pour obtenir un certificat de niveau « Gestion Durable » (souvent PAFC-BC), avec à terme, un dépassement de superficies gérées durablement de 1,5 Mios d'ha par rapport à l'indicateur assigné par la convention de financement BMZ 2018 67 845 ;
- La nouvelle étude biochar, conduite par le bureau ETICWOOD, a suscité un vif intérêt de la part des concessionnaires qui y voient, sous réserve d'une analyse au cas par cas, une solution durable et économiquement avantageuse, de recycler leurs déchets bois, majoritairement issus de la première et seconde transformation, dans les scieries ;
- En aval de la filière, l'analyse des flux commerciaux européens, montre qu'il existe toujours une demande pour le bois tropical qui n'est actuellement pas satisfaite. Il existerait donc des opportunités pour le développement d'essences moins connues : l'Okan et le Fraké ont déjà fait leurs preuves sur le marché européen, et sont désormais acceptés, tandis que la compagnie CBG au Gabon, avec l'aide du PPECF, poursuit sa promotion du Gombe (C222 et que le groupe INTERHOLCO a également sollicité le PPECF en mars 2023, pour promouvoir deux nouvelles essences, le Kanda et le Limbali ;
- Pour faciliter une exploitation raisonnée des essences phares des concessionnaires d'Afrique centrale, Nature+ et l'Université de Gembloux agro-biotech ont effectué, avec l'appui financier du PPECF, une analyse actualisée du statut de vulnérabilité de 19 espèces exploitées pour leur bois d'œuvre<sup>14</sup>. Sur ces dix-neuf espèces étudiées, trois essences présentent un risque réel de diminution de plus de 30% de leur population et peuvent être classées comme vulnérables. Cependant, les résultats de l'étude, n'ont pas pu être exploités en temps utile et elle n'a pas pu empêcher la CITES de classer en annexe II, le Padouk (*Pterocarpus soyauxii*) et le Doussié (*Afzelia bipindensis*). Ceci démontre la nécessité de réaliser périodiquement et de façon suffisamment anticipée, des évaluations de vulnérabilité, pour éviter des classements CITES inappropriés. De son côté, l'ATIBT s'est engagée à faire réviser ce classement avec l'appui du collectif Fair&Precious, l'enjeu étant la survie du modèle économique <concession certifiée durable> dans le bassin du Congo ;

---

<sup>12</sup> Cette différence observée entre les surfaces diagnostiquées et les surfaces en cours de certification, s'explique en partie par la difficulté pour certaines entreprises de consentir aux investissements nécessaires.

<sup>13</sup> L'entreprise BSO (294.829 ha au Gabon) a déjà obtenu son certificat « Gestion durable » suivant le référentiel PAFC-BC.

<sup>14</sup> Ce travail a mobilisé des données d'inventaires forestiers sur près de 22 millions d'hectares et sur des données issues de plus de vingt ans de recherche sur la dynamique forestière en Afrique centrale menées par le collectif Dynafac.

- Le guide de certification est à présent achevé et le bureau BFConsult travaille à le mettre en ligne<sup>15</sup>, en trois langues (français, anglais et mandarin), avec comme outil de navigation, une infographie qui facilitera sa consultation, pour les différents responsables d'une cellule de certification [C257 & C262] ;
- Enfin, notons qu'une Commission ATIBT « Marketing & Biodiversité » a été constituée. Son animation a été confiée pour 6 mois, aux bureaux TEREA, ETICWOOD et BFCONSULT. Par ailleurs, l'ATIBT s'est rapprochée de l'OBC (Organization for Biodiversity Certificates) afin de promouvoir, une approche plus large que la composante carbone.

### **Composante 3 : Renforcer la communication sur l'exploitation industrielle responsable**

Le programme marketing continue de s'articuler autour de trois axes :

- Le marketing d'image pour modifier l'opinion publique, a priori négative sur la filière bois du bassin du Congo vers une perception plus positive dans le maintien du couvert forestier et ses effets sur le climat et la biodiversité ;
- Le marketing de marché, notamment dans le cadre d'une nouvelle subvention accordée à l'ATIBT [C259] courant mars 23, pour rédiger un guide pratique d'aide à la rédaction des Cahiers de Clauses Techniques Particulières (CCTP) des produits bois issus des forêts certifiées du bassin du Congo ;
- Le marketing d'influence, pour démontrer la nécessité de déployer le plus largement possible la gestion durable des forêts dans le bassin du Congo. Pour mémoire, la mission diplomatique conduite par l'ATIBT, à l'initiative du PPECF, a permis de réintroduire les bois tropicaux certifiés « Gestion durable » dans les appels d'offres de la SOLIDEO à l'occasion de la construction des ouvrages pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ensuite, l'ATIBT multiplie les prises de parole dans les médias, forums et rencontres institutionnelles et professionnelles pour promouvoir la certification et le développement d'une finance « verte » afin de pérenniser le modèle économique des opérateurs, soutenir les populations et développer les services écosystémiques.

---

<sup>15</sup> Sur la plateforme de l'ATIBT, suivant un accord convenu entre la COMIFAC et l'ATIBT.

## 2. Bref résumé du Programme

---

Présentée comme une alternative au boycott des bois tropicaux soutenu par de nombreuses ONG environnementales depuis la conférence de Rio en 1992, la certification forestière se base sur un engagement volontaire des entreprises privées du secteur forestier (exploitation, transformation, distribution) à respecter un « cahier des charges » et de faire vérifier par une tierce partie (audit), la réalité de la conformité de l'exploitation au standard choisi<sup>16</sup>.

Rappelons que, dans le bassin du Congo, la certification a voulu opposer à la société civile et aux ONG environnementales et sociales, une attestation de « gestion responsable » et, par-là, un accès facilité à certains marchés à travers une préférence des acheteurs et des consommateurs finaux, notamment les marchés publics où la traçabilité et la différenciation par rapport au bois illégal ou informel est exigée.

Ainsi, à partir de 2004/2005, la certification FSC et des systèmes de certification d'un niveau légal [considéré de niveau moindre par rapport au FSC] ont permis à des entreprises du bassin du Congo de certifier la gestion responsable [ou la légalité] de leur activité ainsi que la traçabilité de leur produit (certificat OLB/VLT). Notons que cette dynamique de certification a été appuyée par les partenaires du développement et a pu se mettre en place grâce à la présence de bureaux de certification internationaux accrédités, disposant d'auditeurs formés à la certification forestière (Bureau Veritas, Rain forest Alliance, Preferred by nature (Nepcon), SGS).

En 2010, la plupart des grandes sociétés forestières du Cameroun, du Gabon et du Congo disposaient d'une certification de gestion responsable, cumulant une surface de l'ordre de 5,5 millions d'ha soit environ 15 % des superficies des concessions forestières attribuées dans le Bassin du Congo.

Mais depuis 2011, ce chiffre n'augmentait plus en raison : i) de la crise économique et financière des années 2008 ; ii) l'absence de mesures de discrimination positives, notamment sur le plan fiscal, envers les concessionnaires qui s'engagent au-delà des obligations légales ; iii) une quasi absence de valorisation financière de la certification.

L'arrivée du programme de promotion de l'exploitation certifiée (PPECF)

Rappelons que le Programme de Gestion Durable des Forêts dans le Bassin du Congo est un programme régional d'appui à la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) financé par le Ministère allemand de la coopération (BMZ). Son objectif est de contribuer à la protection et à rendre durable l'exploitation des ressources forestières du bassin du Congo et des savanes avoisinantes. Il est constitué de deux modules de coopération technique exécutés par la GIZ et de trois modules de coopération financière financés par la KfW, dont le Programme de promotion de la certification forestière (PPECF).

Mis en œuvre depuis le 15 mars 2012, ce Programme a évolué dans ses objectifs, au cours de trois phases qui ont toutes reçues un financement de 10 millions d'euros :

- **Phase I BMZ 2008 66 707-10 mios €** (15 mars 2012 / 15 septembre 2017) : le Programme s'installe à Yaoundé, siège du secrétariat exécutif de la COMIFAC, dans un contexte où la certification tierce partie est très fragilisée par : i) des niveaux des premium décevants ; ii) l'arrivée du Règlement bois européen imposant une Due diligence des premiers metteurs

---

<sup>16</sup> OLB, LS, FSC-FM, PAFC-BC

en marché) et iii) une image de l'exploitation forestière tropicale toujours mal perçue par la société civile et donc par les consommateurs finaux en Europe.

Ainsi, schématiquement, on peut caractériser la première phase du PPECF, comme un projet qui a permis aux entreprises déjà certifiées de maintenir la certification, en les aidant à résoudre des demandes d'actions correctives (DAC) et à progresser dans leur savoir-faire, mais qui n'a pas eu d'impact significatif sur l'accroissement espéré des superficies certifiées.

Néanmoins, au fil des mois, le PPECF a pu agréger autour de lui, les principaux bureaux d'études forestiers, les ONGs de conservation, les universités et centres de recherche (principalement Gembloux Agro-biotech, le CIRAD) et tester, avec succès, sa méthodologie d'interventions qui consistait, sur base de requêtes, à financer un éventail d'actions très large au bénéfice des concessionnaires et des parties prenantes à la gestion durable des forêts.

Citons, l'envoi d'experts pour résoudre des « Demandes d'action correctives » issues d'audits de surveillance ; des analyses sur les référentiels de certification ; des travaux de doctorats sur des thématiques mal connues (i.e. l'impact de la faune sur la productivité des forêts); des études diverses et notamment une étude sur les coûts et bénéfices de la certification. Etude qui, à travers la méthode ROI (Return on investment), a permis de démontrer l'intérêt de la certification (hors premium), obtenu par les gains de productivité lié au système de procédures et de monitoring. Ainsi il a été démontré que globalement 1 € investi dans la certification, rapporte, en moyenne 2 €.

Autre résultat majeur de cette première phase, de cinq années : l'absence d'attaque du Programme par des ONGs fortement positionnées sur un objectif d'arrêter toute exploitation forestière dans les forêts naturelles du Congo.

Aussi, fin 2016, la KfW a-t-elle proposé à la COMIFAC une deuxième phase, en élargissant l'appui du PPECF aux entreprises souhaitant obtenir en deux étapes, un certificat de légalité (OLB, TLTV, VLC), suivi d'un certificat de gestion durable (FSC, PEFC). Cela signifiait que le PPECF assisterait, au cours de sa phase II, des entreprises avec un niveau de certification inexistant ou très bas mais déterminées à se diriger vers une certification de gestion durable.

▪ **Phase II BMZ 2015 68 203- 10 mios €** (16 septembre 2017-15 septembre 2021)

Décision bien opportune, puisqu'à compter du 16 septembre 2017, une vraie dynamique de certification additionnelle s'est enfin enclenchée, surtout au Gabon où le Chef de l'Etat avait exprimé sa volonté que toutes les entreprises forestières opérant sur son sol soient certifiées à l'horizon 2021.

Déclaration suivie ensuite, d'une nouvelle loi de finances appliquant une taxe de superficie dégressive selon le niveau de certification atteint (OLB, LS, FSC®-FM, PAFC). Cette tarification dégressive explique le rush des entreprises gabonaises à solliciter l'appui du PPECF pour obtenir, dans les meilleurs délais, une certification au moins de légalité (OLB, LS). Ainsi, environ trois millions d'ha additionnels (dont 85 % au Gabon) ont pu être certifiés dans le courant de l'année 2022.

▪ **La phase III BMZ 2018 67 845 – 10 mios €** (16 septembre 21-15 décembre 24)

Tandis que le PPECF était mobilisé sur un nombre très important de requêtes et sur un coaching d'entreprises de plus en plus nombreuses à vouloir obtenir une certification, une réflexion mondiale s'accroissait au fil des réunions internationales (COP) sur le changement

climatique, pour tenter de réduire urgemment, le niveau des émissions carbone, conséquences du développement industriel et de l'explosion démographique du siècle dernier.

Dictés par cet impératif mondial, les standards de certification de niveau durable (FSC®-FM et PAFC) ont logiquement communiqué au PPECF, dans le courant de l'année 2021, leurs nouvelles exigences en matière de réduction des émissivités carbone.

Ainsi, la troisième phase du PPECF s'est fortement centrée sur la mise à disposition de solutions logicielles facilitant la mise en œuvre et le contrôle du référentiel RIL (i.e. les contrats de monitoring EFIR [financement KfW] et HSE [financement AFD] par des assistants numériques de contrôles ; le projet d'un algorithme pour optimiser le réseau de pistes, etc.).

Toutes ces applications pourront facilement être upgradées vers des outils facilitant la métrique des réductions des émissions carbonées liées à l'exploitation forestière et ainsi répondre aux nouveaux critères - indicateurs environnementaux des standards de certification.

En outre, ces nouveaux outils permettront aux entreprises forestières certifiées, de capitaliser des unités de crédits de carbone et de les valoriser dans des partenariats élargis avec d'autres acteurs industriels, soumis à des fortes contraintes sur leur responsabilité sociale et environnementale.

Sur l'appui coaching, il reste au Gabon, un réservoir d'entreprises intéressées par un appui du PPECF. Cependant, leur taille plus modeste n'assure peut-être plus leur capacité à cofinancer un accompagnement par la présence d'un bureau d'étude. D'autres méthodes d'accompagnement devraient sans doute être étudiées.

Rappelons ici, le cadre logique ci-dessous, présente les résultats tels qu'attendus dans la nouvelle convention de financement (n° 2018 67 845) de 10 millions d'euros, signée le 20 octobre 2020, entre la COMIFAC et la KfW, afin de prolonger l'Action du Programme au moins jusqu'à fin 2023, (ou fin 2024, prolongation d'une année).



Indicateurs du PPECF jusqu'à fin 2023 (2024)

Promotion de l'exploitation certifiée des forêts PPECF II et III : N° 2015 68 203 et 2018 67 845

|                                                                                                                                                                                  | Indicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectif</b><br><i>La gestion industrielle des forêts dans le Bassin du Congo s'exerce selon les principes de la certification de légalité ou de bonne gestion forestière</i> | <p>Les superficies certifiées selon FSC ou PEFC restent stables</p> <p>Valeur de base : 5,5 Mio. ha<br/>Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 6,2 Mio. ha<br/>Valeur actuelle : 6,2 Mio. ha<br/>Valeur cible : 5,5 Mio. ha</p> <p>Les superficies certifiées selon FSC-CW, OLB, VLC ou comparable augmentent jusqu'à mi-2023 par 3 Mio. ha.</p> <p>Valeur de base : 3,1 Mio. ha<br/>Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 7,3 Mio. ha<br/>Valeur actuelle : 6,7 Mio. ha<br/>Valeur cible : 6,1 Mio. ha</p> <p>50 % des entreprises avec légalité certifiée mettent en œuvre un plan d'action sociale jusqu'à mi 2023, accepté par la population riveraine.</p> <p>Valeur de base : 33 %<br/>Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 27%<br/>Valeur actuelle : 32%<sup>(17)</sup><br/>Valeur cible : 50%</p> <p>75 % des entreprises certifiées FSC ou PEFC réalisent jusqu'à mi 2023 un plan de gestion de faune.</p> <p>Valeur de base : 33%<br/>Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 56%<br/>Valeur actuelle : 57 %<sup>(18)</sup><br/>Valeur cible : 75%</p> <p>50 % des entreprises avec légalité certifiée mettent en œuvre un plan d'action de faune jusqu'à mi 2023.</p> <p>Valeur de base : 33%<br/>Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 40%<br/>Valeur actuelle : 77%<sup>(12)</sup><br/>Valeur cible : 50%</p> <p>Réduction d'émission additionnelle annuelle de 90.000 to/CO<sub>2</sub> à partir de mi-2023</p> <p>Valeur de base : 0<br/>Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 0<br/>Valeur actuelle : 0<br/>Valeur cible : 90.000 to/CO<sub>2</sub></p> |

<sup>17</sup> Aucune Loi nationale, ni aucuns standards de certification « Légalité » ne l'exige, (Cet indicateur comptabilise les concessionnaires certifiés « Légalité », détenteurs également d'un certificat de « Gestion durable », ou en coaching PPECF vers celui-ci, puisque les normes « GD » mentionnent des « actions spécifiques » pour les populations locales).

<sup>18</sup> Seule la Loi forestière du Gabon, et les normes de certification PAFC ont une telle exigence. (Cet indicateur comptabilise les concessionnaires certifiés du Gabon, ou les détenteurs d'un certificat PAFC opérant hors du Gabon).



|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outputs</b><br><br><b>1. Mise en place des conditions conceptuelles et institutionnelles propices à la certification</b> | <p>4 nouveaux standards pour FSC et PAFC seront élaborés, testés et validés jusqu'à fin 2023.</p> <p>Valeur de base : 1<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : <b>6</b><br/> Valeur actuelle : <b>6</b><br/> Valeur cible : 4</p> <p>Au moins 75 personnes ressources seront formées jusqu'à mi-2023 dans les principes de certification (OLB, VLC, PAFC, FSC)</p> <p>Valeur de base : 0<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : <b>143</b><br/> Valeur actuelle : <b>143</b><br/> Valeur cible : 75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Amélioration de la qualité de l'exploitation industrielle</b>                                                         | <p>Les Demandes d'Actions Correctives (DAC) émises lors d'audits de surveillance et de renouvellement et qui concernent des manquements aux procédures EFIR représentent moins de 15% du nombre total de DACs jusqu'à mi-2023.</p> <p>Valeur de base : 13% (seulement PAFC/FSC)<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : <b>15%</b><br/> Valeur actuelle : <b>16 %</b><sup>(19)</sup><br/> Valeur cible : &lt; 15 %</p> <p>Le modèle de mise en œuvre du programme de lutte et de prévention VIH-SIDA par le GFBC est reproduit chez un autre syndicat/représentation professionnelle dans le BC d'ici mi-2023.</p> <p>Valeur de base : seulement au Cameroun.<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : seulement Cameroun<br/> Valeur actuelle : seulement au Cameroun<br/> Valeur cible : un autre pays</p> <p>D'ici à fin 2023, au moins 50% des concessions forestières certifiées (tous certificats confondus) mettent en œuvre un plan d'appui spécifique (et de qualité) en faveur des peuples autochtones</p> <p>Valeur de base : 44%<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : <b>45%</b><br/> Valeur actuelle : <b>83%</b><sup>(20)</sup><br/> Valeur cible : 50 %</p> |
| <b>3. Améliorer les connaissances et la perception de l'exploitation commerciale dans le Bassin du Congo</b>                | <p>Une boîte à outil pour les mesures EFI est développée d'ici fin 2021 et tenue à jour régulièrement.</p> <p>Valeur de base=0<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 0<br/> Valeur actuelle : 0<br/> Valeur cible : 1</p> <p>L'ATIBT est appuyée dans la réalisation d'une campagne de marketing des bois africains certifiés FSC ou PEFC dans 2 pays Européen d'ici fin 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>19</sup> Cette évaluation prend en compte, tous les audits FSC, PAFC, OLB et LS réalisés sur le semestre.

<sup>20</sup> Aucune Loi nationale ne l'exige, néanmoins, les standards de certification « Gestion durable » FSC/PAFC mentionnent des « activités spécifiques » pour les Peuples Autochtones. (Cet indicateur comptabilise les entreprises détentrices d'un certificat FSC/PAFC, ou en coaching PPECF pour les obtenir).

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Valeur de base : 1 (France)<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 6 (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne)<br/> Valeur actuelle : 6<br/> Valeur cible : 2</p> <p>Des tests d'emploi seront réalisés pour au moins 5 essences moins connues et les résultats seront publiés jusqu'à 2023.</p> <p>Valeur de base : 6<br/> Valeur à la fin du précédent rapport semestriel : 6<br/> Valeur actuelle : 6<br/> Valeur cible : 11</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quelques commentaires sur ces indicateurs :

- Les superficies certifiées « Gestion responsable » (FSC®-FM ou PAFC-BC) sont restées stables sur le semestre, soit 6,2 Mio d'ha, cependant, par rapport au To (5,5 Mios d'ha), la valeur cible de l'indicateur est dépassée de 12% ;  
S'agissant des concessions certifiées de niveau « Légalité », la suspension de deux certificats de Légalité, respectivement chez SBL (326 985 ha) en juillet, et chez GWI/BSG (402 462 ha) en Août 23, ramène à 6,7 Mio ha le total des surfaces certifiées « Légalité » (soit une diminution de 605 868 ha par rapport au semestre précédent). Néanmoins, la valeur cible de l'indicateur est dépassé de 20% ;
- Sur le volet formation en audit de certification, aucune nouvelle formation n'a été réalisée sur le semestre, et la valeur de l'indicateur est dépassée de 90%;
- le taux pour les Demandes d'actions correctives (DAC) EFIR a été estimé à 16 % durant le semestre (rehaussé au-dessus du seuil maximal fixé pour cet indicateur), soit 1% par rapport au semestre 11, recul en partie due au grand nombre de DAC EFIR émises pour des entreprises nouvellement certifiées « Gestion responsable », ou « Légalité ».

### 3. Mesures/activités mises en œuvre pendant le semestre

---

Remarques liminaires :

- 1) Le lecteur des rapports semestriels du PPECF est invité à se rendre régulièrement sur le site web du Programme à l'url suivante :

[http://www.ppecf-comifac.com/tableau\\_recapitulatif.html](http://www.ppecf-comifac.com/tableau_recapitulatif.html)

où, il trouvera les derniers termes de références et les nouveaux rapports intermédiaires ou finaux des interventions classées suivant les principes du standard de certification FSC® ®-FM.

- 2) Le code couleur des interventions en cours ou en préparation est inchangé :

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Intervention en phase avec le chronogramme et ne rencontrant pas de difficultés majeures ou avancée significative d'une activité ou d'une thématique |
|  | Intervention prenant un léger retard ou rencontrant une difficulté sans risques majeurs                                                              |
|  | Intervention en retard ou rencontrant une difficulté importante                                                                                      |
|  | Intervention en risque de non-exécution                                                                                                              |
|  | Intervention clôturée                                                                                                                                |

- 3) Certaines interventions présentées au 10<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup> rapports semestriels ne sont pas reprises dans ce rapport, en raison de leur trop faible avancement pour cette période (cf. codes couleurs jaune, orange, rouge) ou de leur arrêt noté dans les derniers rapports mensuels.

#### 3.1. AXE I : les conditions conceptuelles et institutionnelles pour la certification sont mises en place

---

##### 3.1.1 Cadre

Indicateurs globaux PPECF:

I.1. les superficies certifiées selon FSC® ou PEFC restent stables (T0= 5,5 Mio ha)

I.2. les superficies certifiées Légalité (FSC® -CW, OLB, VLC ou comparable) augmentent de 3 Mio. Ha.

##### Ligne 1.1 : soutien à la certification de légalité vérifiée tierce partie (OLB, VLC)

Pour rappel, depuis mars 2022, la stratégie de l'Union européenne de lutte contre la déforestation importée (LDI) veut renforcer les règles commerciales des « commodities » entrant dans l'Union européenne en y ajoutant de nouvelles exigences de traçabilité, telle que la géolocalisation. Ci-dessous, un extrait de la plateforme (à l'url ci-dessous) qui résume le fonctionnement du prochain RDUE. Son fonctionnement a été expliqué brièvement dans le 11<sup>ème</sup> rapport semestriel du PPECF et peut être retrouvé au lien ci-dessous :

<https://www.csfi-musique.fr/reglementations/les-bois/le-rdue-et-le-rbue>

Dans ce nouveau règlement (RDUE), les certifications privées restent encore reléguées à un rôle d'auxiliaires de contrôles de due diligence, avec, selon le chercheur Alain Karsenty<sup>21</sup>, le risque

---

<sup>21</sup> Alain Karsenty, « Le projet européen de lutte contre la déforestation importée : les limites d'une approche indifférenciée ». Fondation pour la Nature et l'Homme Think Tank

« *Qu'en ne voulant pas faire confiance à des certifications...* », les flux commerciaux se déplaceront davantage encore vers l'Asie. Son corollaire possible, serait alors, un découragement des producteurs du bassin du Congo, qui auront fait l'effort de gérer, via le coaching du PPECF, la ressource de manière durable.

Néanmoins, chez les pays producteurs, le Gabon et le Congo s'appuient sur ces certifications<sup>22</sup>, comme preuve suffisante pour obtenir une fiscalité allégée.

En effet, au Gabon, une loi de finance<sup>23</sup> continue à motiver les entreprises forestières du Gabon à solliciter le PPECF pour obtenir son appui dans l'acquisition, dans les meilleurs délais, d'un certificat de légalité leur permettant déjà de réduire la taxe de superficie de 800 à 600 FCFA, et de poursuivre ensuite vers un certificat de gestion durable pour maximiser l'allègement fiscal puisqu'alors, la redevance passe à 330 FCFA/ha.

Au Congo, on note que les discussions du secteur privé avec l'Administration, sur le nouveau régime d'exploitation sont intenses. Son syndicat (UNICONGO) est en effet, déterminé à faire connaître ses réserves et ses craintes<sup>24</sup> sur ce nouveau mode de taxation.

#### ▪ **sur l'interdiction d'exportation de grumes dans la zone CEMAC**

Pour rappel, la CEMAC avait annoncé un nouveau report de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations des bois en grumes pour toute la zone CEMAC lors de la 38<sup>e</sup> session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale (UEAC), tenue le 28 octobre 2022 à Yaoundé.

Pour l'instant, il est prévu du 03 au 05 octobre 2023, à Bangui(RCA), une importante réunion de validation de l'étude d'impact de la mesure d'interdiction d'exporter des Bois Tropicaux sous-forme de grumes par les pays de la CEMAC. Il est notamment prévu:

- la validation de cinq (5) rapports-pays et du rapport régional;
- le réexamen de la Décision N05/21/-CEMAC-UEAC-CM-36 du 8 février 2021 portant interdiction d'exporter les bois tropicaux sous forme de grumes ;
- l'élaboration du projet de feuille de route pour la mise en œuvre de la Stratégie d'Industrialisation durable de la filière bois dans le Bassin du Congo.

Les premiers échos font déjà mention d'un probable nouveau report de la date d'entrée en vigueur de cette décision CEMAC à 2027.

Entre-temps, au Cameroun, la lettre du ministre des Eaux, des Forêts et de la Faune du Cameroun (MINFOF), publiée le 1<sup>er</sup> juin 2023 donne des informations sur les étapes qui permettront au Cameroun, de rendre effective cette décision CEMAC, 45 essences seraient alors interdites au terme de l'année 2024, suivies, en fin 2025, de 31 essences supplémentaires. Ainsi, dès le 1<sup>er</sup>

---

<sup>22</sup> OLB, LS, PAFC-BC, FSC-FM

<sup>23</sup> A noter que de nombreux partenaires institutionnels (OIBT, UE, CAFI, CEEAC, KfW, AFD, BAD) souhaiteraient, à la faveur de ces réformes forestières, voir une fiscalité « verte » sur le modèle Gabonais s'étendre à tous les pays forestiers d'Afrique centrale

<sup>24</sup> On peut s'interroger sur les capacités de la future Société nationale forêt pour le partage de production (SNF-PP) à pouvoir intégrer les dernières exigences de l'UE « Zéro déforestation », vu son objectif de doubler rapidement la contribution du secteur forestier au PIB national. Ce pilotage « administratif » de la filière par l'Etat pourrait en effet poursuivre en priorité, l'approvisionnement du marché intérieur du bois par des opérateurs industriels non concessionnaires (des scieries principalement), installés ou non dans des zones spéciales économiques (zones franches), au fur et à mesure que leurs besoins en grumes grandissent.

Janvier 2026, l'exportation de bois sous forme de grumes aurait été réduit de 95% des essences de promotion.

Au niveau sous régional africain, la COMIFAC organise des réflexions au sein du Groupe de Travail sur la Gouvernance Forestière (GTGF) sur l'ensemble des grands enjeux du secteur forestier, afin de proposer des notes de positions communes aux Etats membres de la COMIFAC.

#### ▪ **sur la progression des superficies certifiées**

L'action du PPECF consiste toujours à soutenir la certification vérifiée tierce partie, comme outil de gestion reconnu par les marchés et certains gouvernements d'Afrique centrale, notamment, en continuant d'accompagner la révision des standards de certification toujours plus exigeants, notamment sur de nouveaux critères liés à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous y revenons au § 2.5.2 « coaching des entreprises ».

#### 3.1.2 Résultats structurants

#### **Ligne 1.2 : soutien au développement du PE(A)FC**

##### **Action 1 : soutien au PAFC régional**

| n° Contrat                                                                            | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s) | n° DNO                                           | Date ANO                                                                                                                                  | Date Contrat | Durée                 | Date fin               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| C128 & C142                                                                           | Tous            | PEFC Intl.     | 180                                              | 6/06/18                                                                                                                                   | 5/01/19      | 42 mois<br>(+16 mois) | Nov. 2023<br>(Avenant) |
| Contribution PPECF € : 378 250 (C128) & 119 200 (C142)                                |                 |                | Budget total € : 378 250 (C128) & 119 200 (C142) |                                                                                                                                           |              |                       |                        |
| Principaux résultats attendus                                                         |                 |                |                                                  |                                                                                                                                           |              |                       |                        |
| ▪ Schéma de certification régional PAFC avec des versions en français et en anglais ; |                 |                |                                                  | ▪ Reconnaissance du schéma régional PAFC avec son standard régional de gestion forestière et ses annexes nationales par le PEFC Council ; |              |                       |                        |

Le schéma PAFC-BC est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et depuis le 27 septembre 2022, les entreprises peuvent se faire auditer sur ce standard, par les organismes de contrôles Bureau Veritas<sup>25</sup> ou Control Union<sup>26</sup>, accrédités par le TUNAC<sup>27</sup>

Ainsi, les entreprises déjà certifiées PAFC-Gabon (BSO au Gabon) et celles actuellement en progression (SBL, GWI au Gabon, SEEF au Cameroun) vers la certification PAFC-BC, pourront pleinement obtenir cette certification, à l'occasion de leur premier audit de surveillance ou d'audits initiaux.

Par ailleurs, suite à un audit à blanc PAFC-BC, réalisé chez l'entreprise SEEF au Cameroun (du 17 au 22 avril 23), en présence des deux organismes de contrôle accrédités par le TUNAC (le Bureau Veritas et Control Union), un guide d'interprétation PAFC-BC, est attendu.

Ce guide rédigé par l'ATIBT, doit permettre aux auditeurs BV et CU et plus largement aux entreprises, de comprendre les exigences du PE(A)FC et ainsi, de minimiser les écarts/différences pour les premiers, et de choisir entre FSC-FM et PAFC-BC, pour les seconds.

Notons aussi que pour faciliter l'accès des entreprises au standard PAFC-BC, une DNO (n° 372) pour élaborer deux foires aux questions (FAQ) dédiées, l'une aux entreprises, l'autre aux

<sup>25</sup> <https://group.bureauveritas.com/>

<sup>26</sup> <https://certifications.controlunion.com/fr>

<sup>27</sup> <https://www.tunac.tn/>

organismes de contrôles, a reçu la non objection de la COMIFAC et a reçu l'accord de principe de la KfW, sous réserve de quelques compléments d'informations.

## Action2 : Développement d'outils pour la prise en compte des problématiques carbone et GES en exploitation forestière certifiée PAFC-BC

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s) | n° DNO                  | Date ANO | Date Contrat | Durée  | Date fin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|--------------|--------|----------|
| C235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tous            | TEREA          | 287                     | 9/11/21  | 22/09/21     | 6 mois | Clôturé  |
| Contribution PPECF € : 84 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                | Budget total € : 98 720 |          |              |        |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |                         |          |              |        |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ R1 : disposer d'un état des connaissances relatives (i) aux stocks de carbone forestier et (ii) à la quantification des émissions de GES au sein des entreprises d'exploitation forestière adapté au contexte du bassin du Congo ;</li><li>▪ R2 : élaborer un outil d'évaluation des émissions de GES, dans le cadre de l'activité d'une entreprise d'exploitation forestière, permettant de répondre à l'exigence 7.3.1 de la norme de gestion forestière PAFC Bassin du Congo ;</li><li>▪ R3 : élaborer une méthodologie de cartographie des stocks de carbone relatif, au sein d'une concession forestière, permettant de répondre à l'exigence 7.3.2 de la norme de gestion forestière PAFC Bassin du Congo.</li></ul> |                 |                |                         |          |              |        |          |

Rappelons que ce contrat a permis d'élaborer un guide <carbone et gaz à effet de serre> pour répondre à l'indicateur 7.3 spécifique du standard PAFC-BC et à deux exigences qui en découlent :

« 7.3. L'organisation minimise les impacts négatifs sur les stocks de carbone forestiers et les émissions de GES afin de préserver la capacité des forêts à stocker et séquestrer le carbone sur le moyen et long terme.

(Exigence) 7.3.1 L'organisation doit réaliser un bilan des émissions des GES sur l'ensemble de ses activités incluses dans le domaine d'application du SGFD, identifier et mettre en œuvre des mesures d'atténuation appropriées de ses émissions de GES, selon les directives y relatives en annexe 2.

(Exigence) 7.3.2 L'organisation doit produire une cartographie des stocks de carbone estimés de l'UGF, qui inclut a minima les stocks de carbone aériens et identifie les stocks de carbone particulièrement importants. Les directives pour cette cartographie sont indiquées en annexe 2. ».

Ainsi, les concessionnaires, pourront, grâce à cette application :

- élaborer une cartographie des stocks de carbone aériens estimés de l'Unité Forestière de Gestion (non exhaustif mais adapté au contexte et objectifs opérationnels de l'outil) ;
- identifier les stocks de carbone particulièrement importants ;
- établir une quantification des émissions de GES de leurs activités d'exploitations forestières et d'en faire le monitoring en vue d'identifier et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation appropriées.

L'outil n'étant pas simple à utiliser, les entreprises<sup>28</sup>, peuvent avoir recours à une hotline, « GES », qui a permis de former quelques cadres d'entreprises intéressées par la certification PAFC-BC :

<sup>28</sup> A raison de 22 heures maximum par entreprise. Cette hotline sera également accessible aux organismes de contrôles accrédités par le TUNAC.

**BSO** est la première entreprise, et actuellement la seule, avoir été entièrement formée aux outils GES et cartographie des stocks de carbone :

| <b>BSO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Période de la formation</b> | <b>Janvier – février 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Personnes formées</b>       | <b>Bilan émissions GES :</b><br>Responsable gestion durable et certification (Alphonse TAPE)<br>Responsable monitoring (Nana CHABOU CHARMY)<br>Responsable magasin, carburant et lubrifiant (Franck ONDO)<br>Responsable aménagement (Simon MVE BA ZIBE)<br><b>Cartographie carbone :</b><br>Responsable gestion durable et certification (Alphonse TAPE)<br>Responsable monitoring (Nana CHABOU CHARMY)<br>Responsable aménagement (Simon MVE BA ZIBE)<br>Cartographes (Michael OKASSA et Martial NGNIBOME ANGOUE) |
| <b>Nombre de jours passés</b>  | 8 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Etat des livrables</b>      | Bilan des émissions de GES 2022 disponible<br>Carte des stocks de carbone des 2 UFA BSO disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**GW/BSG** et **Rougier Gabon** sont les deux entreprises pour lesquelles les formations sont actuellement en cours.

| <b>GW/BSG</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Période de la formation</b> | <b>Démarrage : février 2023 – Fin prévue : novembre 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Personnes formées</b>       | <b>Bilan émissions GES :</b><br>Responsable gestion durable et certification (Amandine KHAN)<br>M. Norman Chng<br>M. Har Mei Yee<br>M. Sukhdev Singh<br>M. Khaw Chee Keong<br><b>Cartographie carbone :</b><br>Responsable gestion durable et certification (Amandine KHAN)<br>Responsable aménagement<br>Cartographes |
| <b>Nombre de jours passés</b>  | <b>Bilan émissions GES :</b> 2,75 jours/6 jours prévus<br><b>Cartographie carbone :</b> 1 jour/5 jours prévus                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Etat des livrables</b>      | Bilan des émissions de GES 2022 en cours de remplissage<br>Carte des stocks de carbone de l'UFA OTOUMA selon 1 <sup>e</sup> méthodologie disponible                                                                                                                                                                    |

Par ailleurs, en vue de renforcer la communication sur le nouveau standard PAFC-BC, et d'assurer son déploiement optimal, PEFC International a tenu les 12 et 13 juin 2023, une session de formation initiale aux auditeurs du Bassin du Congo, souhaitant utiliser le référentiel « chaîne de contrôle » relayée ensuite le 18 juillet 2023 par le PAFC-BC.

Toutes ces activités s'inscrivent dans la nouvelle dynamique de montée en puissance du PAFC BC, objet de la requête **DNO n° 372**, validée le 20 juin dernier par la COMIFAC et en attente de non objection finale par la KfW.



**Ligne 1.3 : soutien au bureau FSC® & motion n° 65 & n° 34 & FSC-PRO-30-006****Action 1 : valoriser les services écosystémiques des forêts du bassin du Congo**

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bénéficiaire (s) | Prestataire(s) | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| C236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tous             | FSC            | 265                      | 9/11/21  | 21/04/22     | 22 mois | fév.24   |
| Contribution PPECF € : 142.267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                | Budget total € : 296.389 |          |              |         |          |
| Principaux résultats attendus / objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |                          |          |              |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>La Procédure des Services Écosystémiques (FSC PRO-30-006) est testée dans deux concessions dans au moins deux pays différents du bassin du Congo, couvrant au moins deux services écosystémiques différents (carbone, biodiversité, protection des bassins versants) ;</li><li>les opportunités et contraintes (conceptuelles, techniques, légales, institutionnelles, administratives, et en ressources et capacités ) liées la mise en œuvre de la FSC PRO-30-006 sont évaluées , ainsi que celles en lien avec l'accès des communautés aux bénéfices supplémentaires générés par les concessionnaires par l'entremise des mécanismes établis dans les cahiers de charges des compagnies forestières ;</li><li>des bénéfices aux communautés et des contributions au développement socioéconomique local sont assurés ;</li><li>des manuels et des outils adaptés au contexte du Bassin du Congo sont développés, pour une mise en œuvre clé en main de la Procédure qui facilitera sa réplication dans d'autres concessions, à l'occasion des prochains audits de surveillance ;</li><li>les meilleures façons de communiquer et de commercialiser les déclarations de services écosystémiques auprès de sponsors, investisseurs et autres parties prenantes potentiels sont testées.</li></ul> |                  |                |                          |          |              |         |          |

Pour l'heure, les concessionnaires PALLISCO au Cameroun, IFO au Congo et CEB et Rougier au Gabon, collaborent à des tests de terrain couvrant trois services écosystémiques différents (carbone, biodiversité, protection des bassins versants), sélectionnés en fonction des priorités des détenteurs de certificat dans le bassin du Congo.

Sur la protection des bassins versants, le FSC® considère que les mesures adoptées par les entreprises concernant l'abattage en bordure des cours d'eau, les surfaces aménagées pour la protection des rivières, les méthodes de construction des ponts minimisant l'érosion et la sédimentation, et les procédures de fermeture des assiettes de coupes annuelles, apportent une réponse satisfaisante aux exigences de la PRO 30-006.

L'appui du PPECF au FSC, à travers le contrat s'est concrétisé par l'émission d'un premier certificat d'impact écosystémiques<sup>29</sup>, évalué suivant la procédure FSC-PRO-3006.

**Action 2 : accompagnement des sociétés certifiées au « Focus Forest FSC® »**

| n° Contrat                                                                                             | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s) | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| C232                                                                                                   | Tous            | ATIBT          | 292                      | 9/11/21  | 23/11/21     | 14 mois | 17/01/23 |
| Contribution PPECF € : 156 713                                                                         |                 |                | Budget total € : 362 681 |          |              |         |          |
| Principaux résultats attendus                                                                          |                 |                |                          |          |              |         |          |
| ▪ R1 : les résultats du Focus Forests intègrent les recommandations des membres certifiés de l'ATIBT ; |                 |                |                          |          |              |         |          |

<sup>29</sup> <https://interholco.com/fr/medias/actualites/360-la-biodiversite-dans-le-bassin-du-congo-recompense-interholco>

- R2 : les motions proposées par l'ATIBT et ses membres intègrent les résultats du Focus Forests et font l'objet d'un consensus auprès des membres FSC® pour faire évoluer les dispositions de la motion 65 ;
- R3 : Les autres motions proposées en AG et leur modalité de mise en œuvre sont acceptables pour le secteur privé.

Pour rappel, en 2021, le PPECF a été sollicité par l'ATIBT pour appuyer son adhésion à l'initiative Focus Forests, lancée par le FSC® fin 2020, en vue de solutionner la motion n° 65 sur la question des IFL.

Dans sa réflexion, le groupe IFL de l'ATIBT a proposé une motion susceptible de recueillir l'adhésion des membres FSC®. Ainsi, la motion 23, préconisant d'utiliser des approches à l'échelle paysage adaptées aux conditions locales et de renforcer les Groupes d'Elaboration des Normes pour aboutir à une protection normative des Paysages Forestiers Intacts (IFLs), a été votée à une très large majorité (95%), toutes chambres confondues, au cours de l'assemblée générale du FSC® à Bali, du 9 au 14 octobre 22.

Cette motion demande au FSC® d'initier un processus inclusif de révision des règles d'identification, de protection et de gestion des IFL à l'échelle du paysage, y compris dans les UFAs, et adaptées aux conditions locales.

Le développement d'une approche opérationnelle pour une conservation efficace des IFLs devra donc s'appuyer sur différentes approches :

- Une approche paysage ;
- Une analyse « sous la canopée » ;
- Un engagement des parties prenantes ;
- La priorisation des objectifs de conservation ;
- Une analyse des risques et des bénéfices.

Il est convenu que cette motion doit être mise en œuvre dans un délai d'un an, au cours duquel une règle intérimaire<sup>30</sup> approuvée par le Conseil d'administration du FSC® doit s'appliquer.

En attendant, le groupe IFL de l'ATIBT continue de fonctionner pour suivre la mise en œuvre de la motion 23 et pour tester l'application de la motion 23. Un groupe de travail est également en construction avec les membres d'Amérique Latine qui se sont engagés aux côtés de l'ATIBT<sup>31</sup> pour proposer la motion 23.

Les actions post-AG FSC 2021/ 2022 ont permis la rédaction d'une note relative à la mesure intérimaire de la motion 23/2020. Le FSC a publié fin 2022 une version révisée de cette (ADVICE-20-007-18 V2-0), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La suite de l'intervention consistera à suivre la mise en œuvre effective de la motion 23/2020. Le FSC a choisi de mener ce suivi dans le cadre du Focus Forest Advisory Group (FFAG). L'ATIBT maintient ainsi, sa position dans ce groupe pour suivre et participer à ce processus qui se déroulera entre 2023 et 2024.

---

<sup>30</sup> Suite à l'AG FSC, le groupe IFL de l'ATIBT a suivi l'élaboration par le secrétariat du FSC de la note de conseil révisée pour les IFL afin de mettre en œuvre les mesures provisoires requises par la motion 23 adoptée (y compris la note d'interprétation). Cette note a été publiée fin 2022, marquant une première étape pour la mise en œuvre de la motion 23.

<sup>31</sup> L'ATIBT est toujours membre actif du Focus Forest Advisory Group (FFAG), organe représentant les chambres FSC choisi par le FSC pour suivre la mise en œuvre de la motion 23.

Ainsi, le FSC a lancé courant mai 2023, un avis de recrutement à trois postes, pour intégrer le Focus Forest Advisory Group (FFAG) : un représentant pour la chambre économique Nord, un représentant pour la chambre sociale Sud, et un représentant pour la chambre sociale Nord.

Par ailleurs, au sujet des évolutions récentes des annexes CITES, le FSC Int., en association avec Assurance Services International (ASI<sup>32</sup>), a procédé à des vérifications des transactions (TV) sur les chaînes d'approvisionnement certifiées FSC d'Afrormosia (172 titulaires de certificat FSC-FM qui ont Afrormosia (*Pericopsis elata*) dans leur périmètre de certification), également connu sous le nom de « African Teak<sup>33</sup> ».

A noter par ailleurs, que la révision récente de l'annexe II de la CITES, a suscité une requête de l'ATIBT, sur le renforcement de capacité des Etats-Parties de la CITES, dans leurs obligations d'émettre des ACNP <Avis de Commerce Non Préjudiciables<sup>34</sup>> en Afrique centrale, afin d'atténuer les conséquences de ce nouveau classement, qui aujourd'hui, inclut les genres *Azelia*, *Khaya* et *Pterocarpus*.

### 3.2. AXE II : la qualité de l'exploitation industrielle est améliorée

#### Rappel des Indicateurs globaux du PPECF II et PPECF III :

- I.1. les superficies certifiées selon FSC® ou PEFC restent stables (T0= 5,5 Mio ha).
- I.2. les superficies certifiées Légalité (FSC®-CW, OLB, VLC ou comparable) augmentent de 3 Mio. Ha.
- I.6. Les Demandes d'Actions Correctives de procédures EFIR, émises lors d'audits de surveillance et de renouvellement représentent moins de 15% du nombre total de DACs.
- I.8. au moins 50% des concessions forestières certifiées (tous certificats confondus) mettent en œuvre un plan d'appui spécifique (et de qualité) en faveur des Peuples autochtones.
- I.9. au moins 50 % des entreprises certifiées suivant des standards de « Légalité » mettent en œuvre des actions sociales conformément aux exigences de la certification.
- I.10. au moins 75 % des entreprises certifiées FSC® ou PEFC/PAFC réalisent et mettent en œuvre de gestion de faune.
- I.11. au moins 50 % des entreprises certifiées suivant des standards de « Légalité » mettent en œuvre un plan d'action de faune.

#### ▪ Sur l'appui à la bonne gouvernance forestière

<sup>32</sup> <https://www.asi-assurance.org/s/about>

<sup>33</sup> La Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) répertorie l'Afrormosia comme une espèce d'arbre africaine en voie de disparition, et il est susceptible d'être exploité illégalement. (Examen des modèles commerciaux et le volume de bois récolté dans les forêts certifiées FSC et finalement vendu en tant que produits finis). Le Cameroun et la République du Congo sont les principaux sites d'exploitation forestière, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord sont les principaux marchés de consommation de produits Afrormosia certifiés FSC (revêtements de sol et meubles).

<sup>34</sup> Rappelons que les 184 Parties prenantes à la CITES ont convenu que tout commerce de spécimens d'espèces inscrites aux annexes CITES ne pouvait être autorisé qu'« en conformité avec les dispositions de la Convention » qui prévoit que chaque Partie (pays) dispose d'un Organe de gestion et d'une Autorité scientifique. Ainsi, avant que l'exportation de spécimens prélevés dans la nature ne soit autorisée par l'Organe de gestion d'un pays, l'Autorité scientifique qui lui est adossée, doit avoir confirmé que cette exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l'espèce.

**Ligne 2.1 : respect des lois****Action 1 : appui à la lutte contre l'exploitation forestière illégale**

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s)                     | n° DNO                    | Date ANO | Date Contrat | Durée             | Date fin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|
| C123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tous            | Conservation Justice <sup>35</sup> | 167                       | 9/10/17  | 5/12/17      | 40 mois (+12mois) | Clôturé  |
| Contribution PPECF € : 150. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                    | Budget total € : 450. 000 |          |              |                   |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                    |                           |          |              |                   |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ collecte des informations dans la perspective de produire des preuves à l'encontre des exploitants forestiers illégaux,</li><li>▪ assiste technique aux autorités dans l'interpellation des exploitants illégaux et instruction en justice,</li><li>▪ aide au suivi des opérations,</li><li>▪ communication des informations sur ses opérations aux organes de presse,</li><li>▪ formations destinées autant aux forces de l'ordre, aux douanes, aux magistrats et aux Eaux et Forêts.</li></ul> |                 |                                    |                           |          |              |                   |          |

Développé depuis 2018, le projet ALEFI II (C123) est un projet opérationnel avec des missions réalisées dans 298 villages de 5 provinces du Gabon (Ngounié, Nyanga, Moyen-Ogooué, Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem), Les missions réalisées (1106 jours) visent à identifier les exploitants forestiers illégaux en activités, les non-conformités aux Cahiers des Charges Contractuelles et les illégalités dans l'exploitation des Forêts Communautaires.

Ainsi, les informations recueillies par ALEFI II ont conduit à 23 opérations permettant l'interpellation de 44 personnes. Précisons que, ALEFI II a également participé à 37 autres opérations<sup>36</sup> initiées par les autorités et forces de l'ordre, aboutissant à l'interpellation de 50 personnes, soit un total de 94 personnes arrêtées. Ensuite, les juristes du projet collaborent avec les avocats et les parquets de la République en vue de l'obtention de peines dissuasives<sup>37</sup>.

Grâce à un appui constant d'ALEFI aux agents portuaires de Libreville, plusieurs milliers de m3 de bois, dont de grandes quantités de Kevazingo, ont été saisies et à la suite, de hauts responsables, ont été démis de leurs fonctions.

Un rapport final est disponible à l'url <http://www.conservation-justice.org/wp-content/uploads/2023/08/Rapport-Final-ALEFI-II-PPECF-080423-2.doc>.

**Action 2 : appui au dispositif de lutte anti-braconnage de la société Precious Wood et CIB-OLAM**

<sup>35</sup> <http://www.conservation-justice.org/fr/a-propos-de-conservation-justice/>

<sup>36</sup> Parmi les principaux résultats du projet ALEFI, on ne peut manquer de mentionner la participation à d'importantes opérations, telles l'opération Praesidio du 28 février au 9 mars 2019 et au suivi de ce cas particulièrement retentissant et ayant amené au « Kevazingogate ». Ce cas a été organisé avec les Douanes gabonaises, les Eaux et Forêts et l'Organisation Mondiale des Douanes en vue de lutter contre le trafic de produits CITES, qu'ils soient fauniques ou floristiques. Conservation Justice y a participé depuis le début avec l'organisation d'opérations

<sup>37</sup> Avec 11,7% des procédures amenant à des peines de prison ferme, la dissuasion demeure malheureusement faible même si elle peut être assortie sanctions pécuniaires fortes.

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bénéficiaire(s)   | Prestataire(s)       | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée             | Date fin                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| C143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEB Precious Wood | Conservation Justice | 197                      | 24/10/18 | 13/11/18     | 36 mois (+4 mois) | 25/02/22<br><i>Avenant pour Avril 23</i> |
| Contribution PPECF € : 192 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      | Budget total € : 335 850 |          |              |                   |                                          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |          |              |                   |                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ R1 ENQUETES : Les enquêteurs et les informateurs collectent les informations dans la perspective de produire des preuves à l'encontre les grands braconniers et trafiquants de faune dans et en périphérie de la concession forestière PW-CEB mais aussi dans les centres de trafic de faune éloignés en fonction des informations récoltées.</li><li>▪ R2 OPERATIONS : Le projet assiste les Eaux et Forêts, l'Agence Nationale des Parcs Nationaux et les forces de l'ordre dans l'interpellation des grands braconniers et trafiquants de faune et l'acheminement des plaintes devant les juridictions.</li><li>▪ R3 ASSISTANCE JURIDIQUE : Le Projet dispose d'une cellule juridique qui aide au suivi des opérations et des cas en justice.</li><li>▪ R4 INFORMATION : Le projet transmet des informations sur ses opérations aux organes de presse, ce qui constitue une mission d'éducation et sert de moyen de dissuasion.</li></ul> |                   |                      |                          |          |              |                   |                                          |

Vu la restructuration urgente et toujours en cours de la CEB-PW, une situation d'avancement sera présentée dans le prochain rapport semestriel, une fois que l'entreprise aura reconfiguré son modèle d'exploitation. Mais, vu les turbulences que traverse la filière bois au Gabon, à fin septembre, il est à craindre que cette action ne finisse par devoir être mise fortement en veilleuse.

## Ligne 2.2 : Droits des travailleurs et conditions de travail

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s) | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| C231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tous            | BFC            | 275                      | 19/10/21 | 3/11/21      | 12 mois | Clôturé  |
| Contribution PPECF € : 166.993                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                | Budget total € : 166.993 |          |              |         |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |                          |          |              |         |          |
| L'objectif est de fournir aux entreprises forestières du Bassin du Congo un assistant numérique mobile pour la réalisation de leurs contrôles EFIR-HSE-FAUNE-POPULATIONS RIVERAINES internes.                                                                                                                            |                 |                |                          |          |              |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>OS 1 : développement d'un assistant numérique mobile pour la réalisation des contrôles EFIR ;</li><li>OS 2 : étude de faisabilité pour le développement d'autres assistants numériques pour la réalisation des contrôles « système », HSE, FSAI, CLPA et social interne.</li></ul> |                 |                |                          |          |              |         |          |

Courant février-mars 2023, l'application <Assistant numérique de contrôle> a fait l'objet d'une présentation<sup>38</sup>-formation à Libreville, au siège de l'UFIGA. Ensuite, le lien de téléchargement de l'application a été communiqué à la quasi-totalité des entreprises des cinq pays couverts par le Programme, qu'elles soient certifiées ou non ou qu'elles aient participé ou non, à la formation.

<sup>38</sup> Lien de présentation de l'application

<https://youtu.be/go5VRgz7W4o>

**Architecture du contenu**  
Caractéristiques d'un point de contrôle

**Point de contrôle - Exemple**

- Nom** – Présence du marteau de l'entreprise et du n° forestier sur la souche
- Mode opératoire** – Chaque souche d'arbre abattu correspond à une observation. Le contrôle doit porter sur un minimum de 40 souches. Indiquer en commentaire les noms des points GPS ou du lieu ...
- Méthode d'évaluation** – Compteur de Conformités/Non-conformités
- Pondération** – 1

Formation ANC Phase I

12

Interface de l'application mobile :

- Barre de navigation : ←, Valider
- Statut : Les virages sont tracés sur terrain plat, autant que possible
- Modalité : Nouveau point de contrôle
- Champs de saisie : Entrez le nom du point de contrôle
- Méthode d'évaluation : Sélectionnez une méthode
- Mode opératoire : Décrivez le mode opératoire du contrôle
- Pondération : Sélectionnez une pondération
- Bouton : Enregistrer

Présentation accompagnée du mode d'emploi de l'application (disponible [ici](#)) et d'un tutorial renseigné à l'url ci-dessous :

<https://www.youtube.com/watch?v=DYsYgnUOmdQ>

Suite à cet envoi, le PPECF a mené une enquête courant juin 2023, pour évaluer, trois mois plus tard, l'appropriation de l'application par les entreprises.

Un résumé de cette [enquête](#) est présenté au tableau 3 ci-dessous :



**Tableau 3 : Résultats liés à l'appropriation de l'utilisation de l'outil ANC EFIR**

| Questions                                                                                                                                   | AEH                                                                                                                                                                                                                                                            | BH                                                                                                                                                     | BSO                                          | EGG                            | JBG                                                                                                                                                      | GW/BSG                                                                                                                                                                                    | KHLL F                                                                                                                                                    | PCW-CEB         | RG              | SUNRY          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| De 0 à 10, quel niveau d'importance donneriez-vous aux contrôles EFIR en entreprise ?                                                       | 8/10                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/10                                                                                                                                                  | 8/10                                         | Nous ne pouvons-nous prononcer | 9/10                                                                                                                                                     | 6/10                                                                                                                                                                                      | 10/10                                                                                                                                                     | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |
| Avant l'Assistant Numérique de Contrôle EFIR, à quelles difficultés principales faisiez-vous face dans l'organisation de vos contrôles EFIR | -difficultés à comprendre et utiliser les indicateurs quantitatifs par l'équipe<br>-absence de rapport statistiques<br>-non-respect des textes légaux pendant les contrôles<br>-mauvaise formulation des actions correctives<br>-difficulté de suivre les DACs | Le contrôleur n'avait pas de téléphone Android, mais BH l'a fourni. L'installation du logiciel va se faire, puis la formation du contrôleur en interne | L'objectivité des appréciations /évaluations | Aucune réponse                 | -Impression et transport des fiches physique<br>-Rédaction des rapports hebdo et mensuel<br>-Analyse et calcul des données<br>-Transmission des rapports | Réalisation des contrôles et suivi des actions correctives<br><br>L'identification de certaines actions correctives, ainsi que la mise en place et le suivi de ces actions correctives    | -Moyens de transports permanent<br>-Manque d'outils de travail (ordi, appareils photos, doc planification<br>-Manque de prise de considération de rapport | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |
| Quelles étaient vos pratiques avant l'utilisation de l'Assistant Numérique de Contrôle EFIR ?                                               | Utilisation des fiches de suivi-évaluation journalière et mensuelles                                                                                                                                                                                           | Lors des contrôles sur le terrain, BH utilise des Fiches de contrôles physiques                                                                        | Réalisation de contrôle                      | Aucune réponse                 | Utilisation des fiches de contrôles papier (physique)                                                                                                    | Utilisation de fiches de contrôle de surveillance des activités<br><br>Remplissage des Fiches d'évaluation papier sur le terrain et rédaction de rapports mensuels à partir de ces fiches | Activités de Vérifications : (i) contrôle des souches, culés, piste de fuite d'abattage ; (ii) contrôle d'ouverture de routes ; (iii) contrôle DME        | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |



|                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                 |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Utilisez-vous actuellement l'Assistant Numérique de Contrôle EFIR ?                                  | Oui, conjointement avec nos fiches de suivi-évaluation EFIE (le temps pour notre équipe suivi-évaluation de prendre la main sur l'utilisation de l'ANC-EFIR | Non                                                                                                                                                    | Non                                                  | Non                                                                                    | Non                                                                                                                                                                       | Non                                                                                                                                                                | Non                                                                                                                          | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |
| Dans le cas où la réponse est « non » : pouvez-vous donner la ou les raison (s) ?                    | RAS                                                                                                                                                         | Le contrôleur n'avait pas de téléphone Android, mais BH l'a fourni. L'installation du logiciel va se faire, puis la formation du contrôleur en interne | BSO n'a pas participé à la formation de février 2023 | Nous étions en congé technique, le manque de temps nécessaire est la raison principale | Nous avons déjà une application (CMO qui contient/englobe plusieurs volets : EFIR ; Social, HSE,...) qui nous permet d'effectuer les contrôles EFIR (suivi des activités) | Manque de temps (nous étions engagés dans tellement d'audits juste après la formation de l'ANC) Choix de ne pas changer le mode de fonctionnement avant les audits | -Manque de temps, de ressources, pas d'intérêt au changement de pratiques -besoin d'être formé à l'utilisation de l'ANC-EFIR | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |
| Mettez-vous en œuvre une procédure de contrôle EFIR ? sous quelle forme ? (Formulaires papier ? etc) | Oui, formulaires papiers                                                                                                                                    | Oui, sur format papier                                                                                                                                 | Oui, sur support papier                              | Aucune réponse                                                                         | Oui, procédures EFIR mises en œuvre sous forme numérique via l'application CMO et sous forme physique                                                                     | Oui, avec des fiches de contrôle/évaluation format papier                                                                                                          | Oui, sur support papier                                                                                                      | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |
| Est-elle satisfaisante votre procédure (de 0 à 10 mettre votre niveau de satisfaction)               | 5/10                                                                                                                                                        | 8/10                                                                                                                                                   | 7/10                                                 | Aucune réponse                                                                         | 9/10                                                                                                                                                                      | 7/10                                                                                                                                                               | 8/10                                                                                                                         | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |
| L'implémentation de l'application a-t-elle nécessité une restructuration de votre service EFIR ?     | Non, il a été question pour AEH de former en interne le responsable de l'équipe suivi-évaluation                                                            | NA, car n'utilise pas l'ANC-EFIR                                                                                                                       | NA car n'utilise pas l'ANC-EFIR                      | Aucune réponse                                                                         | Aucune restructuration de notre service EFIR                                                                                                                              | Aucune réponse                                                                                                                                                     | NA car n'utilise pas l'ANC-EFIR                                                                                              | Pas de réaction | Pas de réaction | Aucune réponse |

On constate que :

- la quasi-totalité des entreprises interrogées n'ont pas mis en place l'outil pour des raisons diverses (manque de temps, logiciel déjà présent, inertie à abandonner les supports papiers,...) ;
- néanmoins, les entreprises concèdent que l'exploitation des contrôles est loin d'être optimale et que le reporting post-exploitation en souffre ;
- il n'y a donc pas un rejet de l'application mais une difficulté à changer un système pour un autre.

## Ligne 2.5 : bénéfices générés par la forêt

**Rappelons que pour intensifier la production, trois axes doivent être suivis :** (i) mettre sur le marché des nouvelles essences dont les propriétés technologiques et de durabilité demeurent peu connues, (ii) valoriser de façon éco-efficace et directement sur les sites de transformation les co-produits actuellement non utilisés par l'industrie du bois et iii) accroître les taux de prélèvement.

### ▪ i) Mettre sur le marché des nouvelles essences

Dans le bassin du Congo, où 6,2 millions d'hectares sont aujourd'hui certifiés « Gestion durable » (FSC®-FM et PAFC-BC confondus), le gestionnaire-exploitant est tenu, avant tout, de maintenir les capacités de production et les écosystèmes forestiers intacts (indicateur 5.1.2)<sup>39</sup>.

Dans le cas contraire, les écosystèmes floristiques et faunistiques associés aux espèces exploitées pourraient être perturbés et ceci fragiliserait à terme, la viabilité économique des entreprises<sup>40</sup> réputées durables, avec pour conséquences possibles :

- une diminution des superficies certifiées ;
- une possible remise en question du modèle de concession certifiée « Gestion durable » pourtant jugé « exemplaire » dans le bassin du Congo, depuis deux décennies ;
- l'extension de pratiques d'exploitation non durables.

Il est donc urgent de se préoccuper de la viabilité des concessions forestières sur le temps long (au moins une rotation de 30 ans), notamment, en facilitant la diversification des essences exploitées (voir Actions du PPECF : cf. infra Ligne 2.5.6 <recherche appliquée et amélioration des normes nationales d'exploitation- le cas du Gombé<sup>41</sup> à la CBG> et la requête en préparation (mais non confirmée encore à la date de ce rapport) du groupe INTERHOLCO pour mettre sur le marché de deux nouvelles essences (Kanda et Limbali), après obtention de leur certification<sup>42</sup> Komo<sup>43</sup>.

<sup>39</sup> Pour y parvenir, un taux de prélèvement est calculé pour chaque essence afin d'assurer la reconstitution du stock forestier au cours d'une rotation (entre 25 et 30 ans selon le plan d'aménagement). Bien que ce taux soit censé garantir la pérennité des ressources (critère 5.6), il n'est calculé que sur une seule rotation et une valeur de reconstitution inférieure à 100 % est tolérée par les législations forestières actuelles. Ce qui à terme ne garantit plus le maintien à l'identique de la ressource ligneuse, d'autant que de nombreuses essences phares ont un faible taux de régénération.

<sup>40</sup> L'abandon récent des concessions certifiées de grands groupes (Wijma, Rougier) confirme la dégradation du compte d'exploitation des entreprises forestières du bassin du Congo.

<sup>41</sup> <http://www.boistropicaux.org/bois/37/gombe>


<sup>42</sup> KOMO, créé en 1962 sous les auspices du gouvernement néerlandais, est un label de qualité 100 % volontaire et 100 % privé, destiné à l'industrie du bâtiment et au secteur des infrastructures. Ce label de qualité est largement utilisé et reconnu au niveau international..

<sup>43</sup> <https://www.komoquality.com/>

Si ces deux essences franchissent cette certification, le PPECF aura donc contribué à mettre trois nouvelles essences sur le marché des lamellés collés et aboutés.

Par ailleurs, l'intervention « Dryades » [C197] a permis de mettre en ligne depuis juillet 2023, trois fiches FDES (fiches de déclarations environnementales et sanitaires) sur la plateforme officielle française INIES :

- FDES : Platelages en lames de bois du bassin du Congo toutes essences tropicales, toutes configurations (v.1.1)
- FDES : Bardages en lames de bois du bassin du Congo toutes essences tropicales, toutes configurations
- FDES : Carrelets lamellé-collé<sup>44</sup> en bois du bassin du Congo toutes essences tropicales, toutes configurations (hors accessoires de pose) (v.1.1)

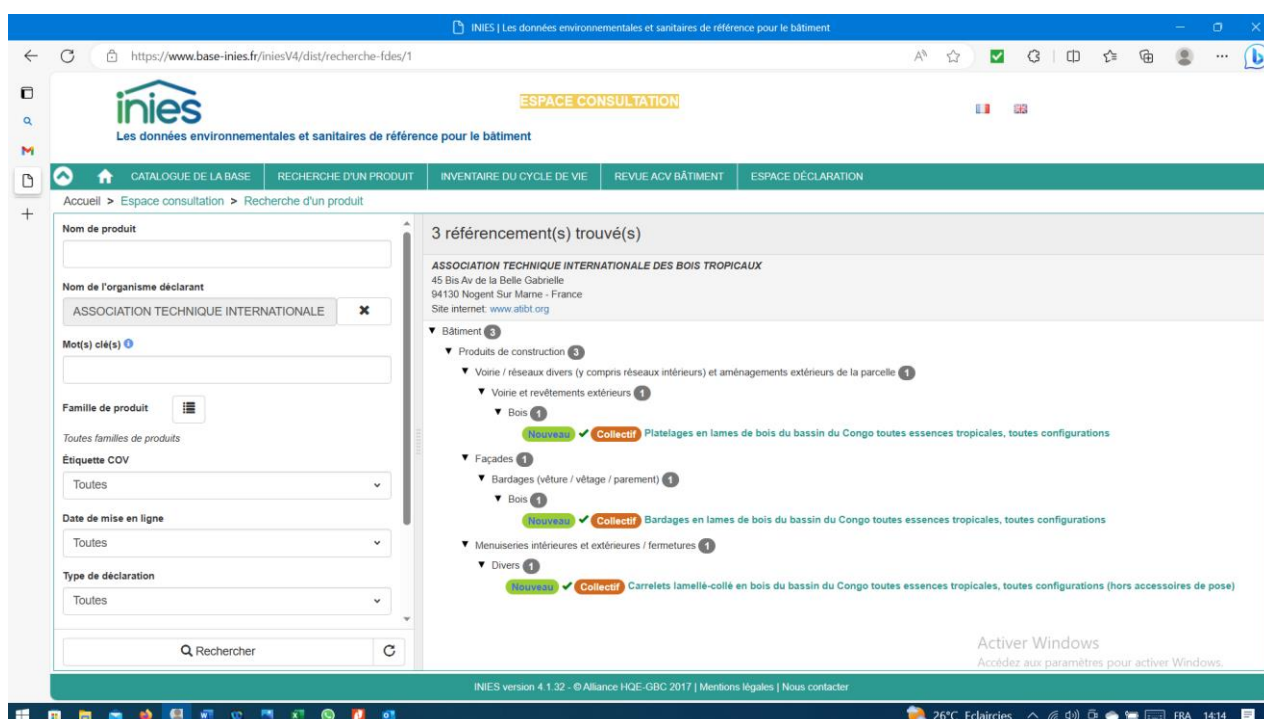

Le FDES revêtements intérieurs et bardages contreplaqués ont été écartées en raison du manque de diversité ou de données collectées.

Pour rendre l'intervention, la plus utile, l'ATIBT et le bureau ESTEANA proposent de réorienter ce budget vers des prestations à plus forte valeur ajoutée (traduction anglaise et néerlandaise des FDES, fiches de synthèse, diffusion des FDES auprès des marchés, actualisation des FAQ, etc.).

- **ii) valoriser de façon éco-efficiente et directement sur les sites de transformation les co-produits actuellement non utilisés par l'industrie du bois**

<sup>44</sup> Le marché des fenêtres en bois tropical étant très développé en France.

Il est évident que si le modèle industriel doit évoluer vers plus d'intensification, celui-ci ne pourra être accepté par les acteurs de la filière, que s'il offre les garanties d'une durabilité suffisante et un impact réduit sur les émissions carbone induites.

Le PPECF, par de nombreuses interventions, notamment par l'étude de la sous-filière biochar **C243**, recherche une réponse efficace à cette deuxième injonction. Ainsi, la première partie du rapport d'étude sur la filière biochar a été mise en ligne sur le site web du Programme.

La CgP a validé une deuxième partie de ce rapport consacré à la rentabilité financière d'une ligne biochar sur les sites des entreprises intéressées par cette transformation de leurs déchets bois et son impact sur le développement rural.

Durant la période, la CgP a vu passer de nombreux articles qui remettent en cause la réalité des mécanismes de compensation carbone et sur la nécessaire réforme des marchés institutionnel et volontaire. Ci-dessous, un échantillon choisi :

<https://fr.businessam.be/shell-retire-ses-billes-les-compensations-co2-achetees-par-les-entreprises-ne-sont-guere-plus-que-du-vent/>

[https://www.liberation.fr/environnement/climat/emissions-de-co-les-credits-carbone-une-solution-qui-va-de-puits-en-pis-20230824\\_GJSYECNEC5C2VP37HO3KDLIEDY/](https://www.liberation.fr/environnement/climat/emissions-de-co-les-credits-carbone-une-solution-qui-va-de-puits-en-pis-20230824_GJSYECNEC5C2VP37HO3KDLIEDY/)

[« Les bénéfices climatiques de la “compensation carbone” sont au mieux exagérés, au pire imaginaires » \(lemonde.fr\)](https://www.lemonde.fr/les-benefices-climatiques-de-la-compensation-carbone-sont-au-mieux-exageres-au-pire-imaginaires)

<https://www.rsedatanews.net/article/article-gouvernance-reglementation-rse-dd-credits-carbone--un-pas-en-avant-vers-plus-dintegrite-2023>

Dans ce contexte de doutes, on peut certainement affirmer que le biochar, est une filière beaucoup plus robuste dans sa capacité à séquestrer le carbone, grâce à la matérialité physique de sa production et la vérification possible de son utilisation dans l'agriculture.

Le comité pour l'agriculture du parlement européen ne s'y trompe pas à en juger son document référencé [AD/1282695EN.docx](#), dont extrait ci-dessous :

#### **Amendment 40**

#### **Proposal for a regulation**

#### **Article 2 – paragraph 1 – point g**

##### *Text proposed by the Commission*

(g) 'permanent carbon storage' means a carbon removal activity that, under normal circumstances and using appropriate management practices, stores atmospheric or biogenic carbon for **several centuries**, including bioenergy with carbon capture and storage and direct air carbon capture and storage;

##### *Amendment*

(g) 'permanent carbon storage' means a carbon removal activity that, under normal circumstances and using appropriate management practices, stores atmospheric or biogenic carbon for **a significant period of time**, including bioenergy with carbon capture and storage, **biochar** and direct air carbon capture and storage;

**Amendment 76**  
**Proposal for a regulation**  
**Article 6 – paragraph 3 – subparagraph 1 (new)**

*Text proposed by the Commission*

*Amendment*

***For biochar use, this provision does not apply if the carbon is bound permanently in a mineral matrix (concrete) or in soil from which it cannot be separated or released.***

**iii) sur les taux de prélèvement**

Nous l'avons dit déjà dit, dans les précédents rapports semestriels du PPECF, l'émergence en République du Congo, d'un nouveau régime d'exploitation, dit « *en partage de production* », est clairement motivé par une intensification des prélèvements (cf. § 4.2.1 <AXE I : les conditions conceptuelles et institutionnelles pour la certification sont mises en place>).

Cependant, les projections de volumes exploités ne sont aucunement garanties par la demande des marchés actuels et sont par ailleurs, largement conditionnées à l'installation de zones franches industrielles (sur le modèle de la zone de NKOK au Gabon) ainsi qu'à l'approvisionnement d'un marché domestique prêt à abandonner l'informel pour du bois à minimum légal, mais plus cher.

A l'heure de ce rapport, des discussions intenses se tiennent entre le secteur privé (appuyé par le PPECF) et l'Administration forestière, afin de trouver un consensus face à la volonté de l'Etat à augmenter la part de la filière bois dans le PIB national, mais pour autant que le modèle concession certifiée de gestion durable adopté par de grandes concessions implantées au nord Congo, puisse être préservé.

**Ligne 2.5.2 : coaching (15 entreprises)**

**Action : appui aux entreprises dont coaching vers la certification**



La dynamique de coaching se maintient avec l'actualisation du diagnostic de SEEF au Cameroun et l'entrée d'une nouvelle entreprise dans le processus de coaching au Gabon (SUTG).

Au final, après 12 semestres d'activités, 36 entreprises sont à présent inscrites à l'appui « coaching » pour un total de 10 516 802 ha, dont 27 ont été diagnostiquées pour une superficie totale de 8 813 421 ha (cf. tableau synthèse).

Le processus d'appui coaching quant à lui, est effectivement engagé au sein de 16 entreprises représentant 5 768 886 ha de concessions forestières. Cette différence entre les surfaces diagnostiquées et les surfaces effectivement appuyées par PPECF s'explique en partie, par la difficulté pour certaines entreprises de s'engager, notamment aux investissements nécessaires, à travers un cofinancement du coaching compris entre 25 % et 50%.

Les graphiques ci-dessous présentent l'évolution des surfaces certifiées sous coaching, et l'évolution du nombre de diagnostic PPECF réalisés.



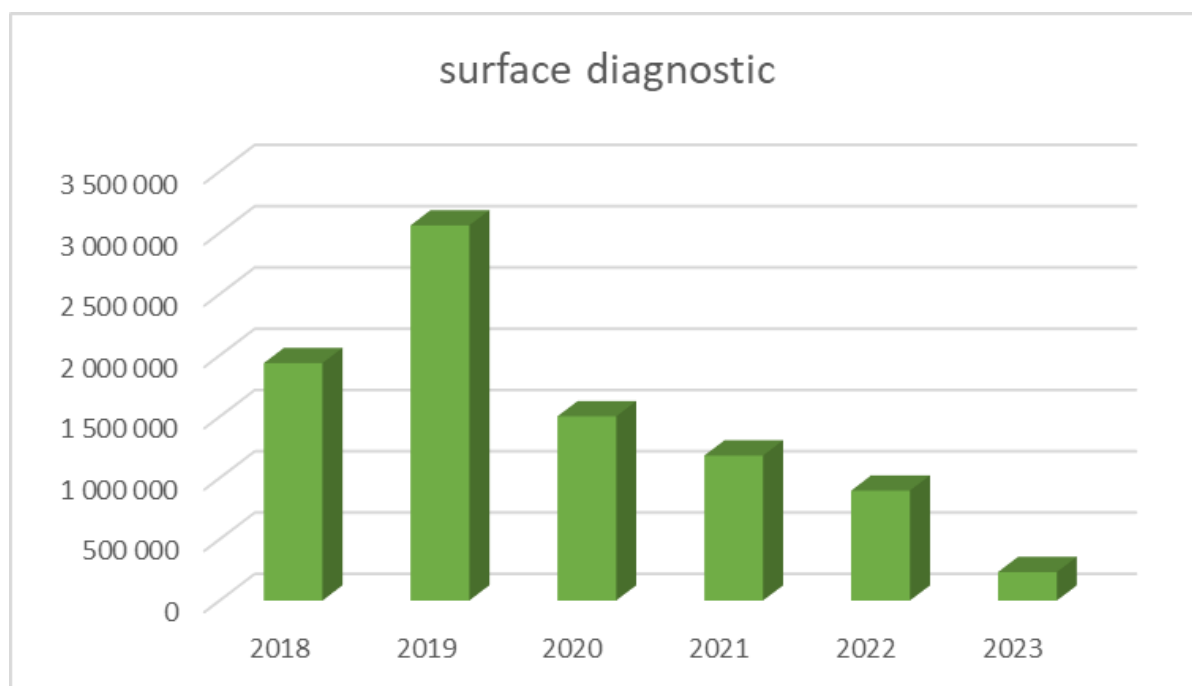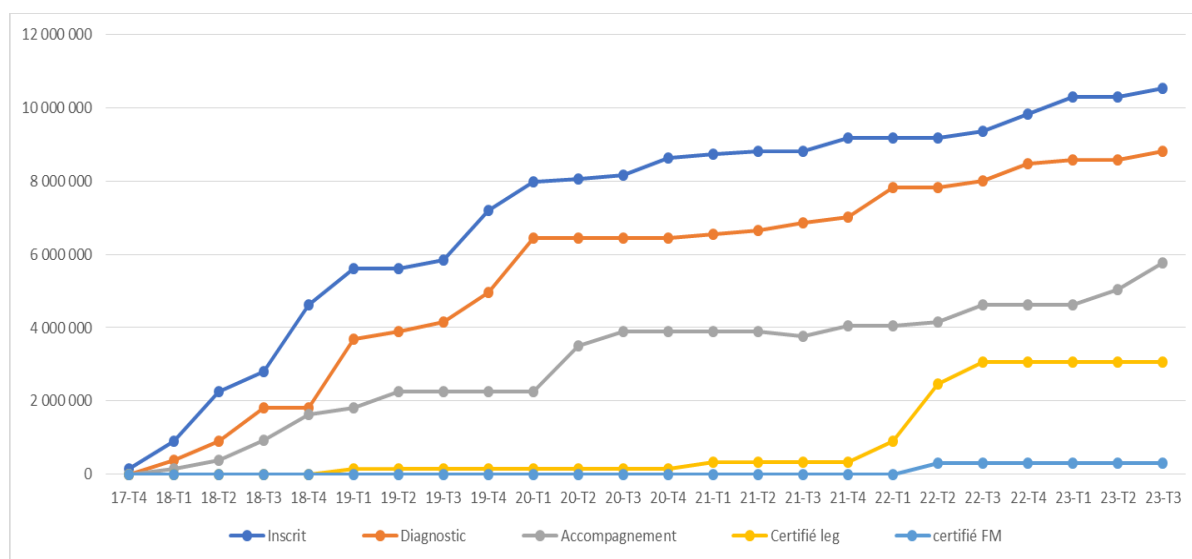

On notera que :

- Le nombre d'entreprises qui confirme leur intérêt à bénéficier d'un coaching PPECF est en régression depuis mi 2020. Actuellement 3 ou 4 entreprises au Gabon seraient encore susceptibles de s'inscrire;
- En fin 2021, les surfaces certifiées « légalité » augmentent fortement, puis se stabilise, la plupart des entreprises engagées dans le processus ayant passé leurs audits. Ainsi, 9 entreprises sur 16 accompagnées ont obtenu un certificat de légalité, pour une surface significative de 3.066.850 ha, surface inchangée depuis 18 mois. Un effort significatif a été mené par le PPECF et les Bureaux d'études pour inciter fortement les entreprises « retardataires » à passer les audits initiaux, dans les meilleurs délais ;
- Une première entreprise a été certifiée « Gestion Durable » avec un certificat PAFC Gabon en mai 2022 pour une surface de 294 829 ha.

## Analyse par pays

---

### Au Gabon

- L'entreprise BSO a su maintenir son certificat PAFC-BC lors de son audit premier audit de surveillance en février 2023 attestant ainsi de la solidité de son certificat, en dépit du changement de propriétaire de l'entreprise et de l'arrêt de l'accompagnement PPECF. BSO est donc la première entreprise qui aura réalisé (sur une période de près de 42 mois et malgré la crise COVID) l'ensemble du processus de coaching vers le certificat de gestion durable PAFC-BC ;
- L'entreprise SBL (hors reprise BSO) a obtenu son certificat OLB en mars 2022 et s'est aussitôt engagé vers le certificat PAFC-BC, sur la base du diagnostic d'actualisation réalisé par le référent PPECF en juin 2022. L'audit de surveillance menée en mars 2023 a donné lieu à des non-conformités majeures, non levées lors de l'audit complémentaire de juin dernier, pour des manquements de déclaration CNSS et CNAMGS. En conséquence, le certificat OLB de l'entreprise a donc été suspendu. Cette situation montre clairement le niveau d'exigence de l'OLB et le fait qu'un audit initial positif ne garantit pas la légalité sur le long terme si l'entreprise ne poursuit pas les efforts nécessaires ou ne consent pas aux changements structurels de ses pratiques ;
- L'entreprise gabonaise SEEF, accompagnée par GFEC, a passé un audit initial OLB en juin 2022 avec succès (certificat émis le 05/09/2022) pour une surface de 398.596 ha. Un diagnostic PPECF complémentaire a été réalisé en mai 2023 pour actualiser le plan d'action vers PAFC-BC avec un objectif de certification pour mai/juin 2024 ;
- L'entreprise Bonus Harvest, accompagnée par le bureau BFConsult, a obtenu son certificat LS le 20/07/2022, et reste en attente d'une date d'audit initial FSC®-PAFC par Bureau Veritas début 2024 ;
- BSG /GWI, appuyé par le bureau TERE, a obtenu en juin 2022, deux certificats de légalité Legal Source pour 3 concessions (GWI 1 et 2 et BSG Otouma). Une mission de diagnostic a été menée en octobre 2022 pour l'accompagnement vers le certificat PAFC-BC. L'audit initial PAFC-BC a été trop anticipé par la DG de l'entreprise en mars 2023, puisqu'il a donné lieu à de nombreuses non-conformités majeures indiquant clairement que l'entreprise n'avait pas encore atteint le niveau d'exigence de ce type de certificat.

Cette précipitation à vouloir aller rapidement vers PAFC-BC sur 3 concessions a sans doute dilué les efforts et conduit à négliger aussi le traitement des non-conformités du niveau LS. Ainsi, le nouvel audit a émis plusieurs non-conformités majeures sur le certificat LS qui a été suspendu (problèmes récurrents de déclaration CNSS et de légalité de contrat). En conséquence, un programme d'action « social interne » d'envergure a été mis en place avec un suivi mensuel par la CgP afin de suivre la régularisation des contrats, l'augmentation des embauches internes CDD/CDI, et la diminution de la sous-traitance et la construction de logements dignes ;

- TTIB a fini l'accompagnement PPECF et prévoyait de passer son audit de légalité en 2020. La pandémie COVID 19 a marqué un coup d'arrêt. Suite à de nombreuses réunions organisées par le référent PPECF, et la pression exercée par la CgP pour aller au bout du processus, la situation qui n'évoluait plus depuis 2021 a été débloquée. Un audit initial OLB est maintenant, prévu en octobre 2023 ;
- L'entreprise AEH (fusion de CORAWOOD et de l'entreprise GRANDE MAYUMBA) a été diagnostiquée en mars 2022. Avec le coaching mis en œuvre par TERE à travers une Assistance Technique (missions courtes et efficace), l'audit est attendu à la fin du premier semestre 2024 ;



- L'entreprise KHLL développe son plan d'action avec l'appui de GFEC vers le certificat OLB. Une mission d'actualisation de son plan d'action vers PAFC-BC a été réalisée en juin 2023. L'audit OLB devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2023 ;
- ASI avait sollicité le changement de son bureau d'études accompagnateur. Au terme d'un processus d'attribution par appel d'offres, le bureau GFEC a été retenu pour reprendre l'accompagnement de la société ASI. Un audit OLB est attendu pour fin 2023 ;
- SUTG est une nouvelle entreprise qui devrait pouvoir bénéficier de l'appui du PPECF avec le coach BFConsult. Le diagnostic ayant été réalisé en juillet 2023, l'entreprise devrait s'orienter vers un certificat OLB puis PAFC BC ;
- Le processus d'accompagnement de l'entreprise GSF a été mis en attente d'informations concernant la poursuite éventuelle du programme après 2023 et de son financement. La situation de FGGFMI et CDG GZES est similaire ;
- Le groupe Rimbunan Hijau, pour lequel les diagnostics et plans d'actions avaient été réalisés par le PPECF en novembre 2019, est passé sous la direction d'OLAM Gabon. L'ex-groupe RH est aujourd'hui engagé vers une première certification sur la base du plan d'action établi par le diagnostic du PPECF, mais sans pour autant solliciter son appui financier ;
- La CGP PPECF vient d'être recontacté par le groupe SUNLY/SUNRY qui serait susceptibles de s'engager rapidement vers le certificat FSC-FM sous réserve du diagnostic et de la disponibilité de financement.

#### **Au Congo**

- ROUGIER MOKABI avait obtenu un certificat LS en 2022. L'entreprise a très récemment sollicité l'appui du PPECF pour s'engager vers une certification FSC-FM avec l'aide du coach BFConsult. La validation finale du plan d'action est en cours ;
- LIKOULA TIMBER a obtenu son certificat OLB en septembre 2022. Aucune décision n'a été prise en termes de certification de Gestion durable ;
- STC (ancien Thanry Wicwood) a perdu son certificat lors du changement de propriétaire et a sollicité l'appui du PPECF pour le récupérer rapidement. L'accompagnement est en cours avec l'appui de TEREa depuis juillet 2023.

#### **Au Cameroun**

Le diagnostic de l'entreprise SEEF-JAMES avait été réalisé sur le terrain en décembre 2021 par la CgP avec le référent Congo. Un audit à blanc PAFC BC a été ensuite réalisé en avril 2023 avec la présence de la CgP PPECF et a permis d'actualiser le plan d'action OLB en y intégrant les UFA 08001 et 08002, pour un total de 107.972 ha. L'objectif est d'aller vers une double certification FSC-FM/PAFC-BC dès 2024.

#### **En République de Centre Afrique**

La société SEFCA qui avait déjà repoussé l'audit initialement prévu en décembre 2020 de 12 mois, a dû le repousser une nouvelle fois de plusieurs mois compte tenu des conditions d'insécurité qui règnent dans le territoire entourant la concession. L'appui du PPECF et l'accompagnement par FRMi ont été prolongés afin de permettre à l'entreprise de tenir ces nouveaux délais. La situation reste malheureusement bloquée et les organismes de certification ne sont pas enclins à envoyer des auditeurs.

## **En RDC**


L'entreprise CFT qui visait l'obtention d'une certification FSC-FM sur 469.574ha, avait renoncé en raison de l'impact de la motion FSC n° 65 dans sa concession. Lors de l'AG FSC de BALI, la motion 23 portée par l'ATIBT et les entreprises membres a été votée après un intense effort de lobbying et de négociation (cf. <Ligne 1.3 : soutien au bureau FSC® Régional & motion n° 65 & n° 34>). Cette motion permettra, dans un processus participatif très large type Focus forest, de redéfinir les IFL avec une approche paysage (qui dépasse les limites de la concession) et une approche terrain permettant de prendre en compte l'historique de l'exploitation forestière, et la réalité écologique des paysages (fonctionnalité, état de conservation, caractère intact) sans dépendre de l'unique approche par cartographie satellitaire (approche carte WRI). La motion 23 est donc de nature à permettre à une entreprise comme CFT d'envisager une gestion de ses IFL de façon plus compatible avec le développement de son exploitation forestière. Le FSC est actuellement en train de travailler avec les représentants des différentes chambres et en collaboration étroite avec le Focus Forest et l'ATIBT pour avancer sur la mise en œuvre de la motion 23.

## **Fonctionnement du coaching**


Le contrat d'Hugues MOUIDY référent Gabon s'arrête en octobre 2023. Pour le Congo, l'appui et l'expertise d'Alain TIOTSOP reste mobilisable en fonction des opportunités et des besoins de suivi.

L'application informatique « FollowAP » développée avec l'assistance technique de BFConsult, permet de suivre en temps réel, l'état d'avancement d'une entreprise et d'avoir une vision globale de toutes les entreprises d'un même pays.

En fin de période (septembre 23), l'ensemble des entreprises sont à jour dans le logiciel de suivi, et les bureaux d'études avec les entreprises, rentrent régulièrement les données qui les concernent.

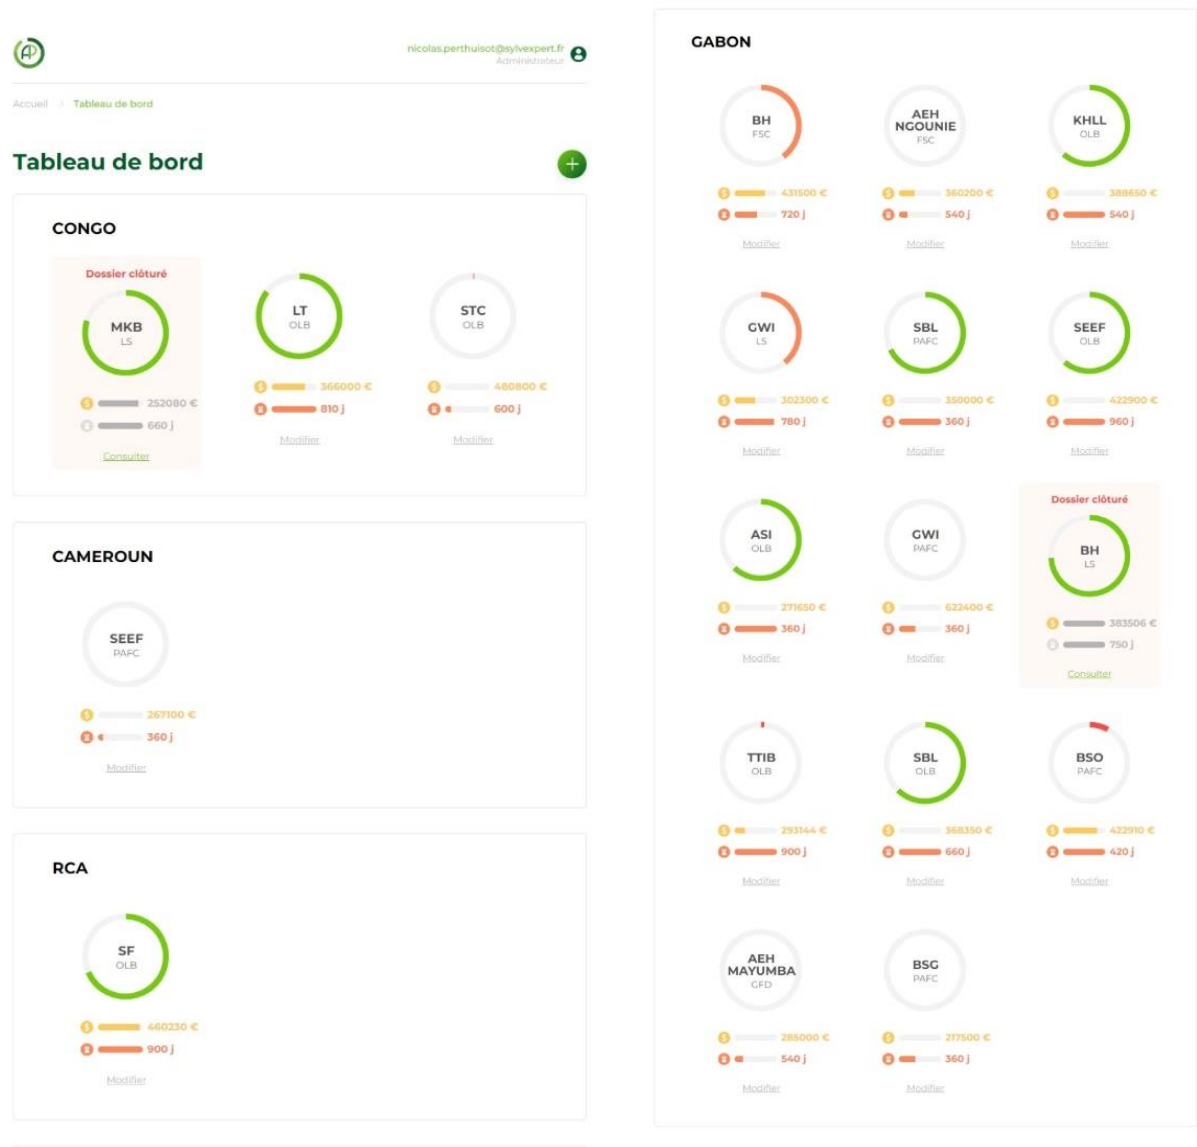

Vue d'ensemble du portail des entreprises

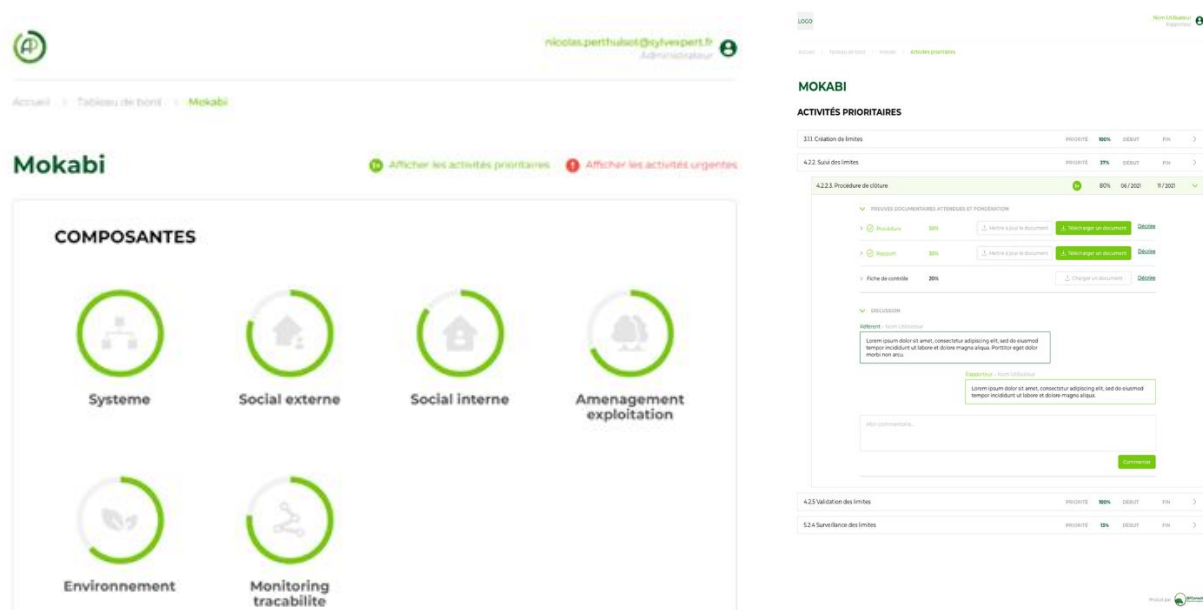

*Exemple de présentation des données de synthèse d'une entreprise par thématique*

## Perspectives

Au Gabon, la fiscalité incitative sur la taxe de superficie et l'obligation de se certifier maintiennent une pression forte sur les entreprises, même si les délais ont glissé vers 2023 pour la légalité et jusqu'en 2025 pour la certification gestion durable. La dynamique de certification dans ce pays, reste donc forte. Les récents bouleversements politiques au Gabon pourraient néanmoins, modifier cette dynamique si le processus d'incitation fiscale n'était pas reconduit par le nouveau gouvernement. Une période d'attente et d'observation est donc à prévoir sur les mois à venir.

A contrario du Gabon, dans les autres pays, la dynamique reste lente voire nulle.

La composante coaching, après une longue phase d'identification et de diagnostic (période 2018/2019) a donc obtenu des résultats intéressants : 16 entreprises sous contrat pour 5,7 Mio ha et 9 certificats de légalité pour 3 Mio d'ha. L'année 2024 devrait permettre de voir encore plusieurs certificats de gestion durable émerger. On observe néanmoins que certains certificats sont fragiles et ont été suspendus provisoirement, en attendant le traitement des non-conformités. Cette situation témoigne du fait que la certification n'est pas aussi simple et qu'elle reste difficile à conserver: l'entreprise doit devenir capable d'intégrer les processus de façon routinière, de conserver les ressources humaines formées, de savoir détecter et corriger les déviations par rapports aux exigences de la norme et répondre rapidement et efficacement aux demandes d'actions correctives. Pour atteindre ce niveau de performance, la certification doit faire partie de la culture de l'entreprise et doit être parfaitement comprise et soutenue par la Direction générales. Ces deux conditions ne sont sans doute, pas encore suffisamment assises, dans les nouvelles entreprises récemment certifiées.

Le tableau suivant synthétise au 31/09/2023 les surfaces effectivement certifiées avec l'appui direct du coaching PPECF, et les surfaces potentiellement certifiables avant la fin du PPECF, selon les déclarations d'intention des entreprises au moment des diagnostics.

| Certificat            | Surface certifiée au 31/08/2023 (ha) | Surface additionnelle potentielle à certifier en ha (fin 24) |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| OLB (BV)              | 1 545 707                            | 2 498 902                                                    |
| LS (P by N)           | 1 373 475                            | 82 985                                                       |
| TLV (CU)              | 147 668                              | 200 125                                                      |
| <b>TOTAL Légalité</b> | <b>3 066 850</b>                     | <b>2 782 012</b>                                             |
| <b>FSC® PAFC-BC</b>   | <b>294 829</b>                       | <b>4 496 587</b>                                             |

Contribution du coaching PPECF à l'évolution globale des superficies certifiées dans le bassin du Congo

| Indicateurs des conventions<br>BMZ 2015 68 203<br>et BMZ 2018<br>67 845<br>(PPECF II & III)                                       | Situation actualisée des indicateurs<br>(au 31 août 23)                                                            | Superficies certifiées par le coaching |                     |                        | Contribution du coaching à l'évolution des superficies au 31 août. 23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Certificat                             | Surface prévue (ha) | Surface certifiée (ha) |                                                                       |
| « Les superficies certifiées selon FSC®-CW, OLB, VLG ou comparable augmentent jusqu'à mi-2023 par 3 Mio. ha. »<br>To= 3,1 Mio. ha | Valeur Cible : +3 Moi d'ha<br>Valeur actualisée(*) : 6,7 Moi (-0,6 Moi d'ha)<br><b>Indicateur satisfait (121%)</b> | <b>Légalité</b>                        |                     |                        | <b>84%</b>                                                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | OLB (BV)                               | 2 431 299           | 1 545 707              |                                                                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | LS (P by N)                            | 406 883             | 1 373 475              |                                                                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | TLV (CU)                               |                     | 200 125                |                                                                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <b>Sous total Légalité</b>             | <b>2 838 182</b>    | <b>3 066 850</b>       |                                                                       |
| « Les superficies certifiées selon FSC® ou PEFC restent stables »<br>To = 5,5 Mio. ha                                             | Valeur Cible : 5,5 Mio<br>Valeur actualisée(*) : 6,2 Moi (+ 0,7 Moi d'ha)<br><b>Indicateur satisfait</b>           | <b>Gestion Durable</b>                 |                     |                        | <b>42%</b>                                                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | FSC® / PAFC                            | 1 646 553           | 294 829                |                                                                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | <b>Total Certifiée</b>                 | <b>4 484 735</b>    | <b>3 361 679</b>       |                                                                       |

(\*) Situation globale dans le bassin du Congo.

Le tableau suivant présente le détail des entreprises sous coaching.

PPECF II & III – 12<sup>ème</sup> rapport semestriel – avril 2023 à septembre 2023

| pays+BS/N36 | entreprise    | surface | intérêt et contact | inscription | diagnostic             | DNO PPECF  | avis NO    | AT           | situation                                                                                                                                                                                                                                                                                 | certif légalité envisa- | certificat obtenu | Objectif |
|-------------|---------------|---------|--------------------|-------------|------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Gabon       | SOM IVAB      | 147 668 | oui                | 1           | janv-18                | 12/02/2018 | 13/04/2018 | TEREA        | audit TLV réalisé en 2020 sur base travail PPECF. En attente decision de l'entreprise d'aller vers FSC/PAFC                                                                                                                                                                               | TLV                     | TLV               | FSC      |
|             | SBL           | 326 985 | oui                | 1           | avr-18                 | 31/05/2018 | 8/10/2018  | GFEC         | Accompagnement en cours. Audit OLB du 2 au 09/11/2021, positif. Certificat officiel OLB mars 2022. Actualisation PA vers PAFC fait. ANO pour PAFC validé par KFW. Audit envisagé fin 2023                                                                                                 | OLB                     | OLB               | PAFC     |
|             | BSO           | 294 829 | oui                | 1           | mai-18                 | 01/02/2019 | 13/03/2019 | TEREA        | Accompagnement VIE - Certificat OLB obtenu. Prolongation de l'accompagnement vers PAFC/FSC validé. Audit initial décembre 2021. Audit complémentaire mars 2022 positif. Certificat PAFC 02/05/2022 sur surface étendue à 294829. Audit PAFC BC du 06 au 13/02/23. 3 mineures non fermées. | OLB                     | OLB               | PAFC     |
|             | TTIB          | 239 429 | oui                | 1           | mars-18                | 18/05/2018 | 5/08/2018  | TEREA fini   | Accompagnement en cours. Avancée lente. Aucune progression depuis 2021 sans proposer une date d'audit. Audit interne GFEC décembre 2022. Dernière relance avril 2023. Signature contrat audit BV Mai 2023 - Audit prévu Septembre 2023                                                    | OLB                     |                   |          |
|             | ASI           | 206 615 | oui                | 1           | sept-18                | 16/10/2018 | 13/12/2018 | GFEC         | Résiliation BFC - Mission actualisation PPECF juillet 2021 Nouvelle contractualisation avec GFEC. Relance du coaching en juin 2022. Audit interne GFEC prévu Avril 2023 Mission suivi PA prévue Juillet 2023                                                                              | OLB                     |                   |          |
|             | SEFF          | 398 393 | oui                | 1           | févr-19                | 25/04/2019 | 5/06/2019  | GFEC         | Audit OLB prévu mars 2022 réalisé juin 2022. certificat septembre 2022. Objectif PAFC assumé. Mission d'actualisation PPECF réalisée Mai 2023. audit PAFC envisagé fin 2024                                                                                                               | OLB                     | OLB               | PAFC     |
|             | BORDAMUR G    | 154 450 | oui                | 1           | sept-19                | 22/11/2019 | 06/08/2020 |              | arrêt du processus. Rachat des concession en cours / OLAM                                                                                                                                                                                                                                 | OLB                     |                   | PAFC     |
|             | TOUJOUR VERT  | 110 737 | oui                | 1           | sept-19                | 22/11/2019 | 06/08/2020 |              | arrêt du processus. Rachat des concession en cours / OLAM                                                                                                                                                                                                                                 | OLB                     |                   | PAFC     |
|             | SFIK Gpe RH   | 134 290 | oui                | 1           | févr-20                | 22/11/2019 | 06/08/2020 |              | arrêt du processus. Rachat des concession en cours / OLAM                                                                                                                                                                                                                                 | OLB                     |                   |          |
|             | CIPLAC Groupe | 202 850 | oui                |             |                        |            |            |              | arrêt du processus. Rachat des concession en cours / OLAM                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                   |          |
|             | GW-BSG        | 402 462 | oui                | 1           | déc-19                 | 02/06/2021 | 09/09/2021 | TEREA-VIE    | Audit réalisé décembre 2021- Audit complémentaire. Certificat LS juin 2022 sur 3 concessions BSG Outouma GW1et 2. Audit PAFC Avril 2023. 11NC MAJEURE- ANO vers PAFC Ok mai 2023                                                                                                          | LS                      | LS                | PAFC     |
|             | Bonus Harvest | 128 000 | oui                | 1           | déc-19                 | 01/02/2020 | 09/04/2020 | BFC          | accompagnement en cours. Pré audit LS 4/09/21- Audit prévu Avril 2022, repoussé juin 2022. Audit positif. Certificat LS Juillet 2022. Mission suivi PPECF juillet 2022. En attente date d'audit FSC 1er semestre 2024                                                                     | LS                      | LS                | FSC      |
|             | EGG           | 256 683 | oui                | 1           | févr-20                | 30/03/2020 | 13/05/2020 | SYLVAFRICA   | Le travail réalisé est valorisé directement par EGG avec appui Sylvafrica non financé PPECF. Audit initial LS fait Octobre 2021 Certificat produit Janvier 2022. Orientation vers FSC/PAFC                                                                                                | LS                      | LS                | FSC/PAFC |
|             | SAF Gpe SUNLY | 181 902 | oui                | 1           |                        |            |            |              | Pause pour règlement contentieux avec Administration Eaux Forêts en 2020/2021 relance de la dynamique 3ième trimestre 2023 avec appui possible BFC                                                                                                                                        |                         |                   | FSC      |
|             | SERN Gpe SUNL | 142 754 | oui                | 1           |                        |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   | FSC      |
|             | HONGLING WOC  | 209 153 | oui                | 1           |                        |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   | FSC      |
|             | AEH           | 435 717 | oui                | 1           | mars-22                | DNO 343 V3 | 11/05/2023 | TEREA        | Création groupe AEH (fusion GMDC CORA) inscription 01/2022. renouvellement TLV CORAWOOD avril 2022. Diagnostic mars 2022 -DNO 343 V3 validée Mai 2023. accompagnement avec AT (Angus Norman par mission courtes)                                                                          |                         | TLV               | FSC      |
|             | SFBT          | 91 682  | oui                | 1           |                        |            |            | GFEC         | Analyse réputationnelle faite, en attente de contractualisation avec BE (précontrat signé). Pb de permis litigieux dans la CFAD. Non prioritaire                                                                                                                                          |                         |                   |          |
|             | PROSPER SARL  | 82 985  | oui                | 1           | janv-21                |            |            | BFC ?        | En attente contractualisation. Règlement contrôle CAF février 2021, contentieux Tribunal Oyem Ok a priori (en attente de preuve). Faible volonté, faible moyen financier, approche peu éthique non prioritaire                                                                            | LS                      |                   |          |
|             | WOOD BOIS     | 100 180 | oui                | 1           | avr-21                 | 30/12/2021 |            | SYLVAFRICA   | Analyse réputationnelle OK - Diagnostic fait et validé. Contact perso DG et NP le 26/07/21 Processus de contractualisation arrêté par l'entreprise                                                                                                                                        | LS                      |                   |          |
|             | KHLL          | 380 489 | oui                | 1           | juin-21                | 27/09/2021 |            | GFEC         | Analyse réputationnelle OK - Diagnostic fait-. Accompagnement en cours par Emile à 100 % depuis 2023 Forte motivation. Mission suivi PPECF juin 2023. Audit prévu fin 2023                                                                                                                | OLB                     |                   | FSC/PAFC |
|             | GSF           | 102 874 | oui                | 1           | En attente suite PPECF |            |            | Green consul | Analyse réputationnelle finalisée                                                                                                                                                                                                                                                         | OLB                     |                   |          |
|             | CDG - GZES    | 362 357 | oui                | 1           | déc-21                 |            |            | GFEC         | Analyse réputationnelle réalisée Septembre 2021 Diagnostic réalisé. Entreprise très loin du niveau minimum. Restitution fait                                                                                                                                                              | LS                      |                   |          |
|             | FG SARL-GZES  | 78 090  | oui                | 1           |                        |            |            | GFEC ?       | Analyse réputationnelle à réaliser                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                   |          |
|             | FTC-GZES      | 100 062 | oui                |             |                        |            |            |              | Contact établi avec PF. Petite entreprise, petite concession                                                                                                                                                                                                                              |                         |                   |          |
|             | SUTG          | 232 603 | oui                | 1           | juil-23                |            |            |              | Echange multiple avec PF - Non prioritaire au départ. Relance avec appui BFC consult. Diagnostic PF réalisé juillet 2023. Inscription faite. DNO en attente du dépôt/situation politique au Gabon                                                                                         |                         |                   |          |
|             | GCIC          | 81 474  | oui                |             |                        |            |            | ETICWOOD ?   | premiers contact Aout 2021 très petite surface !                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                   |          |
|             | RFM           |         | oui                |             |                        |            |            |              | Un contact avec le PF, pas intéressé à ce jour                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                   |          |
|             | TBNI          | 409 326 | oui                |             |                        |            |            |              | Plusieurs contacts avec le PF + NP entre 2019 et 2021 Pas de suites                                                                                                                                                                                                                       |                         |                   |          |
|             | FGGFM I       | 150000  | oui                | 1           | En attente suite PPECF |            |            | Green consul | prise de contact fin 2022. Inscription 09/12/2022. Analyse réputationnelle à programmer                                                                                                                                                                                                   |                         |                   |          |
|             | SBK           | 50887   | oui                |             |                        |            |            |              | contact établi mars 2023- en attente de possibilité de financement PPECF                                                                                                                                                                                                                  | LS                      |                   |          |



PPECF II & III – 12<sup>ème</sup> rapport semestriel – avril 2023 à septembre 2023

|                         |               |            |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
|-------------------------|---------------|------------|-----|---|---------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| RCA                     | TIM BERLAND   |            | oui |   |         |            |            |           | démarrage OLB seul                                                                                                                                                                                                                                                  | LS  |     |         |
|                         | SEFCA         | 721 419    | oui | 1 | juil-18 | 24/11/2018 | 13/12/2018 | FRM       | Accompagnement en cours via AT permanent FRM - Audit juin 2022 prévu mais repoussé pour cause d'insécurité dans le pays. En attente de nouvelles dates mais OC peu disponible + condition de travail non certaine                                                   | OLB |     |         |
| R. Congo                | SEFYD         | 547 026    | oui | 1 |         |            |            |           | relance timide en sept. 2020 par l'entreprise non finalisée                                                                                                                                                                                                         |     |     |         |
|                         | SIFCO         | 621 120    | oui | 1 | janv-19 |            |            |           | Abandon du processus par l'entreprise                                                                                                                                                                                                                               |     |     |         |
|                         | ASIA CONGO    | 803 403    | oui | 1 | mars-19 | 03/03/2020 |            | TEREA     | contractualisation BE en cours après AO. Analyse réputationnelle non finalisée/manque d'info de l'entreprise . Pas de contact                                                                                                                                       | OLB |     |         |
|                         | ROUGIER MOKA  | 586 330    | oui | 1 | févr-20 | 09/04/2020 | 13/05/2020 | BFC       | Accompagnement en cours - Audit LS de recertification octobre 2021, confirmé 31/12/2021 Poursuite de l'accompagnement avec Appui BFC vers FSC                                                                                                                       | LS  | LS  | FSC     |
|                         | LIKOUALA TIMB | 525 500    | oui | 1 | janv-20 | 08/05/2020 | 13/05/2020 | FRM       | Accompagnement en cours via AT permanent FRM . Audit prévu 21-28 février 2022. 3 NC majeur + 7 NC mineur. Audit complémentaire septembre 2022 positif                                                                                                               | OLB | OLB |         |
|                         | STC           | 461 296    | oui | 1 | déc-22  | DNO 368    | 19/06/2023 | TEREA     | Inscription tardive après perte du certificat OLB en 2021, lié à changement dans les équipes de gestion. Expertise et compétence disponible. Objectif de récupération OLB puis recherche FSC Analyse réputationnelle mars 2023. Installation VIE TEREA juillet 2023 | OLB |     | FSC     |
|                         | BPL           | 199 900    | oui | 1 |         |            |            |           | Analyse réputationnelle à faire mais risque de constats négatifs non négligeable.                                                                                                                                                                                   | OLB |     |         |
| RDC                     | IFCO          | 205 608    | oui | 1 | juin-19 |            |            | BFT/TFM ? | Arrêt de la dynamique par l'entreprise. Quelques relances et contacts mais pas de choix de BE. Départ de l'aménagiste en 2020                                                                                                                                       |     | LS  |         |
|                         | BOOMING       |            | oui |   |         |            |            |           | PA non encore validé                                                                                                                                                                                                                                                | OLB |     |         |
|                         | CFT           | 236 822    | oui | 1 | déc-19  | 28/02/2020 |            |           | En attente décision de l'entreprise / IFL du FSC. Abandon de la certification et de la concession à CT ?                                                                                                                                                            |     | LS  | FSC     |
| Cameroun                | SOBOCA        | 40 368     | oui |   |         |            |            |           | en attente volonté entreprise                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |         |
|                         | DINO et fils  | 260 794    | oui |   |         |            |            |           | en attente volonté entreprise                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |         |
|                         | SEEF - JAMES  | 257 051    | oui | 1 | déc-21  | DNO 303    | 27/06/2023 | TEREA     | Analyse réputationnelle faite / référent Congo + diag en 2022. Ajout des 08001et 08002 (UFA 10026) , pour un total de 107.972 ha. Réactualisation PA suite audit à blanc PAFC Mars 2023. accompagnement PPECF PAFC sur 149079 (+ OLB seul sur 107972)               |     | OLB | PAFC BC |
| TOTAL con               | 46            | 11 662 563 |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| TOTAL insc              | 36            | 10 516 802 |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| Total diagn             | 27            | 8 813 421  |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| Total en ac             | 16            | 5 768 866  |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| Total certif            | 9             | 3 066 850  |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| Total certif            | 1             | 294 829    |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| SITUATION AU 31/09/2023 |               |            |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| rajout SUTG             |               |            |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |
| rajout SEEF + STC       |               |            |     |   |         |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |         |

**Ligne 2.5.4 : formations EFIR**

L'EFIR reste au cœur des préoccupations des entreprises qui pour certaines, souhaitent des formations, en dehors de tout objectif de certification. Il est probable que ce type de demande soit en relation avec l'épuisement progressif de la ressource qui, en absence de diversification, nécessite d'être beaucoup mieux gérée.

Cependant, le PPECF étant avant tout, un projet d'appui à la certification, avec pour indicateur principal, l'augmentation des superficies certifiées, ne peut donc donner suite à ces requêtes, si elles ne s'inscrivent pas dans un objectif global de certification, au minimum légale.

**Ligne 2.5.5 : réduction des émissions carbone et de la dégradation des forêts induites par l'exploitation forestière****Action 1 : développement d'une application SIG d'aide à la décision et de gestion (logiciel ASSALA)**

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bénéficiaire(s)  | Prestataire(s) | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| C266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concessionnaires | BFC            | 278                      | 23/08/23 | 10/08/23     | 17 mois | 1/01/25  |
| Contribution PPECF € : 180 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                | Budget total € : 220 000 |          |              |         |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                |                          |          |              |         |          |
| Développement d'une solution complète permettant de répondre aux besoins des entreprises forestières du Bassin du Congo, en matière de planification et de construction de pistes forestières :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                          |          |              |         |          |
| <u>Volet 1 : planification des pistes forestières</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                          |          |              |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ un support de formation illustré traitant de la planification et de sa mise en œuvre d'un réseau de pistes forestières et traitant des particularités liées aux contextes topographiques retrouvés au sein du Bassin du Congo ;</li><li>▪ une vidéo explicative sur la méthode de planification des pistes forestières ;</li><li>▪ un document explicatif présentant les méthodes et bonnes pratiques afin de préparer des jeux de données cartographiques utiles à la planification des pistes forestières ;</li><li>▪ une application SIG d'aide à la décision et de gestion des contraintes liées à la planification des réseaux de pistes forestières (routes, parcs et pistes de débardage), en fonction de paramètres environnementaux et économiques, dont la minimisation des émissions de GES ;</li><li>▪ des journées de formation auprès des gestionnaires forestiers et des cartographes.</li></ul> |                  |                |                          |          |              |         |          |
| <u>Volet 2 : construction de pistes forestières</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                          |          |              |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ une vidéo explicative sur la gestion d'une brigade routière (équipe route) et la planification des opérations de construction et d'entretien du réseau routier ;</li><li>▪ une vidéo explicative sur les méthodes EFIR de construction de routes forestières ;</li><li>▪ une vidéo explicative sur les méthodes EFIR d'ouverture et de mise en œuvre des réseaux de pistes de débardage ;</li><li>▪ une vidéo explicative sur les méthodes EFIR de construction d'ouvrages d'art.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                          |          |              |         |          |

L'intervention s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'Assistance Technique régionale du Programme ECOFAC 6, le PPECF et un consortium de deux bureaux d'études (partenaires du PPECF), BFCconsult et R&SD TECHNOLOGY visant à développer une application SIG d'aide à la décision et à la gestion des contraintes en matière de planification des réseaux des pistes

forestières<sup>45</sup>, avec pour objectif la réduction des émissions de carbone et de la dégradation des forêts induites par l'exploitation forestière.

De manière générale, l'objectif de la planification du réseau routier, est de transporter un maximum de volume par kilomètre de route ouverte tout en minimisant les coûts liés à la construction et à l'entretien des routes mais aussi en protégeant les zones identifiées comme à hautes valeurs de conservation et en minimisant les dégâts en forêt.


L'approche retenue pour la planification des pistes de débardage est l'approche par poche d'exploitation. Celle-ci est développée dans la concept note du logiciel, et dont les principaux éléments sont les suivants. L'Assiette Annuelle de Coupes (AAC) est découpée en poches d'exploitation sur base des résultats de l'inventaire d'exploitation, du réseau routier existant, des distances de débardages par rapport aux tiges à exploiter, du relief, du réseau hydrographique et de la forme de l'AAC elle-même.

Les premières activités menées dans le cadre de cette première phase de développement de la structure technique de l'application ont consisté à préparer un ensemble de supports utiles au démarrage des travaux mathématiques et informatiques :

Pour optimiser les opérations d'exploitation et en faciliter l'organisation, l'AAC est découpée en **poches d'exploitation** :

Sur base des résultats d'inventaire d'exploitation, du relief et du réseau hydrographique de la zone de coupe, le cartographe identifie les poches d'exploitation au moyen des éléments suivants :

- Les limites naturelles (rivières, marécages, barres rocheuses, thalweg, etc...) ;
- Les zones présentant une forte densité de tiges exploitables ;
- Les routes (actuelles et à créer) traversant la zone de coupes ;
- Les limites de l'Assiette Annuelle de Coupe (AAC) ;
- Distances maximales de débardage et de débusquage souhaitées.

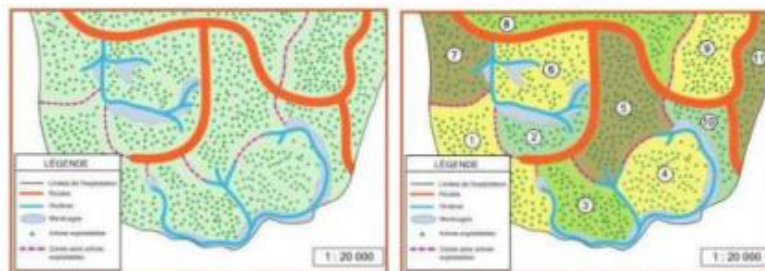

7.2-DES-01 : Exemple de carte de découpage de la zone de coupe en poches<sup>1</sup>

Une poche d'exploitation aura une taille maximale par défaut de 150 ha. Néanmoins, ce paramètre pourra être modifié par l'utilisateur.

Les poches délimitées sont digitalisées sous SIG par le cartographe, qui prépare une carte de découpage de la zone de coupe en poches d'exploitation. Le découpage en poches est validé par le Responsable Aménagement.

<sup>45</sup> Les opérations d'ouverture des routes, parcs et pistes de débardage comptent pour une majeure partie de l'impact du processus d'exploitation sur le couvert forestier et son stock de carbone. Une erreur de planification peut rapidement entraîner de lourds dégâts sur l'environnement et générer des émissions carbone qui auraient pu être évitées. Bien que l'impact des opérations d'exploitation sur l'écosystème forestier soit inévitable, les conséquences d'une mauvaise planification des différents réseaux de pistes forestières sont nombreuses : elles entraînent des surcoûts financiers et environnementaux importants, une augmentation des émissions de GES et une dégradation des services écosystémiques.

## Schéma de fonctionnement

L'application est conçue de sorte que chaque module ou partie de module (cas du module 2) puisse être utilisé indépendamment. A chaque étape, l'utilisateur peut charger ses propres données, ou bien utiliser les données produites en résultat du module précédent, ce qui permettra à l'utilisateur :

- Soit de retoucher manuellement le projet routier avant le passage à la prochaine étape ;
- Soit de tester et poursuivre un travail avec d'autres projets routiers conçus en dehors de l'application

### Tables / Formulaires

- Typologie de la desserte
- Typologie des engins forestiers - Choix des engins et du nombre
- Facteurs de rendement machine
- Facteurs de coût unitaire
- Prix du carburant
- Facteur de conversion des devises
- Facteurs de consommation
- Facteurs d'émission liée à la consommation de carburant
- Facteurs d'émission liée à la perte de biomasse
- Par essence : choix "à récolter" / "à protéger", DME, Q MIN
- Distances de protection : eau, tige protégée, zone protégée
- Pente maximale du terrain

### Couches SIG

- UFA - UFG - AAC - Séries d'aménagement
- Liste des essences possibles
- Liste des essences interdites d'exploitation (Essence, Q, DMA)
- Inventaire d'exploitation (Essence, Q, D, attribut)
- Petits cours d'eau (polyligne)
- Grands cours d'eau (polygone)
- Topographie (MNT - raster)
- Géomorphologie - Microrelief (polygone optionnel)

### MODULE 0 Paramétrage

### Tables / Formulaires

- Tables mises à jour selon spécificités de l'entreprise / de la concession

### Couches

- tige\_exploitable
- tige\_non\_exploitable\_protegee
- densite\_tige\_exploitable
- tampon\_hydrographie
- tampon\_relief
- tampon\_zone\_protegee
- tampon\_tige\_protegee

### Tables / Formulaires

- Typologie de la desserte et des engins forestiers
- Facteurs de rendement, de coûts, de conso et d'émission
- Distances maximales de débardage et de débusquage

### Couches SIG

- AAC + Séries d'aménagement
- Hydrographie - Topographie - Géomorphologie
- Desserte existante (y compris les ouvrages d'art)
- tige\_exploitable
- densite\_tige\_exploitable
- tampon\_hydrographie
- tampon\_relief
- tampon\_zone\_protegee
- tampon\_tige\_protegee

### MODULE 1 Conception du réseau de routes et d'ouvrages d'art

### Couches

- route\_permanente
- route\_principale
- route\_secondaire
- route\_saison\_seche
- digue
- ouvrage\_art

### Tables / Formulaires

- Définir les tailles maximales et minimales des poches

### Couches SIG

- AAC + Séries d'aménagement
- Hydrographie - Topographie - Géomorphologie
- Desserte existante (y compris les ouvrages d'art)
- densite\_tige\_exploitable
- tampon\_hydrographie
- tampon\_relief
- tampon\_zone\_protegee

### MODULE 2 Découpage des AAC en "poches" d'exploitation

### Couche

- poche\_exploitation

### Tables / Formulaires

- Typologie de la desserte et des engins forestiers
- Facteurs de rendement, de coûts, de conso et d'émission
- Distances maximales de débardage et de débusquage
- Segment de route pour le regroupement des grumes


### Couches SIG

- AAC + Séries d'aménagement
- Hydrographie - Topographie - Géomorphologie
- Desserte existante (y compris les ouvrages d'art)
- tige\_exploitable
- densite\_tige\_exploitable
- tampon\_hydrographie
- tampon\_relief
- tampon\_zone\_protegee
- tampon\_tige\_protegee

### MODULE 3 Conception du réseau de pistes et de parcs

### Couches

- piste\_debardage
- piste\_debusquage
- ouvrage\_art
- pag

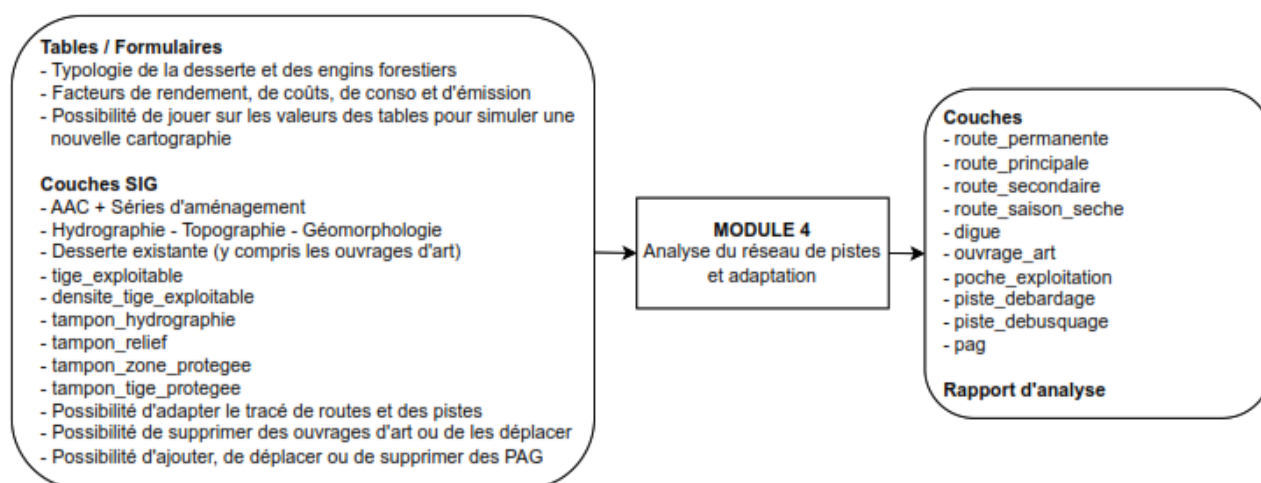

## Ligne 2.5.6 : recherche appliquée et amélioration des normes nationales d'exploitation

### i) Identification de nouvelles essences

Selon les responsables commerciaux des entreprises certifiées, la demande en bois tropical n'est actuellement pas satisfaite en Europe. Il existerait donc des opportunités pour le développement d'essences moins connues : Okan et Fraké/Limba ont déjà fait leurs preuves sur le marché européen et sont désormais bien acceptées, tandis que les Movingui, Kosipo, Kanda, Limbali, Omvong/Eyoum, Gombé, Olon, disposent chacune d'un potentiel à valoriser sur ce même marché.

Dans ce contexte, le PPECF a réitéré une offre d'appui aux compagnies forestières pour faciliter la réalisation de tests d'emplois forts coûteux. Ainsi, après la compagnie CBG au Gabon qui a obtenu un appui du PPECF pour promouvoir le Gombe (cf. Contrat **C222**), le groupe INTERHOLCO a sollicité le PPECF pour promouvoir deux essences le Kanda et le Limbali (voir supra Ligne 2.5 : *<bénéfices générés par la forêt- Mettre sur le marché des nouvelles essences >*).

## Action 1 : actualisation du statut de vulnérabilité des espèces ligneuses exploitées en Afrique centrale

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s)                   | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| C224 & C230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tous            | Nature+ / Gembloux Agro bio tech | 263                      | 12/01/21 | 27/10/21     | 12 mois | Clôturé  |
| Contribution PPECF € : 116 130 (C224) & 42 525 (C230)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                  | Budget total € : 189 655 |          |              |         |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                  |                          |          |              |         |          |
| Analyse de l'état des populations d'arbres commerciaux exploités et à promouvoir, d'Afrique centrale. Il cadre avec les finalités des certifications prônant la « gestion durable », lesquelles exigent des concessionnaires une gestion basée sur l'amélioration continue des connaissances écologiques. Concrètement, l'intervention : |                 |                                  |                          |          |              |         |          |
| (i) compilera des données écologiques pour 20 espèces exploitées ou LKTS,                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                  |                          |          |              |         |          |
| (ii) évaluera leur statut de vulnérabilité via un ensemble d'indicateurs exprimant les risques réels ou potentiels à long terme, et                                                                                                                                                                                                      |                 |                                  |                          |          |              |         |          |
| (iii) proposera des recommandations adaptées aux différents contextes de légalité forestière dans le bassin du Congo.                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                  |                          |          |              |         |          |

Ce projet a permis une analyse du statut de vulnérabilité de 19 espèces exploitées pour leur bois d'œuvre. Les analyses ont mobilisé des données d'inventaires forestiers sur près de 22 millions



d'hectares et sur des données issues de plus de vingt ans de recherche sur la dynamique forestière en Afrique centrale menées par le collectif Dynafac<sup>46</sup>. Un atelier de validation s'est tenu à Libreville (Gabon) en décembre 2022.

Malgré cette étude conduite par l'Université de Gembloux Agrobiotech, un nouveau classement de la CITES oblige les pays d'Afrique centrale, depuis le 23 février 2023, à produire des avis de commerce non préjudiciable (ACNP) spécifiques pour toutes les espèces des genres *Azela*, *Khaya* et *Pterocarpus*, faisant l'objet d'un commerce international. Ce qui concerne la plupart des pays d'Afrique centrale.

Aussi, logiquement, le PPECF a-t-il transmis le 25 août, à la COMIFAC, la **DNO n° 384** relative à un renforcement de capacités des Etats Parties de la CITES pour l'Afrique centrale, dont l'objectif est, dans la continuité des soutiens du PPECF, d'accompagner, dans un délai rapide, les autorités scientifiques des pays d'Afrique centrale dans élaboration d'ACNP<sup>47</sup> pour les principales espèces exploitées des genres *Azela*, *Khaya* et *Pterocarpus* de l'annexe II de la CITES, afin d'éviter la rupture des stocks sur le marché.

L'action vise immédiatement à : (i) produire un modèle type commenté d'ACNP, incluant les parties descriptives et les principes d'aménagement / gestion, (ii) élaborer les modalités de calcul des quotas et décrire les types de données nécessaires en fonction du contexte national, (iii) mettre à disposition un outil de suivi des quotas (suivi des exports), et (iv) organiser un atelier régional de prise en main des outils produits en impliquant les organes CITES des pays d'Afrique centrale.

Sur le plus long terme, l'Action contribuera à rendre les autorités scientifiques des pays d'Afrique centrale autonomes dans les mises à jour de leurs ACNP grâce aux outils mis à leur disposition et au renforcement de leurs capacités apporté.

## Action 2: biochar « Biochar for new forest concession model »

Pour mémoire, le projet « Biochar » a pour objet d'évaluer la faisabilité de mise en place d'un projet de valorisation des déchets ligneux d'entreprises de première transformation de bois en Afrique Centrale, par la transformation par pyrolyse en biochar avec une production d'énergie, et notamment, l'élaboration de rapports technico- stratégiques sur la production et la valorisation de biochar à destination des entreprises forestières partenaires.

Le projet a démarré dans un contexte de crise énergétique et de flambée des prix des hydrocarbures, qui a rapidement fait évoluer l'intérêt des entreprises partenaires, pour la production de « biochar » par pyrolyse, vers un intérêt plus marqué sur le potentiel de production « énergétique » de cette technologie.

La recherche documentaire, l'appui conseil d'un bureau ingénierie et une mission de terrain entre le 31/10/2022 et la mi 2023 auprès des entreprises partenaires (CIB, CEB, GSEZ et PALLISCO), ont permis de présenter les différents scénarios entre production de biochar et production d'électricité<sup>48</sup>, selon un mixte le mieux adapté pour chacune des entreprises partenaires, selon les quantités de déchets bois disponibles et de la consommation énergétique des sites.

<sup>46</sup> Le critère A3 de l'UICN a été majoritairement utilisé, en estimant la réduction de la population projetée, inférée ou suspectée sur 100 ans. Sur dix-neuf espèces étudiées, trois essences présentent un risque de diminution de plus de 30% de leur population et ont été classées vulnérables. Il s'agit du *Kosipo* (*Entandrophragma candollei*), une des deux espèces de tali (*Erythrophloeum ivorense*) et de l'*Ayous* (*Triplochiton scleroxylon*).

<sup>47</sup> Un ACNP validé par le Secrétariat de la CITES étant obligatoire pour l'émission de permis d'exportation.

<sup>48</sup> La technologie de pyrolyse a pour objectif de produire du biochar avec une énergie thermique résiduelle pouvant être valorisée. À contrario, la pyro gazéification permet un bon rendement énergétique mais ne produit qu'une très faible quantité de biochar.



Cependant, plusieurs autres aspects restent à analyser, pour une information complète:

- les contraintes et les bénéfices possibles liés à la certification de séquestration du Carbone par le biochar;
- les effets agronomiques du biochar et son impact économique significatif sur les populations rurales;
- l'analyse financière et la rentabilité globale d'une sous-filière biochar/électricité.

#### Ligne 2.7.4 la vulgarisation des savoirs en matière de gestion durable des forêts

#### Action 1 : appui à la production d'un guide sur les arbres d'Afrique centrale comme outil d'aide à la décision à l'aménagement (GAAC)

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s)                         | n° DNO                             | Date ANO  | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------|
| C185 & C186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tous            | Nature+/<br>Gembloux Agro-<br>Bio Tech | 220                                | 4/06/2020 | 4/06/20      | 42 mois | Fin 2024 |
| Contribution PPECF € : 335 060 & 229 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                        | Budget total € : 403 125 & 508 949 |           |              |         |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                        |                                    |           |              |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dans un premier temps, des fiches techniques par espèce d'arbres seront élaborées. Ces fiches techniques seront disponibles en libre accès sur Internet via une base de données web ;</li><li>▪ Ce projet vise à termes la description de 500 espèces, ce qui correspond à la richesse moyenne d'une forêt d'Afrique centrale (arbres de plus de 10 cm de diamètre, concession de l'ordre de 300.000 ha). Pour la mise en œuvre du projet GAAC, ces espèces peuvent être priorisées en plusieurs catégories selon la disponibilité des données les concernant et la priorité des besoins des parties prenantes.</li></ul> |                 |                                        |                                    |           |              |         |          |

Ci-dessous, la situation d'avancement du guide :

- Tome 1 (écologie, identification, distribution):
  - ✓ 288 fiches écrites, reprenant 604 espèces ;
  - ✓ Les fiches sur la famille Fabacées – Detarioidées ont été envoyées pour relecture aux co-auteurs. Ils doivent donner leur input pour le 1/11/23. Les fiches sont disponibles ici ;
  - ✓ Photos: en plus des partenariats actuels (Gabon, Cameroun, Congo) nous sommes en contact avec un botaniste en RDC pour nous aider à réaliser des photos manquantes.
- Tome 2 (propriétés du bois, utilisations industrielles et traditionnelles, paramètres d'aménagement et de gestion, statut de conservation, etc.):
  - ✓ 141 fiches disponibles ;
  - ✓ Scans de bois de 200 espèces disponibles sur minimum 3 faces, et de 250 espèces sur moins de 3 faces ;
  - ✓ Recherche bibliographique et mise à jour de la base de données ;
  - ✓ Contact partenaires pour mise à disposition de scans de bois qui manquent actuellement (notamment une des faces) ;
  - ✓ Avenant au contrat avec le MRAC (prolongation jusqu'en fin septembre 23).


## Action 2 : développement d'un guide vers la certification

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s)              | n° DNO                   | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| C221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tous            | Eco-Consult & Oréade Brèche | 257                      | 12/01/21 | 1/02/21      | 18 mois | Clôturé  |
| Contribution PPECF € : 268 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                             | Budget total € : 268 094 |          |              |         |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                             |                          |          |              |         |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ installer dans les entreprises, une nouvelle culture basée sur des procédures à mettre en œuvre, des compétences, formation et des mutations nécessaires dans leur fonctionnement et dans leur organisation ;</li><li>▪ de contribuer fortement à la modération de conflits, car la boîte à outils pourra servir de référence arbitrale en cas de litige où très souvent, le manque d'informations voire des a priori erronés sont à leur origine ;</li><li>▪ capitaliser, après dix années, l'expérience du PPECF et celles de ses partenaires (Bureaux d'études, Institutions de recherche, ONGs, etc.) à travers un outil qui fera référence pour de nombreuses années dans la gestion forestière du bassin du Congo.</li></ul> |                 |                             |                          |          |              |         |          |

Le rapport semestriel précédant mentionnait déjà que le contenu du guide était achevé. Aussi, suite à l'avis de non objection [ANO n° 257 & n° 330], le guide est à présent, en phase de mise en ligne en trois langues (français, anglais et mandarin), sur la plateforme de l'ATIBT, après un accord convenu entre elle et la COMIFAC.

La masse d'informations contenue dans ce guide est si considérable et si dense, qu'il est indispensable de fournir avec le guide de certification, des outils de consultations « classiques » par mors clés, auquel s'ajoute un « fil rouge » dédié particulièrement, aux responsables d'une cellule de certification.

Ce fil rouge consiste à une infographie présentant toutes les tâches de chaque responsable d'une cellule de certification, dans un « éclaté » qui permet visuellement, de les mettre en œuvre dans un ordre logique, et en interface constant, avec une documentation technique, conforme aux dernières versions des standards de certification de gestion durable et en référence continue avec le guide de certification.

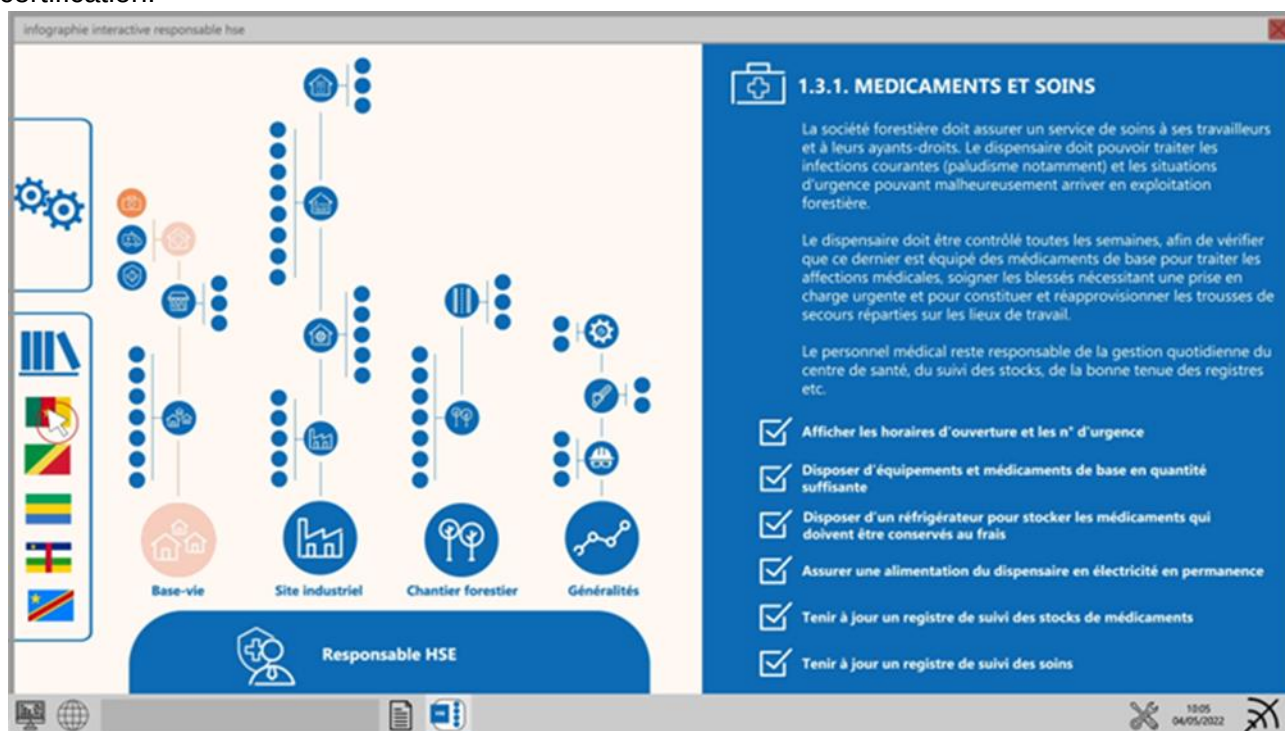

Outre la fonction de consultation du guide, l'infographie permettra aussi de :

- informer sur le fonctionnement des métiers de la certification et améliorer la compréhension des activités à mettre en œuvre par les responsables des cellules certification / gestion durable ;
- constituer un guide et un outil d'auto-formation pour les responsables des cellules certification / gestion durable pouvant être utilisé dans le cadre de la formation continue en entreprise et la mise en œuvre du plan de formation ;
- faciliter la mise en place des postes de responsable de la cellule certification / gestion durable et la mise en œuvre de leurs outils notamment en réponse au turn-over important qui peut parfois être observé sur ces postes à responsabilités ;
- informer et vulgariser les mécanismes de certification et les grands principes de la certification forestière ;
- présenter les avantages et bénéfices de la certification forestière et notamment les résultats de l'étude d'évaluation des coûts et des bénéfices liés à la certification forestière dans le Bassin du Congo, étude réalisée par le PPECF en 2017 ;
- servir de médium de communication vers les entreprises non certifiées, qui trop souvent pensent que la certification leur est impossible à atteindre. Autrement dit, l'outil permettra de démystifier les difficultés d'obtenir une certification et pourra inciter les entreprises non certifiées à s'engager vers l'obtention d'un premier certificat de légalité.

Le 1er rapport de l'intervention, courant juillet 2023, montre que la première phase de l'infographie (sur cinq prévues), relative au « cadrage de la forme et du fond des supports » est à présent achevée. Elle aura porté sur le cadrage du style, la structure, et le contenu des infographies interactives « métier ». La validation par le PPECF, de tous les supports produits permettra d'enclencher les autres phases :

- création de la matière (Phase 2) ;
- conception des supports (Phase 3) ;
- finalisation des supports (Phase 4) ;
- diffusion des supports (Phase 5).

#### **Ligne 2.8.2.a : développement d'outils de suivi et d'évaluation de l'atteinte des objectifs, niveau entreprise**

##### **Action 1 : suite<sup>49</sup> d'assistants numériques mobiles pour le monitoring EFIR des pratiques d'exploitations forestière et leurs réductions des émissions carbone associées**

Voir supra Ligne 2.2 : <Droits des travailleurs et conditions de travail>

Pour rappel, la formation dispensée à Libreville en février et son évaluation, a permis de faire les constats suivants :

- la quasi-totalité des entreprises interrogées n'ont pas encore mis en place l'outil pour des raisons diverses (manque de temps, logiciel déjà présent, inertie à abandonner les supports papiers, ...), un certain nombre témoignent toutefois d'un intérêt pour l'implémentation de l'outil ;
- néanmoins, les entreprises concèdent que la mise en œuvre des contrôles est loin d'être optimale et que le reporting post-exploitation, en souffre ;

<sup>49</sup> « Suite » doit être compris, comme une application comportant plusieurs modules : module EFIR, module HSE, module populations riveraines et module faune.

- il n'y a donc pas un rejet de l'application mais une difficulté à changer un système pour un autre ;
- l'outil nécessite une phase de formation/prise en main terrain ;
- les participants étaient très majoritairement composés de membres des directions des entreprises qui n'ont pas relayé la formation au niveau du personnel pour lequel, l'outil a été conçu.

Malgré tout, quatre sociétés sont actuellement en phase d'implémentation de l'outil (Rougier Mokabi, SEEF Cameroun, Vicwood-Thanry Cameroun, Booming Green). En comptant les trois entreprises gabonaises en volonté d'implémentation (BH, BSO, Rougier Gabon), on peut donc identifier sept entreprises qui font preuve d'un intérêt concret pour l'outil qu'il faut encore confirmer par une réelle appropriation.

Sur suggestion de la CgP, BFConsult va contacter un panel d'entreprises pour leur proposer des formations sur sites, dans le cadre de leur coaching.

## Action 2 : mise en place de la collecte mobile des données au niveau des scieries par les technologies RFID et code-barres - le cas de Precious Woods

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bénéficiaire(s)    | Prestataire(s)        | n° DNO                  | Date ANO    | Date Contrat | Durée  | Date fin |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------|----------|
| C228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precious Woods-CEB | PROSYGMA/<br>ETICWOOD | 283                     | 16 juil. 21 | 11/10/21     | 6 mois | 09/04/22 |
| Contribution PPECF € : 50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       | Budget total € : 54.000 |             |              |        |          |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |                         |             |              |        |          |
| La gestion des flux au niveau des scieries est améliorée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |             |              |        |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ deux portiques sont installés à une tête de scie et deux à l'entrée d'un séchoir et programmés;</li><li>▪ la lecture des codes-barres RFID est intégrée dans les applications mobiles de l'ERP;</li><li>▪ le fonctionnement des équipements sur le terrain est testé, et le personnel formé à leur maintenance;</li><li>▪ les procédures en place sont adaptées aux nouvelles pratiques et en conformité avec les exigences de certification COC;</li><li>▪ le Suivi et évaluation est assuré au bout de 2 mois de collecte de données;</li><li>▪ le coût de l'investissement et son amortissement est évalué sur 5 ans, au regard des erreurs que le dispositif élimine.</li></ul> |                    |                       |                         |             |              |        |          |

L'Action semble très confuse et s'écarter de ses termes de référence. Une rencontre doit avoir lieu avec le Consultant Prosygma pour recadrer l'intervention.

### 3.3. AXE III : « La communication »

#### Actions réalisées durant la période :

**Ligne 3.3 : Appui à l'ATIBT dans la réalisation d'une campagne de marketing des bois africains certifiés FSC® ou PEFC dans minimum 3 pays européens.**

**& Ligne 3.4 : Promotion de l'image des bois tropicaux certifiés en Europe et en Asie**

#### En Europe

##### Action 1 : programme marketing ATIBT

| n° Contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bénéficiaire(s) | Prestataire(s)     | n° DNO                                                                                                                                                      | Date ANO | Date Contrat | Durée   | Date fin   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|------------|
| C129, C130, C131 & C160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tous            | ATIBT ; STRATÉMARK | 179                                                                                                                                                         | 25/06/18 | 7/08/18      | 14 mois | Oct. 2019  |
| C184 & C189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | LINKS Europe       | 259                                                                                                                                                         | 13/05/20 | 25/04/20     | 36 mois | Avril 2023 |
| C198 ; C199 & C200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | ATIBT ; Probos LCB | 241                                                                                                                                                         | 9/12/20  | 22/01/21     | 20      | Sept 22    |
| C223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ESTEANA            | 224                                                                                                                                                         | 5/01/21  | 29/03/21     | 18      | Sept 22    |
| C232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ATIBT              | 292                                                                                                                                                         | 9/11/21  | 23/11/21     | 14      | Jan 23     |
| C237& C242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | AITBT              | 309                                                                                                                                                         | 7/04/22  | 29/04/22     | 2       | Juin 22    |
| C259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ATIBT              | 328                                                                                                                                                         | 15/03/23 | 23/03/23     | 12 mois | Mars 24    |
| Contribution PPECF € :<br>560 700 (C129, C130, C131 & C160) ;<br>600 000 (C184 & C189)<br>140 900 (C223)<br>156 713 (C232)<br>98 500 (C237& C242)<br>41 465 (C259)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                    | Budget total € :<br>906 951 (C129, C130, C131 & C160)<br>747 000 (C184 & C189)<br>153 900 (C223)<br>362 681 (C232)<br>454 240 (C237& C242)<br>41 465 (C259) |          |              |         |            |
| Principaux résultats attendus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                    |                                                                                                                                                             |          |              |         |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>les bois tropicaux (y compris quelques LKTS) sont promus sur les marchés responsables, demandeurs de bois certifiés ;</li><li>les exploitants sont incités à s'engager dans une démarche de contrôle de légalité, puis la certification ;</li><li>les acteurs en aval et les acheteurs publics et privés sont sensibilisés au bilan RSE favorable et aux qualités techniques et naturelles remarquables des bois tropicaux ;</li><li>le bénéfice environnemental et social des bois tropicaux issus d'une gestion forestière durable est démontré auprès des relais d'opinion, aux pouvoirs publics, aux ONG et, in fine, au grand public</li><li>l'accès à une veille juridique en relation avec le RBUE et autres réglementations est facilitée ;</li><li>des outils d'aide à la décision sous forme d'algorithmes (périmètre de rentabilité, choix d'une essence, etc.) sont disponibles et mis en ligne</li><li>d'une façon générale, le programme marketing permettra à l'ATIBT de renforcer sa dimension de syndicat au service de ses adhérents.</li></ul> |                 |                    |                                                                                                                                                             |          |              |         |            |

Rappelons que le programme marketing pour la « Promotion des bois africains certifiés issus d'une gestion durable des forêts tropicales » a été initié par l'ATIBT en 2017 avec le soutien de l'Agence Française de Développement, puis à partir de 2018 de la Coopération Allemande - KfW dans le cadre du PPECF. L'ATIBT, sur ses fonds propres et au travers des cotisations spécifiques des opérateurs Fair&Precious, cofinance en partie le programme.

Si le programme marketing a pu poursuivre, sans trop de difficultés, son activité durant la pandémie COVID-19, l'année 2022 a permis à la profession de se retrouver à l'occasion d'événements majeurs tels que le Carrefour International du Bois (CIB) - Forum ATIBT et l'Assemblée Générale de FSC®. Parallèlement, les acteurs de Fair&Precious ont pu reprendre leurs travaux sur la base de réunions en présentiel / distanciel, pour le déroulement des Commissions Marketing, du Think Tank de l'ATIBT et autres réunions techniques en relation avec le programme marketing.

Rappelons aussi que, dans le courant du second semestre 2022, à l'initiative de la cellule de gestion du PPECF et en renforcement du programme marketing, une Commission ATIBT Marketing & Biodiversité a été constituée et son animation confiée à des partenaires techniques du PPECF (TEREA, ETICWOOD, BFConsult, ..).

L'ATIBT s'est également rapprochée de l'OBC (Organization for Biodiversity Certificates) afin de promouvoir une approche plus large que la composante carbone, de la contribution des entreprises engagées dans la gestion durable des forêts pour le climat et la biodiversité et pouvoir bénéficier de financements spécifiques.

Autre fait marquant du semestre : l'ATIBT s'est engagée, avec l'appui du collectif Fair&Precious sur un nouveau dossier sensible et crucial pour la filière bois tropical, celui de l'exclusion de certaines essences commerciales par la CITES. Cette exclusion mobilise actuellement les acteurs de terrain et les scientifiques pour nuancer les décisions de la CITES, en vérifiant la réalité des menaces qui pèsent sur certaines essences largement exploitées.

S'agissant des indicateurs globaux du programme marketing, ils confirment la dynamique<sup>50</sup> en faveur de la certification légalité et de la certification gestion durable, enclenchée par le volontarisme politique de l'Union européenne, les incitations fiscales (au Gabon) et, sur le terrain, le dispositif de coaching du PPECF.

En outre, la réalisation de 4 films et des reportages photographiques (plus de 1 000 clichés) dans les concessions offre aujourd'hui, à la plateforme Fair&Precious, un moyen de communication de premier ordre pour appuyer ses 10 engagements à travers les différents supports média qui ont été développés.

#### Actions marketing sur la période

- Rapport 2022 du Programme Marketing ATIBT publié courant avril 2023.
- Réunion de la commission « Carbone & Biodiversité » – 06 avril 2023

#### *Newsletter n°8 de la commission «Carbone & Biodiversité » - Avril 2023*

- Projet Dryades : 3 Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire -FDES (bardages, platelages, carrelages) sont en phase de vérification, et seront finalisées d'ici fin 2023, et présentées aux fédérations européennes.
- La deuxième phase de l'intervention Thémis a démarré courant Avril 2023, pour développer des fonctions supplémentaires au tableau de bord, notamment, intégrer des schémas de Due diligence et de métrique carbone, à partir des données d'Analyse du Cycle de Vie - ACV du projet Dryades (financé par le PPECF).
- Assemblée Générale 2023 de l'ATIBT organisée le 2 juin 23 à Nogent-sur-Marne, et présentation du Rapport 2022 du Programme Marketing ATIBT publié courant Avril 2023 ;
- Participation à la 26<sup>ème</sup> session du Comité pour les plantes de la CITES, à Genève, Suisse (5 au 9 Juin 2023) ;
- Side-event organisé le 6 juin à Genève dans le cadre de la 26<sup>ème</sup> session du Comité pour les plantes de la CITES ;

---

<sup>50</sup> Les indicateurs de déroulement du programme restent en progression. Sur le plan qualitatif, on constate avec satisfaction que les médias, les relais d'opinion, les décideurs et les acteurs de la filière sont de plus en plus sensibles au bien-fondé du modèle de la gestion durable des forêts et au fait qu'il constitue une protection face à la déforestation.



- Participation à la table ronde FSC sur le nouveau règlement européen contre la déforestation à l'Académie du Climat (Paris), le 29 juin 23.

### **Schématiquement, le programme marketing continue de s'articuler autour de trois axes :**

#### **Le marketing d'image**

La demande initiale des bailleurs (AFD et KfW) et des professionnels de la filière consistait, en priorité, à diminuer les attaques contre les acteurs engagés dans l'exploitation durable des forêts.

Fair&Precious a parfaitement intégré ce positionnement défensif, mais s'est aussi progressivement orienté vers une communication plus ouverte s'appuyant sur une présentation de l'exploitation forestière<sup>51</sup> comme rempart à la déforestation, et par là, un modèle protecteur des écosystèmes et une source de développement économique et social dans les zones de production.

Le marketing d'image a donc, semble-t-il, permis de modifier l'opinion publique, a priori négative sur la filière bois du Congo, vers une perception plus positive dans le maintien du couvert forestier et ses effets sur le climat et la biodiversité.

Cette stratégie repose sur l'adhésion progressive des relais d'opinion et des influenceurs, dont l'exigence principale est d'apporter la démonstration du bien fondé de nos arguments.

Pour ce, deux ambassadeurs Fair&Precious Edwige EYANG EFFA et Norbert GAMI ont apporté, dans leurs prises de parole, un soutien à la Présidente et au Directeur Général de l'ATIBT. Par ailleurs, les sollicitations des médias dans les différents pays d'Europe de l'Ouest ont pu être satisfaites notamment grâce au concours des deux anciens présidents de l'ATIBT, Robert HUNINK et Olman SERRANO.

#### **Le marketing de marché**

La période post covid a été très prometteuse sur le plan commercial, mais les difficultés se sont ensuite accumulées pour les entreprises : conditions logistiques, prix des carburants, contexte international, inflation, modifications des législations à l'import comme à l'export.

Même si le programme Fair&Precious concerne le marché européen, il convient aujourd'hui de n'en négliger aucun autre. La baisse de la demande chinoise doit interroger sur l'opportunité de développer le marché domestique africain et de développer les ventes en Amérique du Nord.

Outre les partenariats techniques, l'ATIBT a poursuivi les interactions avec les acteurs du marché pour réintroduire les bois tropicaux dans les gammes commercialisés en Europe.

Ainsi, le programme marketing a été prolongé, courant mars 2023, par une nouvelle subvention à l'ATIBT [C259] poursuivant un objectif additionnel, celui de rédiger un guide pratique d'aide à la rédaction des Cahiers de Clauses Techniques Particulières (CCTP)<sup>52</sup> pour les produits bois issus des forêts certifiées du bassin du Congo.

#### **Le marketing d'influence**

Victimes durant très longtemps d'un amalgame avec les forestiers sans scrupules, qui pillent la ressource, détruisent la biodiversité et ruinent les conditions de subsistance des populations locales,

---

<sup>51</sup> En l'absence des ressources nécessaires à l'achat d'espaces publicitaires dans les grands médias européens, l'Action consiste essentiellement à assurer une présence digitale et à démarcher les médias pour obtenir des interviews et des articles de presse. En parallèle de cette action auprès du public, le programme marketing poursuit sa sensibilisation des institutionnels, des acteurs en amont et en aval de la filière au travers de ses publications et des différentes manifestations.

<sup>52</sup> Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite utiliser les bois tropicaux dans un marché public, les difficultés de rédaction des clauses techniques particulière peuvent le décourager, en raison des difficultés techniques ou de difficultés normatives liées au RE2020 (réglementation environnementale – France), ou encore à la due diligence qu'il est nécessaire d'appliquer à cette source d'approvisionnement.

les gestionnaires certifiés sont aujourd'hui, grâce à leur collaboration avec les scientifiques et les ONG, en mesure de faire valoir leur différence.

La plateforme Fair&Precious, offre à ce titre un cadre parfaitement en adéquation avec leurs valeurs et leurs ambitions.

En effet, sous l'impulsion de l'ATIBT, des bailleurs et des partenaires, de plus en plus d'initiatives sont prises pour démontrer la nécessité de déployer le plus largement possible la gestion durable des forêts dans le bassin du Congo.

Rappelons que la mission diplomatique conduite par l'ATIBT, à l'initiative du PPECF, a permis de réintroduire les bois tropicaux certifiés « Gestion durable » dans les appels d'offres de la SOLIDEO<sup>53</sup> à l'occasion de la construction des ouvrages pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

De la même manière l'ATIBT multiplie les prises de parole dans les médias, forums et rencontres institutionnelles et professionnelles<sup>54</sup> pour promouvoir la certification et le développement d'une finance « verte » afin de pérenniser le modèle économique des opérateurs, soutenir les populations et développer les services écosystémiques.

### Bilan et perspectives pour la suite du Programme marketing

Le soutien de la KfW (qui prendra fin en décembre 2023), l'implication essentielle de la cellule de gestion du PPECF en lien avec la COMIFAC, la mobilisation exemplaire des entreprises, de l'ATIBT et de leurs partenaires et la montée en compétence des prestataires ont permis d'enregistrer des résultats très positifs sur l'ensemble des indicateurs.

Ainsi, le programme ne s'est pas contenté d'accroître la performance de ses outils existants. Il a fortement investi dans de nouvelles actions en termes de contenus, de visibilité, et d'influence. Citons :

- la réalisation de 3 films (Épisode 1 : Pour une exploitation responsable - Épisode 2 : Pour la sauvegarde des écosystèmes - Épisode 3 : Pour le bien-être des populations), d'un clip et de 1 000 clichés, offre **des contenus** renouvelés, diversifiés et qualitatifs, à exploiter durant les années à venir ;
- le déroulement du forum de Nantes, à l'occasion du Carrefour International du Bois, avec 3 espaces (Fair&Precious, ATIBT et Bassin du Congo) qui ont connu une très forte fréquentation et offert aux bois tropicaux certifiés **une visibilité** totalement inédite ;
- les nombreuses prises de position de l'ATIBT et des sollicitations médiatiques, institutionnelles et techniques. Cette action **d'influence** positionne désormais le collectif Fair&Precious au cœur des enjeux de la préservation des forêts tropicales.

Cependant la fragilité de la filière reste entière. Retournement de la conjoncture économique, crises internationales, instabilité réglementaire et fiscale, difficultés logistiques ne sont que quelques-unes des difficultés auxquelles la filière est actuellement confrontée, fragilisant leur modèle économique, malgré les efforts entrepris pour protéger la forêt, sa biodiversité et améliorer les conditions de vie des populations, pour satisfaire à des normes de certification, toujours croissantes.

Les crédits « carbone » sont, à cet égard, porteurs de revenus additionnels pour la filière, de même que les crédits « biodiversité ». Mais le chemin est encore bien long, pour obtenir des paiements pour services éco-systémiques rendus, d'autant que les concessionnaires et leurs organisations syndicales, ne se sont pas encore réellement investis dans cette nouvelle économie verte.

---

<sup>53</sup> <https://www.ouvrages-olympiques.fr/fr>

<sup>54</sup> Tel qu'au One Forest Summit

Pour l'heure, le programme marketing, doit continuer à s'inscrire dans la durée autour de la marque et du collectif Fair&Precious dont les cibles demeurent multiples : les institutionnels, les acteurs de la filière, les prescripteurs, les ONG, les médias, les influenceurs et bien sûr le grand public.

Dans le courant du deuxième semestre 2023, il conviendra de définir pour palier le phasing out de la KfW, un mode de financement plus diversifié, s'appuyant à la fois sur la filière, les donateurs et les projets de l'ATIBT, en lien avec la gestion durable des forêts tropicales qui ont nécessairement besoin de compétences en matière de communication pour assurer leur visibilité.

### 3.4.Demandes de non objection (DNO) en cours

Tableau actualisé au 30 septembre 2023

| Libellé                                                    | Budget total<br>Euros | Budget à<br>charge<br>PPECF Euros | Référence au cadre logique du PPECF                                                                                                                    | Avis de la<br>COMIFAC | Date transmission à<br>la KfW |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Avenant n° 3 contrat C123 ALEFI                            | 600 000               | 50 000                            | Lutte contre les activités illégales au Gabon                                                                                                          | Accordé               | 19/04/2023                    |
| Avenant au contrats C250 et C251 (inventaire faunique IFO) | 94 800                | 64 400                            | Lutte contre les activités illégales au Gabon                                                                                                          | Accordé               | 19/05/2023                    |
| Montée en puissance du PAFC-BC                             | 95 500                | 65 500                            | 4 nouveaux standards FSC-PAFC seront élaborés et opérationnels                                                                                         | Accordé               | 22/05/2023                    |
| Inventaire faune par bioacoustique & ADN environnemental   | 430 380               | 299 880                           | De nouvelles méthodes innovantes et plus efficaces permettent de monitorer la faune dans les concessions certifiées.                                   | Accordé               | 28/05/2023                    |
| ACNP CITES                                                 | 180 464               | 18 064                            | La gestion industrielle des forêts dans le Bassin du Congo s'exerce selon les principes de la certification de légalité ou de bonne gestion forestière | Accordé               | 20/09/2023                    |
| Coaching société SUTG                                      | 732 200               | 432 275                           | Les superficies certifiées selon FSC ou PEFC restent stables                                                                                           | Accordé               | 15/09/2023                    |
|                                                            | Total -->             | <b>930 119</b>                    |                                                                                                                                                        |                       |                               |

## 4. Suivi évaluation de la CgP

### 4.1. Suivi-évaluation des interventions du programme

Pour rappel, le dispositif de suivi-évaluation mis en place par le PPECF II & III, suit une approche de gestion axée sur les résultats (GAR), prévoit principalement :

- des tableaux de bord (de suivi des interventions, et de suivi des indicateurs) ;
- un système (d'archivage physique et numérique) de la documentation technique.

Le système propose deux types de tableaux de bord : l'un pour le suivi-évaluation général des interventions, et l'autre pour le suivi-évaluation des indicateurs du Programme.


Au 31 août 2023, le taux d'absorption budgétaire des conventions BMZ 2008667607 (reliquat), et BMZ 201568203 (phase II) est estimé à 93,2 %, pour 100 % du temps écoulé (PPECF II), soit un ratio [pourcentage d'engagement contractuel / pourcentage de temps écoulé] de 1.

Pour mémoire, quelques contrats ont été transférés vers les ressources du PPECF III, et le taux d'engagement sur le budget PPECF III est estimé à 78%, pour un temps écoulé de 84%, soit un ratio [pourcentage d'engagement contractuel / pourcentage de temps écoulé] proche de 1.


Globalement, la moyenne du taux d'absorption (PPECF I & PPECF II) est de 85%, et 92% de temps écoulé, pour un ratio [pourcentage d'engagement contractuel / pourcentage de temps écoulé] proche de 1.

S'agissant du délai d'instruction des requêtes, il est passé à 155 jours en moyenne (+7 jrs par rapport au semestre précédent), principalement sur le segment DNO-ANO (qui nécessite en moyenne 90 jours). Le tableau des engagements au 31 août 2023 (PPECF II et PPECF III) / Suivi des délais contractuels du PPECF II & III (ci-dessous) reprend le suivi détaillé des échéances contractuelles des interventions en cours. S'agissant du niveau des cofinancements, les estimations indiquent un apport moyen de 19 % de la part des concessionnaires et 19% de contributions pour les autres bailleurs.

Evolution du délai d'instruction de requêtes  
(jrs)

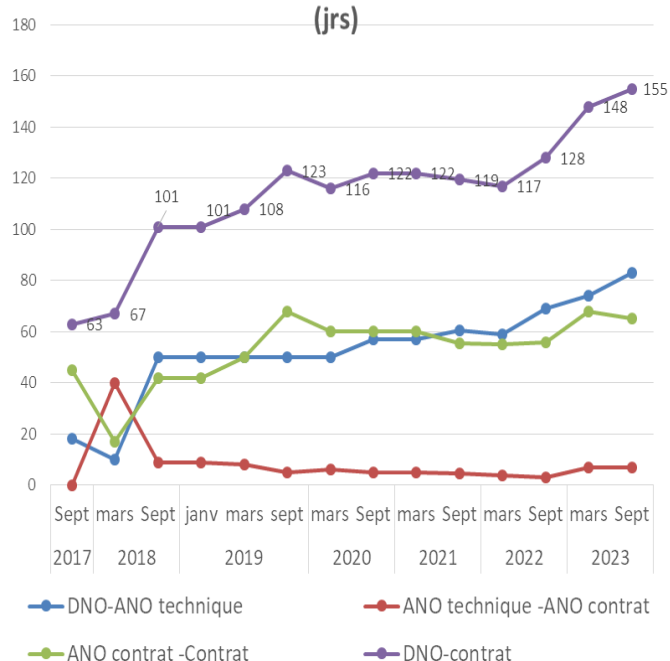

Contributions au budget global des interventions

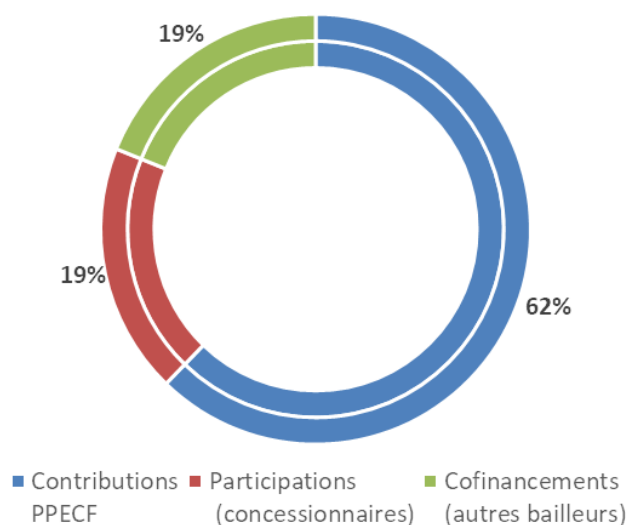

## 4.2. Suivi évaluation des indicateurs du programme

Le dispositif de renseignement des indicateurs est tenu à jour, sur la base de données collectées auprès des bureaux de certification. Ci-après, est présentée la situation actualisée des principaux indicateurs :

|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | valeur atteinte ou dépassée (indicateur vérifié) |
|  | indicateur approchant la valeur recherchée       |
|  | valeur en cours d'acquisition                    |
|  | valeur très faible ou indicateur non atteint     |

**Indicateur 1** : Les superficies certifiées suivant des Standards de Gestion durable (FSC® ou PEFC/PAFC) restent stables.  
T0 = 5,5 Mio. Ha (FSC®)

Valeur actualisée :


FSC® = 5,9 Mio ha (stable) ;

PAFC/PEFC = 891 651 ha (stable)

Total « Gestion Durable » = 6,2 Mio ha (valeur cible dépassée de 12%)

*Surface de CEB/PW en double certification FSC®/PAFC retranchée du total.*

**Evolution des surfaces totales certifiées par type de certificat (Mios d'Ha)**

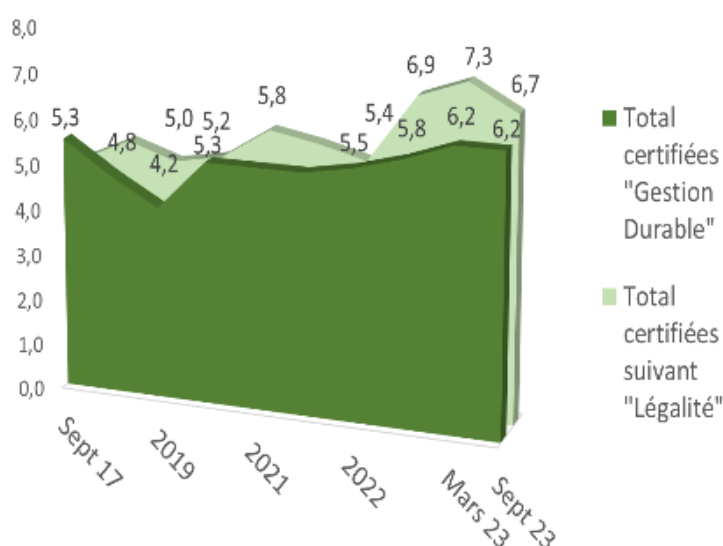

**Indicateur 2** : D'ici fin 2023, les superficies certifiées Légalité (FSC®-CW, OLB, VLC ou comparable) augmentent de 3 Mio. Ha. T0 = 3,1 Mio. Ha ;

Valeur actualisée :

Certifiées OLB = 4.011.635 ha (-326 985 ha); LS= 2.746.993 ha (-402 462) et TLV= 384.196 ha (stable) ; VLC/FLV (n'existe plus, remplacé par le LS de Preferred by Nature).

Total « Légalité » = 6 740 362 ha (-729 447ha par rapport au 11<sup>ème</sup> semestre)

(Valeur cible dépassée de 21%)

*Au cours du semestre, deux certificats de Légalité (récemment certifiés) ont été suspendus, respectivement chez SBL (326 985 ha) en juillet, et chez GWI/BSG (402 462 ha) en Août 23.*

*En cours de coaching PPECF :*

--> Total diagnostiqué : 26 entreprises pour 8 011 550 ha ;

--> Total engagé au coaching : 13 entreprises pour 4 614 802 ha

--> Total certifié à travers le coaching PPECF : 9 entreprises pour un total de 3 066 850 ha

les sociétés SOMIVAB, BSO, SEEF, SBL, Bonus Harvest, EGG et GWI/BSG (au Gabon), Rougier MOKABI et Likouala Timber (au Congo) sont certifiées « Légalité », pour un total de 3 066 850 ha ;

parmi elles, les sociétés SBL, Bonus Harvest, BSO\*, GWI, SEEF et EGG (au Gabon) se sont engagées à obtenir un certificat de « Gestion Durable », pour un potentiel de 1,5 Mio d'ha.

\*BSO (294 829 ha) est déjà certifiée « Gestion durable » suivant le référentiel PAFC Gabon.

**Indicateur 3** : Au moins 04 standards nationaux FSC® ou PAFC /PEFC sont élaborés, testés et validés, d'ici fin 2023. T0= 0

Valeur actualisée : FSC® = 3 nouvelles normes publiées (Cameroun, République du Congo et Gabon) ; PAFC = 3 (Gabon, Cameroun, Régional) ; *valeur stable*

Cible atteinte à 100%

- En plus des deux nouvelles normes nationales FSC® rendues publiques en septembre 2020 pour le Cameroun et pour la République du Congo, la nouvelle norme FSC® du Gabon a été publiée en décembre 2020.  
<https://www.fsc.org/en/document-centre/documents/resource/464>  
<https://africa.fsc.org/fr-cd/actualits/id/426>  
<https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/273>
- Deux normes nationales PAFC sont reconnues par le PEFC (Gabon & Cameroun), ainsi qu'une norme régionale (PAFC bassin du Congo) ;
- En RDC, les processus pour l'élaboration des normes nationales FSC® et PAFC sont relancés.




**Indicateur 4 :** Au moins 75 personnes sont formées d'ici fin 2023, sur les principes de certification de « Légalité » (OLB, VLC) et de « Gestion Durable » (PAFC, FSC®).

T0= Bureau Véritas, 61 personnes formées ; Rainforest Alliance, 20 personnes formées sur PPECF I.

Valeur actualisée :

Total = 143 personnes formées (valeur stable, et cible dépassée de 90%)

*Pas de nouvelle formation en audit enregistrée sur le semestre.*

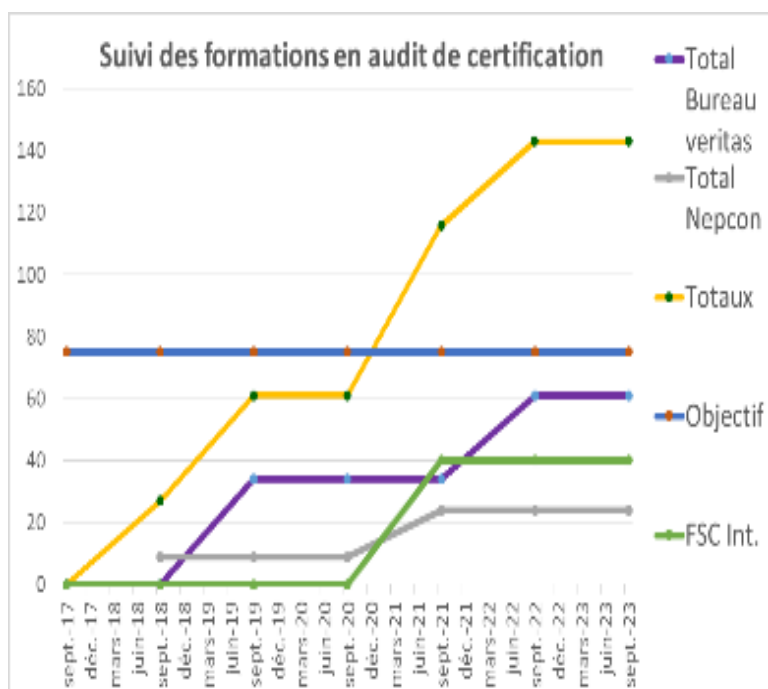

**Indicateur 6 :** Les Demandes d'Actions Correctives émises lors d'audits de surveillance et de renouvellement et qui concernent des manquements aux procédures EFI représentent moins de 15% du nombre total de DACs.

T0 = 13% pour les entreprises certifiées FSC® (juillet 2017)


Valeur actualisée = 16%

(Seuil maximal dépassé)

*L'analyse des données de rapports d'audits confirme le recul dans les pratiques d'exploitation EFIR, observé depuis mars 2023: ainsi, le taux pour les Demandes d'actions correctives (DAC) EFIR est à présent rehaussé à 16 % (au-dessus du seuil maximal fixé pour cet indicateur), soit 1% d'écart par rapport au semestre 11, en partie due au grand nombre de DAC EFIR émises pour des entreprises nouvellement certifiées « Gestion responsable », ou « Légalité ».*

*Cette valeur actualisée intègre TOUS les certificats de niveau « Gestion durable » FSC®, et de « Légalité » OLB et LS. Seule une entreprise certifiée TLV n'a pas été prise en compte dans l'évaluation.*

Source : exploitation/synthèse des rapports public d'audit FSC®, OLB et LS (DAC et observations)

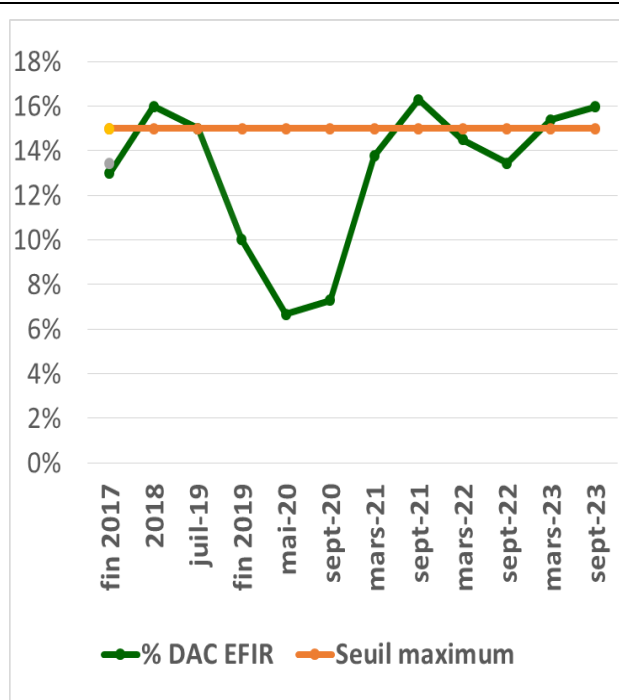

## 5. Tableau des engagements au 30 septembre 2023 (PPECF II et PPECF III)

### Engagements PPECF II au 30 septembre 2023

| N° de contrat                                       | Libellé                                                                                         | Avis de non objection COMIFAC/KFW | N° DNO   | Prestataire          | Montant contrat (€) | Durée de l'intervention | Date de contractualisation | Montant liquidé | Reliquat      | transféré PPECF III | Statut    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>1er semestre (15 septembre 17 au 15 mars 18)</b> |                                                                                                 |                                   |          |                      |                     |                         |                            |                 |               |                     |           |
| Hors contrat                                        | Production d'un mini CV de communication des concessionnaires du bassin du Congo à l'AG FSC     | mail KFW                          | mail KFW | ATIBT                | 17 670              | 0,5                     | 11/09/2017                 | 17 670          | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Envoi du mini CV de communication des concessionnaires du bassin du Congo à l'AG FSC            | mail KFW                          | mail KFW | Nature +             | 5 189               | 0,1                     | 09/10/2017                 | 5 189           | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Organisation du premier CDO de la phase II                                                      |                                   |          | CgP                  | 35 058              |                         |                            | 35 058          | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Appui à la programmation et au plan de convergence de la COMIFAC                                | 11/01/2018                        | 169      | COMIFAC              | 6 270               | 1 semaine               |                            | 6 270           | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Appui à la préparation du Consen des ministres de la COMIFAC de février 2018.                   | 11/01/2018                        | 170      | COMIFAC              | 3 929               | 1 semaine               |                            | 3 929           | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Formation des acteurs en matière forestière (GF) et Chaîne de Traçabilité (CoC)                 | NA                                | NA       | Rain Forest Alliance | 3 805               | 1 semaine               |                            | 3 805           | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Frais bancaires                                                                                 | NA                                | NA       | NA                   | 538                 | 6 mois                  |                            | 538             | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Frais de missions de la CGP                                                                     | NA                                | NA       | NA                   | 17 354              | 6 mois                  |                            | 17 354          | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Installation et soutien à distance du logiciel comptable INFOR Sunsystems                       | NA                                | NA       | GFA                  | 7 299               | 12 mois                 |                            | 7 299           | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Frais IM5 pick-up                                                                               | NA                                | NA       | NA                   | 244                 | 12 mois                 |                            | 244             | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Cérémonie signature officielle COMIFAC                                                          | NA                                | NA       | NA                   | 876                 | 1 journée               |                            | 876             | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Ambassade Allemagne                                                                             | NA                                | NA       | NA                   | 876                 | 1 journée               |                            | 876             | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Sécurité site COMIFAC                                                                           | NA                                | NA       | NA                   | 350                 | 12 mois                 |                            | 350             | -             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Envois courriers                                                                                | NA                                | NA       | NA                   | 76                  | 6 mois                  |                            | 76              | -             |                     | Clôturé   |
| C006                                                | Maintenance site web PPECF                                                                      |                                   |          |                      | 8 100               | 24 mois                 |                            | -               |               |                     | En cours  |
| C099                                                | Caractérisation de classes de résistance de essences                                            | 7/09/2015                         | 37       | ATIBT/FCBA           | 80 177              | 10 mois                 | 28/01/2016                 | 80 177          |               |                     | Clôturé   |
| C100                                                | Caractérisation de classes de résistance de essences (suite)                                    | 7/09/2015                         | 37       | ATIBT/Tu Delft       | 59 200              | 10 mois                 | 28/01/2016                 | 49 200          | 10 000        |                     | Clôturé   |
| C122                                                | Etude d'impact environnemental et social                                                        | 17/11/2017                        | 166      | TEREA                | 0                   | 11 mois                 |                            |                 | -             |                     | Abandonné |
| C123                                                | Appui à la lutte contre l'exploitation forestière illégale au Gabon                             | 10/11/2017                        | 167      | nservation et Justi  | 150 000             | 40 mois                 | 14/12/2017                 | 150 000         |               |                     | Clôturé   |
| C124                                                | Appui à l'urgence et à la validation du système national de certification forestière            | 2/02/2018                         | 168      | PEFC International   | 0                   | 10 mois                 |                            | -               | -             |                     | Abandonné |
| C125                                                | Validation et mise en œuvre du fonctionnement des PROGEPP et USLAB des sociétés CIB, IFO et     | 23/02/2018                        | 174      | nservation et Justi  | 22 400              | 3 mois                  | 13/03/2018                 | 10 055          | 12 345        |                     | Clôturé   |
| C126                                                | Validation et mise en œuvre du fonctionnement des PROGEPP et USLAB des sociétés CIB, IFO et     | 23/02/2018                        | 174      | Orout                | 18 200              | 3 mois                  | 13/03/2018                 | 18 095          | 105           |                     | Clôturé   |
|                                                     |                                                                                                 |                                   |          | <b>Total--&gt;</b>   | <b>436 735</b>      |                         |                            | <b>406 185</b>  | <b>22 450</b> |                     |           |
| <b>2ème semestre (16 mars 18 au 31 décembre 18)</b> |                                                                                                 |                                   |          |                      |                     |                         |                            |                 |               |                     |           |
| Hors contrat                                        | Onctes d'avions des participants à la mission SNCF au Gabon                                     | NA                                | NA       | NA                   | 2 127               | 1 semaine               | N/A                        | 2 127           | 0             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Frais de missions du SEA pour assister à la réunion ATIBT à Paris                               | NA                                | NA       | NA                   | 945                 | 1 semaine               | N/A                        | 945             | 0             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Financement de l'atelier FNUF à Douala                                                          | NA                                | NA       | NA                   | 12 606              | 3 jours                 | N/A                        | 12 606          | 0             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Contribution à l'événement Woodshow organisé par l'ATIBT au Gabon                               | 23/05/2018                        | 184      | ATIBT                | 21 000              | 1 semaine               | N/A                        | 21 000          | 0             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Frais d'intervention de Claude Garcia pour l'atelier "Avenir de la filière bois dans le Bassin" | NA                                | NA       | Claude Garcia (CIR   | 4 060               | 3 jours                 | N/A                        | 4 060           | 0             |                     | Clôturé   |
| Hors contrat                                        | Financement COMIFAC pour leur participation à l'événement Woodshow au Gabon                     | 6/06/2018                         | 186      | NA                   | 20 010              | 1 semaine               | N/A                        | 20 010          | 0             |                     | Clôturé   |

|              |                                                                                                                                     |            |      |                     |                  |                    |            |                  |                |          |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|----------------|----------|----------|
| Hors contrat | Frais bancaires                                                                                                                     | NA         | NA   | NA                  | 5 397            | 9 mois             | N/A        | 5 397            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                                                                                                         | NA         | NA   | NA                  | 27 174           | 9 mois             | N/A        | 27 174           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Divers frais imprévus                                                                                                               | NA         | NA   | NA                  | 4 677            | 7 mois             | N/A        | 4 677            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Production fournitures FLEP (polos, stylos, porte-document...)                                                                      | NA         | NA   | NA                  | 2 306            | 2 semaines         | N/A        | 2 306            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Envois courriers                                                                                                                    | NA         | NA   | NA                  | 412              | 9 mois             | N/A        | 412              | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | One Shot Relation Press                                                                                                             |            | NA   | Open 2 Europe       | 10 000           | 1 mois et 15 jours | N/A        | 10 000           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Atelier de relance du GTGF                                                                                                          |            | NA   | NA                  | 23 005           | 3 jours            | N/A        | 23 005           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Séminaire international SEEAC                                                                                                       |            | NA   | NA                  | 6 708            | 4 jours            | N/A        | 6 708            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Appui d'Atelier (présentation graphique, e-mapping dédié, conférence STTC)                                                          | NA         | NA   | Wik/Bianca Graphis  | 28 751           | 9 mois             | N/A        | 28 751           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Reunion FLEP bruxelles du 23 au 25 novembre 18                                                                                      |            |      | NA                  | 18 041           | 1 semaine          | N/A        | 18 041           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Participation Assemblée atelier SEEAC                                                                                               | NA         | NA   | SEEAC               | 1 697            | 1 semaine          | N/A        | 1 697            | 0              |          | Clôturé  |
| C127         | Amenoration de la prise en compte de la certification vérifiée tierce partie, dans les développer de manière durable et responsable | 5/07/2018  | 182  | ATIBT               | 772 340          | 22 mois            | 30/07/2018 | 614 286          | 158 054        |          | Clôturé  |
| C129         | la filière « bois africains » à travers la promotion développer de manière durable et responsable                                   | 26/07/2018 | 179  | ATIBT               | 144 000          | 14 mois            | 07/08/2018 | 141 204          | 2 796          |          | Clôturé  |
| C130         | la filière « bois africains » à travers la promotion développer de manière durable et responsable                                   | 25/06/2018 | 179  | Stratemark          | 177 000          | 24 mois            | 07/08/2018 | 141 156          | 35 844         |          | Clôturé  |
| C131         | la filière « bois africains » à travers la promotion développer de manière durable et responsable                                   | 25/06/2018 | 179  | Links               | 95 700           | 24 mois            | 07/08/2018 | 88 700           | 7 000          |          | Clôturé  |
| C132         | de l'inventaire au plan de gestion de la faune, développement d'outils pour rencontrer les                                          | 20/07/2018 | 183  | Imbloux Agrobiote   | 57 500           | 30 mois            | 02/10/2018 | 57 500           |                |          | Clôturé  |
| C133         | Capitalisation et vulgarisation des connaissances acquises sur le reboisement en essences locales                                   | 24/07/2018 | 191  | Nature +            | 180 320          | 20 mois            | 05/10/2018 | 180 320          |                |          | Clôturé  |
| C134         | de l'inventaire au plan de gestion de la faune, développement d'outils pour rencontrer les                                          | 20/07/2018 | 183  | Nature +            | 95 000           | 30 mois            | 02/10/2018 | 95 000           |                |          | Clôturé  |
| C135         | Amenoration des rendements matière par le classement des sciages                                                                    | 10/02/2018 | 171  | ATIBT               | 188 000          | 24 mois            | 18/10/2018 | 51 427           | 136 573        |          | Clôturé  |
| C136         | Aiming to increase certified areas while honouring promises"                                                                        | 9/08/2018  | 188  | FSC                 | 349 958          | 31 mois            | 06/12/2018 | 349 958          |                |          | Clôturé  |
| C137         | Appui coaching vers la certification de l'entreprise SOMIVAB                                                                        | 5/10/2018  | 178  | TEREA               | 96 855           | 20 mois            | 05/12/2018 | 24 086           | 72 770         |          | Clôturé  |
| C138         | Etude bathymétrique de la basse Sangha                                                                                              | 4/10/2018  | 196  | GIE-SCVEN           | 21 375           | 1 mois             | 15/11/2018 | 21 375           | 0              |          | Clôturé  |
| C139         | Appui coaching vers la certification                                                                                                | 5/10/2018  | 185  | TEREA               | 146 573          | 20 mois            | 05/12/2018 | 30 822           | 115 750        |          | Clôturé  |
| C140         | Contrat audits financiers PPECF II                                                                                                  | 24/07/2018 | A.O. | Bekolo&Partners     | 27 277           | 4 ans              | 25/10/2018 | 27 277           |                |          | Clôturé  |
| C143         | Lutte contre la criminalité faunique                                                                                                | 24/10/2018 | 197  | nservation et Justi | 192 600          | 50 mois            | 13/11/2018 | 142 600          |                |          | En cours |
| C144         | Optimisation rendements matières de l'exploitation forestière                                                                       | 22/10/2018 | 189  | ETICWOOD            | 48 800           | 6 mois             | 12/12/2018 | 48 800           | -              |          | Clôturé  |
| C145         | Impact de la certification sur la promotion de la gestion durable des forêts                                                        | 16/11/2018 | 208  | ATIBT               | 29 510           | 3 mois             | 12/12/2018 | 29 510           | -              |          | Clôturé  |
| C146         | Impact de la certification sur la conservation faune                                                                                |            | 206  | WWF                 | 90 000           | 48 mois            | 19/12/2018 | 90 000           |                |          | Clôturé  |
|              |                                                                                                                                     |            |      | <b>Total --&gt;</b> | <b>2 901 723</b> |                    |            | <b>2 322 938</b> | <b>528 786</b> | <b>0</b> |          |

3<sup>ème</sup> semestre (01 janvier 19 au 30 juin 19)

|              |                                                                                     |            |     |                     |                  |           |            |                  |                |          |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|------------------|-----------|------------|------------------|----------------|----------|----------|
| Hors contrat | Atelier GTGF de la COMIFAC en RDC                                                   | NA         | NA  | NA                  | 24 139           | 3 jours   | NA         | 24 139           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Envois courriers                                                                    | NA         | NA  | NA                  | 576              | 5 mois    | NA         | 576              | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Formation OLB de Manjeli Aichatou                                                   | 22/11/2018 | NA  | Bureau Veritas      | 1 638            | 1 semaine | NA         | 1 638            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Mission SE de la COMIFAC à Sao Tome&Principe                                        | NA         | NA  | NA                  | 2 729            | 1 semaine | NA         | 2 729            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais bancaires                                                                     | NA         | NA  | NA                  | 5 345            | 5 mois    | NA         | 5 345            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Prestations media/ graphique/ intervention site webdesign /communication/ digitale/ | NA         | NA  | la graphisme/LG De  | 53 769           | 6 mois    | NA         | 53 769           |                |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Organisation 7 <sup>ème</sup> CDO                                                   | NA         | NA  | NA                  | 20 912           | 1 mois    | NA         | 20 912           | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                                                         | NA         | NA  | NA                  | 7 163            | 5 mois    | NA         | 7 163            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Formation OLB Ondoua Adolphe par NEPCON                                             | NA         | NA  | NA                  | 1 263            | 1 mois    | NA         | 1 263            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Participation C. Bracke atelier planification COMIFAC à Nkolandom                   | NA         | NA  | NA                  | 2 222            | 1 semaine | NA         | 2 222            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais divers COMIFAC (carburant, assurances...)                                     | NA         | NA  | NA                  | 788              | 1 mois    | NA         | 788              | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Participation 1 <sup>ère</sup> session FIVOT du SE et juriste de la COMIFAC         | 23/04/2019 | NA  | NA                  | 5 016            | 1 mois    | NA         | 5 016            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais pour le dédouanement des livres CAFF                                          | NA         | NA  | NA                  | 2 001            | 3 mois    | NA         | 2 001            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Production fournitures (poros logo FLECI, stylos, porte documents)                  | NA         | NA  | NA                  | 2 668            | 1 mois    | NA         | 2 668            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Formation NEPCON de V. PELE                                                         | NA         | NA  | NA                  | 2 289            | 1 mois    | NA         | 2 289            | 0              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Dédouanement drone en RCA                                                           | NA         | NA  | NA                  | 13 365           | 2 mois    | NA         | 13 365           | 0              |          | Clôturé  |
| C128         | Projet de développement certification FALC en Afrique Centrale                      | 6/06/2018  | 180 | ATIBT               | 378 250          | 42 mois   | 22/01/2019 | 273 212          |                |          | En cours |
| C142         | Projet de développement certification FALC dans le bassin du Congo                  | 6/06/2018  | 180 | TEREA               | 119 200          | 42 mois   | 22/03/2019 | 116 859          | 2 341          |          | Clôturé  |
| C147         | Identification EHPVal                                                               | 12/12/2018 | 200 | Ambloux Agrobiote   | 199 375          | 48 mois   | 07/02/2019 | 179 375          |                |          | En cours |
| C149         | Appui coaching vers la certification de l'entreprise ASI                            | 13/12/2018 | 203 | Consortium BFC      | 224 250          | 30 mois   | 15/01/2019 | 89 900           | 134 350        |          | Clôturé  |
| C150         | Upgrading du logiciel anti-braconnage SMART                                         | 12/12/2018 | 199 | WCS                 | 203 018          | 18 mois   | 22/03/2019 | 203 018          |                |          | Clôturé  |
| C151         | Intégration l'imagerie drone iDROP certification                                    | 19/03/2018 | 173 | Nature+             | 196 035          | 40 mois   | 18/02/2019 | 196 035          |                |          | Clôturé  |
| C152         | Appui coaching vers la certification de l'entreprise BSO                            | 13/03/2019 | 213 | TEREA               | 208 300          | 30 mois   | 14/03/2019 | 128 156          | 80 144         |          | Clôturé  |
| C153         | Test mécaniques et de durabilités                                                   | 18/11/2018 | 193 | CIRAD               | 50 300           | 30 mois   | 31/05/2019 | 37 075           |                |          | En cours |
| C154         | Protocole de collaboration Bureau Veritas                                           | NA         | NA  | Bureau Veritas      | 40 000           | 48 mois   | 01/10/2019 | 28 796           |                |          | En cours |
| C155         | Appui coaching vers la certification de l'entreprise SEFCA                          | 13/12/2018 | 212 | FRMi                | 241 961          | 31 mois   | 22/03/2019 | 234 516          |                |          | En cours |
| C156         | Formation EFIR                                                                      | 21/01/2019 | 198 | Im:TFM Consulting   | 75 728           | 14 mois   | 07/02/2019 | 75 728           | 0              |          | Clôturé  |
| C158         | Appui au PROGEPP et USLAB de la société IFO                                         | 24/04/2019 | 218 | IFO                 | 60 000           | 8 mois    | 03/05/2019 | 48 000           |                |          | En cours |
| C162         | Optimisation Elefor                                                                 | 30/04/2019 | 215 | Ambloux Agrobiote   | 100 826          | 48 mois   | 21/06/2019 | 90 000           |                |          | En cours |
| C166         | Production charbon de bois tropical certifié FSC                                    | 26/02/2020 | 205 | SIDMARINE           | 19 500           | 4 mois    | 25/06/2019 | 19 500           | 0              |          | Clôturé  |
| C167         | Formation documents camerounais sur la certification des bois tropicaux             | 28/05/2019 | 227 | ATIBT               | 7 600            | 3mois     | 20/06/2019 | 7 130            | 470            |          | Clôturé  |
|              |                                                                                     |            |     | <b>Total --&gt;</b> | <b>2 270 225</b> |           |            | <b>1 873 182</b> | <b>217 305</b> | <b>0</b> |          |

4<sup>ème</sup> semestre (01 juillet 19 au 31 décembre 19)

|              |                                                                                                   |            |     |                     |                |           |            |                |              |          |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|----------------|-----------|------------|----------------|--------------|----------|----------|
| Hors contrat | Stratégie digitale/téléchargement vidéo HD                                                        |            |     | 6LAB/Agent Paper    | 6 100          | NA        | NA         | 6 100          | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                                                                       | NA         | NA  | NA                  | 14 789         | NA        | NA         | 14 789         | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Envois courriers                                                                                  | NA         | NA  | NA                  | 647            | NA        | NA         | 647            | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais bancaires                                                                                   | NA         | NA  | NA                  | 12 965         | 1 mois    | NA         | 12 965         | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais H.Arnaud 7è CDO                                                                             | NA         | NA  | NA                  | 672            | 1 semaine | NA         | 672            | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Appui communication LCB                                                                           | NA         | NA  | LCB                 | 6 000          | NA        | NA         | 6 000          |              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Prestation Graphique LG Design                                                                    | NA         | NA  | LG Design Graphik   | 2 400          | NA        | NA         | 2 400          |              |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Participation COMIFAC forum Shangai                                                               | NA         | NA  | NA                  | 13 224         | 1 mois    | NA         | 13 224         | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Participation financement forum Shangai                                                           | NA         | NA  | ITTO                | 40 194         | 1 mois    | NA         | 40 194         | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais technique juillet 19 Open 2 Europe                                                          | NA         | NA  | Open 2 Europe       | 1 989          | NA        | NA         | 1 989          | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Réparation clime véhicule COMIFAC                                                                 | NA         | NA  | NA                  | 5 488          | 1 mois    | NA         | 5 488          | 0            |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Installation et soutien à distance du logiciel comptable INFOR Sunsystems                         | NA         | NA  | GFA                 | 6 180          | 36 mois   | NA         | 2 367          |              |          | Clôturé  |
| C159         | Formation sécurité abattage e-learning                                                            | 29/05/2019 | 225 | ITG                 | 19 855         | 5 mois    | 01/08/2019 | 16 000         |              |          | Clôturé  |
| C160         | Developper de maniere durable et responsable la filière « bois africains » à travers la promotion | 25/06/2018 | 179 | ATIBT               | 144 000        | 14 mois   | 13/08/2019 | 144 000        | 0            |          | Clôturé  |
| C163         | Logiciel "métier"                                                                                 | 17/05/2019 | 209 | EKWATO              | 30 220         | 5 mois    | 02/07/2019 | 29 493         | 727          |          | Clôturé  |
| C164         | Etude réduction fiscalité entreprises forestières                                                 | 30/04/2019 | 221 | CIRAD               | 44 995         | 5 mois    | 08/07/2019 | 44 995         | 0            |          | Clôturé  |
| C165         | Production charbon certifié FSC                                                                   | 26/02/2020 | 205 | WALE                | 12 500         | 5 mois    | 01/07/2019 | 12 500         | 0            |          | Clôturé  |
| C168         | Refonte site internet programme marketing F&P                                                     |            |     | 6LAB                | 48 450         | 12 mois   | 31/07/2019 | 48 450         |              |          | En cours |
| C169         | Appui processus FLEGT-REDD                                                                        |            |     | TFM-consulting      | 19 200         | 8 mois    | 07/08/2019 | 19 200         | 0            |          | Clôturé  |
| C170         | Relation presse média programme F&P                                                               |            |     | Open 2 Europe       | 204 000        | 24 mois   | 01/04/2019 | 192 000        |              |          | En cours |
| C171         | Communication digitale programme F&P                                                              |            |     | Open 2 Digital      | 136 500        | 12 mois   | 01/04/2019 | 136 500        |              |          | Clôturé  |
| C172         | Analyse comparative système "légalité"                                                            | 29/11/2019 | 233 | Caroline Duhesme    | 9 100          | 2 mois    | 01/08/2019 | 9 100          |              |          | Clôturé  |
| C175         | Gestion durable UFIGA Gabon                                                                       | 29/11/2019 | 234 | PROSYGMA            | 24 750         | 3 mois    | 14/08/2019 | 22 138         | 2 612        |          | Clôturé  |
|              |                                                                                                   |            |     | <b>Total --&gt;</b> | <b>804 218</b> |           |            | <b>781 211</b> | <b>3 339</b> | <b>0</b> |          |

5<sup>ème</sup> semestre (01 janvier 20 au 30 juin 20)

|              |                                                                       |    |    |               |       |        |    |       |   |  |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|-------|--------|----|-------|---|--|---------|
| Hors contrat | Différence prix billet d'avion pour la mission de diagnostic au Gabon | NA | NA | NA            | 829   | 1 mois | NA | 829   | 0 |  | Clôturé |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe                                         | NA | NA | Open 2 Europe | 828   | NA     | NA | 828   | 0 |  | Clôturé |
| Hors contrat | Envois courriers                                                      | NA | NA | NA            | 196   | 6 mois | NA | 196   | 0 |  | Clôturé |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                                           | NA | NA | NA            | 7 019 | NA     | NA | 7 019 | 0 |  | Clôturé |
| Hors contrat | Remboursement frais de déplacement v.a etc réunion ATIBT              | NA | NA | NA            | 325   | 1 mois | NA | 325   | 0 |  | Clôturé |

|              |                                                                                       |            |     |                     |                  |         |            |                  |                |                |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|------------------|---------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| Hors contrat | Production fournitures (poros logo PPECF, stylos, porte documents)                    | NA         | NA  | NA                  | 2 668            | 1 mois  | NA         | 2 668            | 0              |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Frais bancaires                                                                       | NA         | NA  | NA                  | 11 269           | 6 mois  | NA         | 11 269           | 0              |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Dépenses 3 <sup>è</sup> TT et 8 <sup>è</sup> CDO ( billets à rembourser)              | NA         | NA  | NA                  | 4 951            | 1 mois  | NA         | 4 951            | 0              |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Préstations media/graphique/ intervention site webdesign /communication/ digitale/ du | NA         | NA  | sme/LG Design/M     | 8 400            | 12 mois | NA         | 8 400            | 0              |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Appui entreprises forestières face covid-19 (FSC)                                     | 24/03/2020 | 256 | NA                  | 250 000          | 6 mois  | NA         | 250 000          | 0              |                | Clôturé   |
| C173         | Appui coaching vers la certification de l'entreprise SEEF                             | 6/06/2019  | 217 | GFEC                | 192 100          | 30 mois | 14/08/2019 | 154 165          |                |                | En cours  |
| C176         | Appui et maintien activités populations autochtones                                   |            |     | CIB                 | 68 935           | 20 mois | 29/01/2020 | 68 935           |                |                | Clôturé   |
| C177         | Production charbon de bois tropical certifié FSC                                      | 26/02/2020 | 205 | SIDMARINE           | 41 800           | 4 mois  | 06/01/2020 | 41 800           | 0              |                | Clôturé   |
| C178         | Appui coaching SBL                                                                    | 8/10/2018  | 187 | GFEC                | 184 125          | 25 mois | 06/01/2020 | 133 250          |                |                | En cours  |
| C180         | Appui coaching Bonus Harvest                                                          | 9/04/2020  | 246 | BFC                 | 205 131          | 23 mois | 25/05/2020 | 196 601          | 8 530          |                | Clôturé   |
| C182         | Edition CAFF en mandarin                                                              |            |     | Meindert Brouwer    | 15 000           | 6 mois  | 12/02/2020 | 15 000           |                |                | Clôturé   |
| C183         | Appui coaching vers la certification du groupe RIMBUNAN HIJAU                         | 6/08/2020  | 242 | GFEC                | 412 838          | 25 mois | 01/04/2020 | 11 434           | 401 404        |                | Abandonné |
| C184         | Programme marketing de promotion des bois africains certifiés                         | 27/04/2020 | 255 | Stratemark          | 84 000           | 36 mois | 25/04/2020 | 65 049           |                | 18 951         | PPECF III |
| C185         | Projet Guide des arbres d'Afrique centrale                                            | 6/05/2020  | 220 | NATURE+             | 335 060          | 42 mois | 29/05/2020 | 154 227          |                | 180 833        | PPECF III |
| C186         | Projet Guide des arbres d'Afrique centrale                                            | 6/05/2020  | 220 | nbmoux Agro bioit   | 229 236          | 42 mois | 29/05/2020 | 0                |                | 229 236        | PPECF III |
| C187         | Appui coaching MOKABI                                                                 | 6/08/2020  | 242 | BFC                 | 125 800          | 21 mois | 05/06/2020 | 119 250          |                |                | En cours  |
|              |                                                                                       |            |     | <b>Total --&gt;</b> | <b>2 180 510</b> |         |            | <b>1 246 195</b> | <b>409 934</b> | <b>429 020</b> |           |

6<sup>ème</sup> semestre (01 juillet 20 au 31 décembre 20)

|              |                                                                                                 |            |     |                     |                  |         |            |                |          |                |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| Hors contrat | Prestation Graphique LG Design                                                                  | NA         | NA  | LG Design Graphik   | 1 200            | NA      | NA         | 2 400          |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Appui entreprises forestières face covid-19 (légaux et coaching)                                | 29/06/2020 | 261 | NA                  | 250 000          | 6 mois  | NA         | 104 537        |          | 145 463        | Clôturé   |
| Hors contrat | Frais bancaires                                                                                 | NA         | NA  | NA                  | 5 399            | 6 mois  | NA         | 5 399          |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Envois courriers                                                                                | NA         | NA  | NA                  | 305              | 6 mois  | NA         | 305            |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                                                                     | NA         | NA  | NA                  | 2 748            | 6 mois  | NA         | 2 748          |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe                                                                   | NA         | NA  | Open 2 Europe       | 423              | 6 mois  | NA         | 423            |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Maintenance logiciel INFOR PPECF II                                                             | NA         | NA  | GFA                 | 2 413            | 1 mois  | NA         | 2 413          |          |                | Clôturé   |
| C188         | Appui coaching Likouala Timber                                                                  |            |     | FRMi                | 183 000          | 25 mois | 06/08/2020 | 183 000        |          |                | En cours  |
| C189         | Développer de manière durable et responsable la filière à bois africains à travers la promotion |            |     | ATIBT               | 116 000          | 36 mois | 29/09/2020 | 26 000         |          | 90 000         | PPECF III |
| C190         | EIES                                                                                            |            |     | SEEAC               | 70 142           | 12 mois | 28/09/2020 | 54 424         |          |                | En cours  |
| C191         | Réhabilitation 5 forages                                                                        |            |     | IFO                 | 23 761           | 6 mois  | 29/09/2020 | 23 761         |          |                | Clôturé   |
| C192         | Formation abattage e-learning                                                                   |            |     | BFC                 | 172 664          | 12 mois | 19/10/2020 | 69 199         |          | 103 465        | PPECF III |
| C193         | Services écosystémiques des concessions certifiées                                              |            |     | ETICWOOD            | 199 443          | 12 mois | 14/12/2020 | 0              |          | 199 443        | PPECF III |
|              |                                                                                                 |            |     | <b>Total --&gt;</b> | <b>1 027 498</b> |         |            | <b>474 609</b> | <b>0</b> | <b>538 371</b> |           |



## 7ème semestre (01 janvier 21 au 30 juin 21)

|              |                                                         |    |    |                     |               |           |    |               |          |          |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|----|----|---------------------|---------------|-----------|----|---------------|----------|----------|---------|
| Hors contrat | Frais bancaires                                         | NA | NA | NA                  | 3 417         | 6 mois    | NA | 3 417         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                             | NA | NA | NA                  | 6 193         | 6 mois    | NA | 6 193         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | abonnement amder internet matinas, maintenance site WEB | NA | NA | NA                  | 30            | 1 an      | NA | 30            |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Réparation véhicule COMIFAC                             | NA | NA | NA                  | 732           | 1 semaine | NA | 732           |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Prestation Graphique LG Design                          | NA | NA | LG Design Graphik   | 5 600         | NA        | NA | 5 600         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe                           | NA | NA | Open 2 Europe       | 756           | 6 mois    | NA | 756           |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Envois courriers                                        | NA | NA | NA                  | 190           | 6 mois    | NA | 190           |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Dépenses 8è CDO PPECF                                   | NA | NA | NA                  | 3 334         | 1 semaine | NA | 3 334         |          |          | Clôturé |
| C226         | Protocole collaboration formation auditeurs NEPCON      | NA | NA | NA                  | 4 080         | 1mois     | NA | 4 080         |          |          | Clôturé |
|              |                                                         |    |    | <b>Total --&gt;</b> | <b>24 331</b> |           |    | <b>24 331</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |

## 8ème semestre (01 juillet 21 au 31 décembre 21)

|              |                                                                  |            |     |                     |               |         |            |               |              |          |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|---------------|---------|------------|---------------|--------------|----------|---------|
| Hors contrat | Frais bancaires                                                  | NA         | NA  | NA                  | 2 778         | 6 mois  | NA         | 2 778         |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe                                    | NA         | NA  | Open 2 Europe       | 774           | 6 mois  | NA         | 774           |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                                      | NA         | NA  | NA                  | 8 789         | 6 mois  | NA         | 8 789         |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Envois courriers                                                 | NA         | NA  | NA                  | 38            | 6 mois  | NA         | 38            |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Dépenses Réunion SOLDEO et COP 20 (onjets, perdiem...)           | NA         | NA  | NA                  | 30 631        | 1 mois  | NA         | 30 631        |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Impression 2000 guides                                           | NA         | NA  | NATURE+             | 4 909         | NA      | NA         | 4 909         |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Appui financier pour réparations véhicules COMIFAC               | NA         | NA  | NA                  | 10 671        | NA      | NA         | 10 671        |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Appui entreprises forestières face covid-19 (légaux et coaching) | 29/06/2020 | 261 | NA                  | 8 161         | NA      | NA         | 8 161         |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Participation film des Forêts et des Hommes                      | NA         | NA  | Clair-Obscur        | 2 000         | 1 mois  | 1mois      | 2 000         |              |          | Clôturé |
| Hors contrat | Production fournitures logo PPECF                                | NA         | NA  | NA                  | 2 852         | 1 mois  | 1mois      | 2 852         |              |          | Clôturé |
| C182(2)      | Edition CAFF en français                                         |            |     | Meindert Brouwer    | 12 000        | 10 mois | 21/06/2021 | 9 002         | 2 998        |          | Clôturé |
|              |                                                                  |            |     | <b>Total --&gt;</b> | <b>83 604</b> |         |            | <b>80 606</b> | <b>2 998</b> | <b>0</b> |         |

## 9ème semestre (01 janvier 22 au 30 juin 22)

|              |                                                         |    |    |                   |        |         |    |        |  |  |         |
|--------------|---------------------------------------------------------|----|----|-------------------|--------|---------|----|--------|--|--|---------|
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                             | NA | NA | NA                | 21 822 | 6 mois  | NA | 21 822 |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | Frais bancaires                                         | NA | NA | NA                | 2 095  | 6 mois  | NA | 2 095  |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | Dépenses Réunion SOLIDEO et COP26 de l'ATIBT            | NA | NA | NA                | 5 362  | 1 mois  | NA | 5 362  |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | Prestation Graphique LG Design                          | NA | NA | LG Design Graphik | 2 400  | 6 mois  | NA | 2 400  |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | Maintenance logiciel INFOR PPECF II                     | NA | NA | GFA               | 3 863  | 1 mois  | NA | 3 863  |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe                           | NA | NA | Open 2 Europe     | 6 408  | 6 mois  | NA | 6 408  |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | abonnement amder internet matinas, maintenance site WEB | NA | NA | Matthias          | 15     | 12 mois | NA | 15     |  |  | Clôturé |
| Hors contrat | Envois courriers                                        | NA | NA | NA                | 175    | 6 mois  | NA | 175    |  |  | Clôturé |

|              |                                       |            |     |            |                |         |            |                |          |                |           |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----|------------|----------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|
| Hors contrat | Manutention livres CAFF               | NA         | NA  | NA         | 9              | NA      | NA         | 9              |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Retrait C236 FSC à la poste           | NA         | NA  | NA         | 14             | NA      | NA         | 14             |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Comité réélection guide certification | NA         | NA  | NA         | 5 639          | NA      | NA         | 5 639          |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | Dépenses 9 <sup>e</sup> CDO PPECF     | NA         | NA  | NA         | 3 155          | 1 mois  | NA         | 3 155          |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | STRATEMARK                            | NA         | NA  | STRATEMARK | 345            | 36 mois | NA         | 345            |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | ATIBT Nantes                          | NA         | NA  | STRATEMARK | 4 900          | 1 mois  | NA         | 4 900          |          |                | Clôturé   |
| Hors contrat | la COMIFAC                            |            | NA  |            | 23 371         | 6 mois  | NA         | 23 371         |          |                | Clôturé   |
| C240         | Appui doctorat FELIDYN                |            |     | UL         | 69 300         | 46 mois | 15/05/2022 | 62 370         |          |                | En cours  |
| C241         | office Follow AP                      |            |     | BFC        | 16 200         | 18 mois | 16/05/2022 | 16 200         |          |                | En cours  |
| C243         | Projet "Biochar"                      | 27/04/2022 | 304 | ETICWOOD   | 39 678         | 12 mois | 01/06/2022 | 39 678         |          | 107 541        | PPECF III |
|              |                                       |            |     |            | <b>204 752</b> |         |            | <b>197 822</b> | <b>0</b> | <b>107 541</b> |           |

10<sup>ème</sup> semestre (01 juillet 22 au 31 décembre 22)

|              |                                       |    |    |                   |               |        |    |               |          |          |         |
|--------------|---------------------------------------|----|----|-------------------|---------------|--------|----|---------------|----------|----------|---------|
| Hors contrat | Frais bancaires                       | NA | NA | NA                | 3 132         | 6 mois | NA | 3 132         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | à Nantes                              | NA | NA | Open 2 Europe     | 5 660         | 1mois  | NA | 5 660         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe         | NA | NA | Open 2 Europe     | 2 007         | 6 mois | NA | 2 007         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Prestation Graphique LG Design        | NA | NA | LG Design Graphik | 2 400         | 6 mois | NA | 2 400         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Envois courriers                      | NA | NA | NA                | 76            | 6 mois | NA | 76            |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Abonnement Zoom annuel PPECF          | NA | NA | NA                | 168           | 6 mois | NA | 168           |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Comité réélection guide certification | NA | NA | NA                | 7 065         | NA     | NA | 7 065         |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Dédouanement livres CAFF              | NA | NA | NA                | 864           | NA     | NA | 864           |          |          | Clôturé |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP           | NA | NA | NA                | 5 538         | 6 mois | NA | 5 538         |          |          | Clôturé |
|              |                                       |    |    |                   | <b>26 910</b> |        |    | <b>26 910</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |         |

11<sup>ème</sup> semestre (01 janvier au 30 juin 23)

|              |                                                        |    |    |               |               |           |    |               |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-----------|----|---------------|----------|----------|----------|
| Hors contrat | Frais bancaires                                        | NA | NA | NA            | 1 608         | 6 mois    | NA | 1 608         |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe                          | NA | NA | Open 2 Europe | 5 828         | 6 mois    | NA | 5 828         |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Production brochures PPECF                             | NA | NA | NA            | 838           | 6 mois    | NA | 838           |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Comité réélection guide certification                  | NA | NA | NA            | 2 200         | NA        | NA | 2 200         |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Plaquettes COMIFAC/PPECF                               | NA | NA | LG Design     | 1 713         | NA        | NA | 1 713         |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP                            | NA | NA | NA            | 9 271         | 6 mois    | NA | 9 271         |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Maintenance logiciel INFOR PPECF II                    | NA | NA | GFA           | 1 117         | 1 mois    | NA | 1 117         |          |          | En cours |
| Hors contrat | Dépenses 10 <sup>e</sup> CDO PPECF                     | NA | NA | NA            | 4 635         | 1 mois    | NA | 4 635         |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | Envois courriers                                       | NA | NA | NA            | 38            | 6 mois    | NA | 38            |          |          | Clôturé  |
| Hors contrat | production brochures PPECF pour le 10 <sup>e</sup> CDO | NA | NA | NA            | 1 372         | 1 semaine | NA | 1 372         |          |          | Clôturé  |
|              |                                                        |    |    |               | <b>28 621</b> |           |    | <b>28 621</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |

12<sup>ème</sup> semestre (01 juillet au 31 décembre 23)

|              |                                 |    |    |                   |               |           |    |               |  |  |          |
|--------------|---------------------------------|----|----|-------------------|---------------|-----------|----|---------------|--|--|----------|
| Hors contrat | Appui réunion CNC de la COMIFAC | NA | NA | NA                | 7 397         | 1 semaine | NA | 7 397         |  |  | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais bancaires                 | NA | NA | NA                | 171           | 6 mois    | NA | 171           |  |  | En cours |
| Hors contrat | Frais technique Open 2 Europe   | NA | NA | Open 2 Europe     | 612           | 6 mois    | NA | 612           |  |  | En cours |
| Hors contrat | Frais de missions de la CGP     | NA | NA | NA                | 2 023         | 6 mois    | NA | 2 023         |  |  | En cours |
| Hors contrat | Abonnement Zoom annuel PPECF    | NA | NA | NA                | 168           | 6 mois    | NA | 168           |  |  | Clôturé  |
| Hors contrat | Prestation Graphique LG Design  | NA | NA | LG Design Graphik | 2 400         | 6 mois    | NA | 2 400         |  |  | En cours |
|              |                                 |    |    |                   |               |           |    |               |  |  |          |
|              |                                 |    |    |                   | <b>12 770</b> |           |    | <b>12 770</b> |  |  |          |

TOTAL --&gt; 10 001 897

7 475 379 1 184 812 1 074 932

## Engagements PPECF III au 30 septembre 2023

| 1er semestre (01 janvier 21 au 30 juin 21) |                                                                                                                                                   |            |     |                        |         |         |            |         |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------|---------|---------|------------|---------|----------|
| Hors contrat                               | Frais bancaires                                                                                                                                   | NA         | NA  | NA                     | 3 317   | 6 mois  | NA         | 3 317   | Clôturé  |
| C184                                       | Programme marketing de promotion des bois                                                                                                         | 27/04/2020 | 255 | Stratemark             | 189 000 | 36 mois | 25/04/2020 | 189 000 | Clôturé  |
| C185                                       | Projet Guide des arbres d'Afrique centrale                                                                                                        | 6/05/2020  | 220 | NATURE+                | 180 833 | 42 mois | 29/05/2020 | 153 012 | En cours |
| C186                                       | Projet Guide des arbres d'Afrique centrale                                                                                                        | 6/05/2020  | 220 | Gembmoux Agro bioitech | 229 236 | 42 mois | 29/05/2020 | 131 193 | En cours |
| C189                                       | Développer de manière durable et responsable la filière « bois africains » à travers la promotion et la valorisation commerciales de ses produits |            |     | ATIBT                  | 322 000 | 36 mois | 29/09/2020 | 288 241 | En cours |
| C192                                       | Formation abattage e-learning                                                                                                                     |            |     | BFC                    | 115 565 | 12 mois | 19/10/2020 | 115 565 | Clôturé  |
| C193                                       | Services écosystémiques des concessions certifiées SECODEV                                                                                        |            |     | ETICWOOD               | 199 443 | 12 mois | 14/12/2020 | 199 443 | Clôturé  |
| C194                                       | Prolongation points focaux PPECF de nov 20 à déc 22                                                                                               |            |     | ATIBT                  | 31 332  | 25 mois | 01/11/2020 | 10 716  | En cours |
| C195                                       | Prolongation points focaux PPECF de nov 20 à déc 22                                                                                               |            |     | UFIGA                  | 222 180 | 25 mois | 01/11/2020 | 221 876 | En cours |
| C196                                       | Prolongation points focaux PPECF de nov 20 à déc 22                                                                                               |            |     | FIB                    | 33 332  | 25 mois | 01/11/2020 | 10 716  | En cours |
| C198                                       | Projet Thémis                                                                                                                                     | 9/12/2020  | 241 | ATIBT                  | 17 000  | 20 mois | 22/01/2021 | 17 000  | Clôturé  |
| C199                                       | Projet Thémis                                                                                                                                     | 9/12/2020  | 241 | Stichting Probos       | 75 310  | 20 mois | 22/01/2021 | 75 310  | Clôturé  |

|      |                                                    |            |     |                    |                  |         |            |                  |          |
|------|----------------------------------------------------|------------|-----|--------------------|------------------|---------|------------|------------------|----------|
| C221 | Guide certification forestière en Afrique Centrale |            |     | TEREA-BFC          | 268 094          | 18 mois | 01/02/2021 | 268 094          | Clôturé  |
| C222 | Etude et test complémentaires promotion du         | 15/01/2021 | 263 | CBG                | 112 790          | 16 mois | 02/02/2021 | 101 400          | En cours |
| C223 | Analyse cycle de vie produits en bois              |            |     | ESTEANA            | 140 900          | 18 mois | 29/03/2021 | 126 000          | En cours |
|      |                                                    |            |     | <b>Total--&gt;</b> | <b>2 140 332</b> |         |            | <b>1 910 882</b> |          |

## 2ème semestre (01 juillet 21 au 31 décembre 21)

|              |                                                               |            |     |                    |                  |         |            |                |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------|------------------|---------|------------|----------------|----------|
| Hors contrat | Frais logistique (août-oct 21) du C184 marketing bd           | NA         | NA  | STRATEMARK         | 423              | 36 mois | NA         | 423            | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais bancaires                                               | NA         | NA  | NA                 | 4 475            | 6 mois  | NA         | 4 475          | Clôturé  |
| C200         | Projet Thémis                                                 |            |     | LCB                | 12 750           | 20 mois | 16/09/2021 | 10 500         | En cours |
| C224         | Statut vulnérabilité espèces                                  | 12/01/2021 | 263 | NATURE +           | 116 130          | 12 mois | 27/10/2021 | 96 760         | En cours |
| C225         | Appui certification GWI/BSG                                   | 9/09/2021  | 288 | TEREA (Gabon)      | 151 150          | 26 mois | 08/10/2021 | 72 370         | En cours |
| C227         | Appui coaching PAFC de BSO                                    |            | 282 | TEREA (Gabon)      | 317 182          | 26 mois | 20/09/2021 | 247 554        | En cours |
| C228         | Technologie RFID-codes barres                                 | 16/07/2021 | 283 | PROSYGMA           | 50 000           | 6 mois  | 01/10/2021 | 30 000         | En cours |
| C231         | Assistance numériques de contrôle                             |            |     | BFC                | 204 425          | 12 mois | 05/11/2021 | 204 425        | Clôturé  |
| C232         | Appui au projet FSC-Focus Forest                              |            |     | ATIBT              | 156 713          | 14 mois | 23/11/2021 | 47 014         | En cours |
| C233         | Oils &spices for sustainable landscapes                       |            |     | ETICWOOD           | 70 157           | 6 mois  | 20/11/2021 | 70 157         | Clôturé  |
| C234         | Formation à l'intelligence économique et fiscalité forestière |            |     | CIRAD              | 9 703            | 1 mois  | 05/12/2021 | 9 703          | Clôturé  |
|              |                                                               |            |     | <b>Total--&gt;</b> | <b>1 093 108</b> |         |            | <b>793 381</b> |          |

## 3ème semestre (01 janvier 22 au 30 juin 22)

|              |                                               |            |     |            |                |         |            |                |          |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|-----|------------|----------------|---------|------------|----------------|----------|
| Hors contrat | Frais bancaires                               | NA         | NA  | NA         | 4 055          | 6 mois  | NA         | 4 055          | Clôturé  |
| Hors contrat | Frais programme marketing C184                | NA         | NA  | STRATEMARK | 792            | 7 mois  | NA         | 792            | Clôturé  |
| C230         | Actualisation vulnérabilité espaces ligneuses |            |     | UL         | 42 525         | 12 mois | 16/12/2021 | 42 525         | Clôturé  |
| C235         | Gestion carboe et GES en exploitation         |            |     | TEREA      | 84 600         | 6 mois  | 13/04/2022 | 84 600         | Clôturé  |
| C236         | Services écosystemiques                       |            |     | FSC I&p    | 142 267        | 22 mois | 20/04/2022 | 59 752         | En cours |
| C237         | Organisation forum ATIBT à Nantes             | 20/04/2022 | 309 | ATIBT      | 35 519         | 2 mois  | 29/04/2022 | 35 519         | Clôturé  |
| C238         | Réalisations films et photos F&P              | 12/01/2022 | 302 | IMAGEO     | 89 140         | 5 mois  | 21/02/2022 | 89 140         | Clôturé  |
| C239         | Appui coaching entreprise KHLL                |            |     | GFEC       | 194 325        | 20 mois | 30/03/2022 | 190 915        | En cours |
| C242         | Réalisation stands CIB Forum ATIB Nantes      | 20/04/2022 | 304 | PUBVOLUME  | 62 981         | 2 mois  | 06/06/2022 | 62 981         | Clôturé  |
|              |                                               |            |     |            | <b>656 204</b> |         |            | <b>570 278</b> |          |

| 4ème semestre (01 juillet 22 au 31 décembre 22) |                                                    |            |     |                      |                  |           |            |                |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|------------------|-----------|------------|----------------|----------|
| C244                                            | Appui coaching ASI                                 |            |     | GFEC                 | 135 825          | 18 mois   | 07/11/2022 | 91 948         | En cours |
| C246                                            | Brigade faunes mixte                               |            |     | Conservation justice | 122 400          | 24 mois   | 15/09/2022 | 40 000         | En cours |
| C247                                            | Brigade faunes mixte                               |            | 306 | SOMIVAB              | 31 500           | 24 mois   | 15/10/2022 | 28 350         | En cours |
| C248                                            | Animation de la CCB de l'ATIBT                     |            |     | TEREA                | 16 000           | 7 mois    | 01/10/2022 | 16 000         | Clôturé  |
| C250                                            | Inventaire faune et HVC de Ngombé                  |            |     | IFO                  | 110 400          | 12 mois   | 15/11/2022 | 88 000         | En cours |
| C251                                            | Inventaire faune et HVC de Ngombé                  |            |     | NATURE+              | 68 900           | 12 mois   | 21/11/2022 | 55 120         | En cours |
| C252                                            | Subvention UFIGA nouveau code forestier            |            |     | UFIGA                | 13 476           | 8 mois    | 25/11/2021 | 13 476         | Clôturé  |
| C253                                            | Appui coaching gestion durable BH                  |            |     | BFC                  | 294 375          | 24 mois   | 04/11/2022 | 215 007        | En cours |
| Hors contrat                                    | Frais bancaires                                    | NA         | NA  | NA                   | 3 040            | 6 mois    | NA         | 3 040          | Clôturé  |
|                                                 |                                                    |            |     |                      | <b>795 916</b>   |           |            | <b>550 941</b> |          |
| 5ème semestre (01 janvier au 30 juin 23)        |                                                    |            |     |                      |                  |           |            |                |          |
| C243                                            | Projet "Biochar"                                   | 27/04/2022 | 304 | ETICWOOD             | 107 541          | 12 mois   | 01/06/2022 | 50 608         | En cours |
| C245                                            | Soutien SF application nouvelle loi Code Forestier |            | 270 | UNICONGO             | 31 606           | 6 mois    | 1/05/2023  | 31 606         | Clôturé  |
| C254                                            | Coaching SBL vers PAFC                             |            |     | GFEC                 | 262 500          | 30 mois   | 13/02/2023 | 51 877         | En cours |
| C255                                            | Arbres monumentaux et ressources genetiques        |            |     | NATURE+              | 159 801          | 18 mois   | 06/03/2023 | 135 831        | En cours |
| C257                                            | Infographie métiers de la certification            |            |     | BFC                  | 147 875          | 15 mois   | 22/03/2023 | 80 331         | En cours |
| C258                                            | Prolongation point focal PPECF au Gabon            |            |     | UFIGA                | 108 700          | 12 mois   | 01/11/2022 | 94 250         | En cours |
| C259                                            | Rédaction guide pratique CCTP                      |            |     | ATIBT                | 41 465           | 12 mois   | 23/03/2023 | 20 000         | En cours |
| C260                                            | Projet Thémis phase II                             |            |     | Probos               | 67 660           | 18 mois   | 13/04/2023 | 38 146         | En cours |
| C261                                            | Service d'accompagnement GES standard PAFC         |            | 354 | TEREA                | 20 000           | 17 mois   | 17/04/2023 | 5 000          | En cours |
| C262                                            | Traduction en anglais et en mandarin le Guide      |            | 257 | BFC                  | 155 818          | 15 mois   | 15/04/2023 | 80 471         | En cours |
| Hors contrat                                    | Réunion ATIBT/PPECF pour la phase IV               | NA         | NA  | NA                   | 2 516            | 1 journée | NA         | 2 516          | Clôturé  |
| Hors contrat                                    | Frais bancaires                                    | NA         | NA  | NA                   | 5 275            | 6 mois    | NA         | 5 275          | En cours |
| Hors contrat                                    | Frais programme marketing C184                     | NA         | NA  | STRATEMARK           | 5 445            | 6 mois    | NA         | 5 445          | Clôturé  |
|                                                 |                                                    |            |     |                      | <b>1 116 202</b> |           |            | <b>601 355</b> |          |

| 6ème semestre (01 juillet au 31 décembre 23) |                                                                         |            |     |            |                  |         |            |                |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------------|---------|------------|----------------|----------|
| C263                                         | Appui coaching PAFC/FSC d'AEH                                           |            | 345 | TEREA      | 423 900          | 18 mois | 23/05/2023 | 64 334         | En cours |
| C264                                         | Appui coaching PAFC de GWI/BSG                                          |            | 353 | TEREA      | 557 425          | 18 mois | 03/05/2023 | 61 446         | En cours |
| C265                                         | Appui coaching OLB de STC                                               |            | 368 | TEREA      | 234 100          | 20 MOIS |            | 0              | En cours |
| C266                                         | Installation logiciel ASSALA                                            |            | 278 | BFC        | 180 000          | 17 mois | 10/08/2023 | 27 000         | En cours |
| C267                                         | Programme marketing de promotion des bois                               | 27/04/2020 | 352 | Stratemark | 56 000           | 8 mois  | 10/08/2023 | 28 000         | En cours |
| C268                                         | Programme marketing de promotion des bois                               | 27/04/2020 | 352 | ATIBT      | 99 000           | 8 mois  |            | 0              | En cours |
| C269                                         | Appui coaching PAFC de SEEF                                             |            | 303 | TEREA      | 198 825          | 12 mois |            | 0              | En cours |
| C270                                         | Appui sociétés forestières pour l'application du nouveau Code Forestier |            |     | UNICONGO   | 40 000           | 5 mois  | 13/09/2023 | 36 000         | En cours |
| Hors contrat                                 | Frais bancaires                                                         | NA         | NA  | NA         | 1 279            | 6 mois  | NA         | 1 279          | En cours |
|                                              |                                                                         |            |     |            |                  |         |            |                |          |
|                                              |                                                                         |            |     |            | <b>1 790 529</b> |         |            | <b>218 060</b> |          |

TOTAL --&gt;

7 592 291

4 644 898



## Les taux d'absorption des PPECF II et III

En raison de la prolongation du PPECF jusqu'en juin 2025, les ratios taux d'absorption et « temps écoulés » sont repassés au vert.

Mais, il ne faut pas s'y tromper, cette situation à fin septembre 2023, se dégradera si :

- Les délais de traitement des DNOs par la KfW ne s'améliorent pas ;
- La BEAC continue à retarder les ordres de paiements du PPECF, en devises, par des exigences administratives très difficiles à satisfaire.

### Récapitulatif PPECF II

|                                      |                      |                  |                  | Ratios       |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                      | Budget BMZ 201568203 |                  | 8 045 469        |              |
|                                      | Budget BMZ 200866707 |                  | 303 964          |              |
|                                      | Total --->           |                  | <b>8 349 433</b> |              |
| Liquidé                              | 7 475 379            |                  |                  | 89,5%        |
| Engagé non liquidé                   | 266 774              |                  |                  | 3,2%         |
| Taux d'absorption (engagé + liquidé) | 7 742 153            |                  |                  | <b>92,7%</b> |
|                                      |                      | Total jours ---> | 1 440            |              |
| Temps écoulé (jours)                 | 15/09/2017           | 1440             |                  | 100,0%       |
|                                      | 15/09/2021           |                  |                  |              |

### Récapitulatif PPECF III

|            |                        |           |  | Ratios       |
|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
|            | Budget total ->        | 8 926 462 |  |              |
| 4 644 898  | <-- engagé liquidé     |           |  | 52,0%        |
| 2 947 393  | <-- engagé non liquidé |           |  | 33,0%        |
| 7 592 291  | Taux d'absorption -->  |           |  | <b>85,1%</b> |
|            | Total jours --->       | 805       |  |              |
| 15/09/2021 | 745                    |           |  | 58,2%        |
| 30/09/2023 |                        |           |  |              |

## Suivi des délais contractuels du PPECF II &amp; III

|                                                       |                                   |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              | Délais dépassé de plus de 6 mois                    |                    |                       |                   |                              |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                   |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              | Date non échue ou délais dépassé de moins de 6 mois |                    |                       |                   |                              |                                                                  |
|                                                       |                                   |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              | Certificat obtenu                                   |                    |                       |                   |                              |                                                                  |
| Contrats de coaching PPECF II & III (au 31 août 2023) |                                   |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              |                                                     |                    |                       |                   |                              |                                                                  |
| N° Contrat                                            | Item                              | Certificat "Légalité" visé | Coach | Contribut. PPECF | Montant liquidé PPECF € | Date sign. du contrat | Durée Contrat (mois) | Date fin de contrat | Extension due au COVID19 (mois) | Avenant durée (mois) | Date révisée de fin de contrat | Dépassement de délais (mois) | Temps restant (mois)                                | %tage Temps écoulé | %tage montant Liquidé | Statut            | Date obtention du certificat | Observations                                                     |
| PPECF II                                              |                                   |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              |                                                     |                    |                       |                   |                              |                                                                  |
| C137                                                  | Appui coaching SOMIVAB            | TLV                        | TEREA | 96 855           | 24 086                  | 5/12/18               | 20                   | 27/07/20            | 4                               |                      | 24/11/20                       |                              |                                                     |                    | 25%                   | Certificat obtenu | 13/02/19                     |                                                                  |
| C139                                                  | Appui coaching TTIB               | OLB                        | TEREA | 146 573          | 30 822                  | 5/12/18               | 30                   | 23/05/21            | 4                               |                      | 20/09/21                       | 25                           |                                                     | 173%               | 21%                   | En cours          | En cours                     | consultation des parties prenantes lancée le 27 juin 2023 par BV |
| C149                                                  | Appui coaching ASI                | OLB                        | BFC   | 222 810          | 89 900                  | 15/01/19              | 30                   | 3/07/21             | 4                               |                      | 31/10/21                       |                              |                                                     |                    | 40%                   | Suspendu          | Suspendu                     | PA révisé & nouveau coach                                        |
| C152                                                  | Appui coaching BSO                | OLB                        | TEREA | 208 300          | 128 156                 | 14/03/19              | 30                   | 30/08/21            | 4                               | 16                   | 22/04/23                       |                              |                                                     |                    | 62%                   | Certificat obtenu | 23/03/21                     | A clôturer<br>Poursuite vers PAFC                                |
| C155                                                  | Appui coaching SEFCA              | OLB                        | FRMi  | 241 961          | 234 516                 | 11/03/19              | 25                   | 30/03/21            | 4                               | 6                    | 24/01/22                       | 21                           |                                                     | 159%               | 97%                   | En cours          | En cours                     |                                                                  |
| C173                                                  | SEEF                              | OLB                        | GFEC  | 192 100          | 154 165                 | 14/08/19              | 30                   | 30/01/22            | 4                               |                      | 30/05/22                       |                              |                                                     |                    | 80%                   | Certificat obtenu | 5/09/22                      | A clôturer                                                       |
| C178                                                  | Appui coaching SBL                | OLB                        | GFEC  | 184 125          | 133 250                 | 6/01/20               | 25                   | 25/01/22            | 4                               |                      | 25/05/22                       |                              |                                                     |                    | 72%                   | Certificat obtenu | 21/03/22                     | A clôturer<br>Poursuite vers PAFC                                |
| C180                                                  | Appui coaching Bonus Harvest      | LS                         | BFC   | 205 131          | 196 601                 | 25/04/20              | 20                   | 16/12/21            | 4                               | 4                    | 13/08/22                       |                              |                                                     |                    | 96%                   | Certificat obtenu | 20/07/22                     | A clôturer<br>Poursuite vers FSC/PAFC                            |
| C183                                                  | Appui coaching du Groupe RIMBUNAN | OLB                        | GFEC  | 412 838          | 11 434                  | 27/03/20              | 25                   | 16/04/22            | 4                               |                      | 14/08/22                       | 14                           |                                                     |                    | 3%                    | En suspend        | En suspend                   |                                                                  |
| C187                                                  | Appui coaching Rougier MOKABI     | LS                         | BFC   | 125 800          | 119 250                 | 29/09/20              | 10                   | 26/07/21            | 0                               | 4                    | 23/11/21                       | 23                           |                                                     |                    | 95%                   | Certificat obtenu | 6/12/21                      | A clôturer                                                       |
| C188                                                  | Appui coaching Likouala Timber    | OLB                        | FRM   | 183 000          | 183 000                 | 6/08/20               | 25                   | 26/08/22            | 4                               |                      | 24/12/22                       | -                            | 9                                                   |                    | 100%                  | Certificat obtenu | 16/09/22                     | A clôturer                                                       |
| PPECF III                                             |                                   |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              |                                                     |                    |                       |                   |                              |                                                                  |
| C225                                                  | Appui certification GWI/BSG       | LS                         | TEREA | 402 462          | 72 370                  | 8/10/21               | 26                   | 27/11/23            |                                 |                      | 27/11/23                       |                              | 2                                                   |                    | 18%                   | Certificat obtenu | 21/06/22                     | A clôturer<br>Poursuite vers PAFC                                |
| C227                                                  | Appui coaching vers PAFC de BSO   | PAFC                       | TEREA | 317 182          | 247 554                 | 7/07/21               | 14                   | 31/08/22            |                                 |                      | 31/08/22                       |                              |                                                     |                    | 78%                   | Certificat obtenu | 9/03/22                      | Suite du contrat C152<br>A clôturer                              |

| N° Contrat                   | Item                         | Certificat "Légalité" visé | Coach | Contribut. PPECF | Montant liquidé PPECF € | Date sign. du contrat | Durée Contrat (mois) | Date fin de contrat | Extension due au COVID19 (mois) | Avenant durée (mois) | Date révisée de fin de contrat | Dépassement de délais (mois) | Temps restant (mois)  | %tage Temps écoulé | %tage montant Liquidé | Statut   | Date obtention du certificat | Observations            |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-------------------------|
| <b>C239</b>                  | Appui coaching de KHLL       | OLB                        | GFEC  | 194 325          | 160 959                 | 30/03/22              | 20                   | 20/11/23            |                                 |                      | 20/11/23                       |                              | 2                     | 92%                | 83%                   | En cours | En cours                     |                         |
| <b>C244</b>                  | Appui coaching de ASI        | OLB/LS                     | GFEC  | 135 825          | 74 417                  | 7/11/22               | 18                   | 30/04/24            |                                 |                      | 30/04/24                       |                              | 7                     | 61%                | 55%                   | En cours | En cours                     | Reprise C149            |
| <b>C253</b>                  | Appui coaching de BH         | GD                         | BFC   | 294 375          | 215 007                 | 21/11/22              | 24                   | 10/11/24            |                                 |                      | 10/11/24                       |                              | 14                    | 44%                | 73%                   | En cours | En cours                     | Suite du contrat C180   |
| <b>C254</b>                  | Appui coaching de SBL        | PAFC                       | GFEC  | 262 500          | 51 877                  | 13/02/23              | 30                   | 1/08/25             |                                 |                      | 1/08/25                        |                              | 22                    | 26%                | 20%                   | En cours | En cours                     | Suite du contrat C178   |
| <b>C263</b>                  | Appui coaching AEH           | PAFC                       | TEREA | 423 900          | 64 334                  | 23/05/23              | 31                   | 8/12/25             |                                 |                      | 8/12/25                        |                              |                       | 14%                | 15%                   | En cours | En cours                     |                         |
| <b>C264</b>                  | Appui coaching de GWI/BSG    | PAFC                       | TEREA | 557 425          | 48 546                  | 3/05/23               | 32                   | 18/12/25            |                                 |                      | 18/12/25                       |                              |                       | 16%                | 9%                    | En cours | En cours                     | Suite du contrat C225   |
| <b>C265</b>                  | Appui coaching de STC        | OLB                        | TEREA | 234 100          | -                       | 15/02/23              | 32                   | 2/10/25             |                                 |                      | 2/10/25                        |                              |                       | 24%                | -                     | En cours | En cours                     | Reprise du contrat C149 |
| <b>C269</b>                  | Appui coaching de SEEF James | FSC/PAFC                   | TEREA | 198 825          | -                       | En signature          | 33                   | En attente          |                                 |                      | en attente                     |                              |                       |                    | -                     | En cours | En cours                     |                         |
| <b>Total coaching --&gt;</b> |                              |                            |       | <b>5 240 412</b> | <b>2 240 244</b>        |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              |                       |                    |                       |          |                              |                         |
|                              |                              |                            |       |                  |                         |                       |                      |                     |                                 |                      |                                |                              | <b>Moyenne PPECF→</b> | <b>67%</b>         | <b>50%</b>            |          |                              |                         |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Délais dépassé de plus de 6 mois                    |
|  | Date non échue ou délais dépassé de moins de 6 mois |
|  | Contrat clôturé                                     |

## Contrats hors coaching PPECF II (en cours au 31 août 2023)

| N° de contrat | Libellé                                                                                                                                                               | N° DNO | Date de contrat | Montant contrat (€) | Montant liquidé | Durée (Mois) | Date de fin de contrat | Extension due au COVID19 (mois) | Avenant sur la durée (mois) | Date révisée fin de contrat | Dépassement de délais (mois) | Temps restant (mois) | %tage de temps écoulé | %tage exécution technique | %tage budget liquidé | Statut   | Observation CgP                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C006          | Maintenance site web PPECF                                                                                                                                            |        |                 | 8 100               |                 | 24           |                        |                                 |                             | NA                          |                              |                      |                       | NA                        |                      | En cours | activité permanente                                                                                                  |
| C123          | Appui à la lutte contre l'exploitation forestière illégale au Gabon                                                                                                   | 167    | 14/12/2017      | 150 000             | 150 000         | 40           | 28/03/2021             | 4                               | 9                           | 22/04/22                    |                              |                      | 144%                  | NA                        | 100%                 | Clôturé  | Rapport final transmis en Mai 2023                                                                                   |
| C128          | Développement certification PAFC en Afrique Centrale                                                                                                                  | 180    | 22/01/2019      | 378 250             | 273 212         | 42           | 05/07/2022             | 4                               |                             | 2/11/22                     | 11                           |                      | 127%                  | 90%                       | 72%                  | En cours | Normes et annexes disponibles                                                                                        |
| C130          | Développer de manière durable et responsable la filière « bois africains » à travers la promotion et la valorisation                                                  | 179    | 07/08/2018      | 177 000             | 141 156         | 38           | 20/09/2021             | 4                               |                             | 18/01/22                    | 21                           |                      | 155%                  |                           | 80%                  | En cours | Rapport ATIBT sur le marketing 2021 disponible                                                                       |
| C131          | Développer de manière durable et responsable la filière « bois africains » à travers la promotion et la valorisation commerciales de ses produits légaux et certifiés | 179    | 07/08/2018      | 95 700              | 88 700          | 24           | 27/07/2020             | 4                               |                             | 24/11/20                    | 35                           |                      | 245%                  |                           | 93%                  | En cours | Rapport ATIBT sur le marketing 2021 disponible                                                                       |
| C143          | Lutte contre la criminalité faunique                                                                                                                                  | 197    | 13/11/2018      | 192 600             | 142 600         | 50           | 22/12/2022             | 4                               |                             | 21/04/23                    | 5                            |                      | 111%                  | 80%                       | 74%                  | En cours | Rapport Intermédiaire Fév 2023 disponible                                                                            |
| C147          | Idendification EHPVal                                                                                                                                                 | 200    | 07/02/2019      | 199 375             | 179 375         | 48           | 17/01/2023             | 4                               |                             | 17/05/23                    | 5                            |                      | 110%                  | 72%                       | 90%                  | En cours | Rapport Intermédiaire Juil 21 disponible                                                                             |
| C153          | Test mécaniques et de durabilités                                                                                                                                     | 193    | 31/05/2019      | 50 300              | 37 075          | 30           | 16/11/2021             | 4                               |                             | 16/03/22                    | 19                           |                      | 163%                  |                           | 74%                  | En cours | Rapport mars 21 disponible                                                                                           |
| C154          | Protocole de collaboration Bureau Veritas                                                                                                                             | NA     | 01/10/2019      | 40 000              | 28 796          | 48           | 10/09/2023             |                                 | 3                           | 9/12/23                     | NA                           | NA                   |                       | NA                        | 72%                  | En cours | activité permanente                                                                                                  |
| C158          | Appui au PROGEPP et USLAB de la société IFO                                                                                                                           | 218    | 03/05/2019      | 60 000              | 48 000          | 8            | 29/12/2019             | 4                               |                             | 27/04/20                    | 42                           |                      |                       | 100%                      | 80%                  | En cours | Clôture administrative attendue                                                                                      |
| C162          | Optimisation Elefor                                                                                                                                                   | 215    | 21/06/2019      | 100 826             | 90 000          | 48           | 31/05/2023             | 4                               |                             | 28/09/23                    |                              | 0                    | 100%                  | 63%                       | 89%                  | En cours | Rapport Intermédiaire Juin 22 disponible                                                                             |
| C168          | Refonte site internet programme marketing F&P                                                                                                                         | 179    | 31/07/2019      | 48 450              | 48 450          | 12           | 25/07/2020             | 4                               | 31                          | 10/06/23                    | NA                           |                      | 132%                  |                           | 100%                 | En cours |                                                                                                                      |
| C170          | Relation presse média programme F&P                                                                                                                                   | 179    | 01/04/2019      | 204 000             | 192 000         | 9            | 27/12/2019             | 4                               |                             | NA                          |                              |                      |                       | NA                        | 94%                  | En cours |                                                                                                                      |
| C190          | Plans d'action d'internalisation des Directives EIES                                                                                                                  | 243    | 28/09/2020      | 70 142              | 54 424          | 12           | 23/09/2021             | 4                               |                             | 21/01/22                    | 21                           |                      | 272%                  | 40%                       | 78%                  | En cours | Rapport de l'atelier au Congo disponible, en attente des rapports d'ateliers au Cameroun, en RCA, au Gabon et en RDC |
| C240          | Appui Doctorat FELIDYN                                                                                                                                                | 316    | 16/05/2022      | 69 300              | 62 370          | 20           | 06/01/2024             |                                 |                             | 6/01/24                     |                              | 3                    | 84%                   |                           | 90%                  | En cours | Rapport n°1 Mars 2022                                                                                                |
| C241          | Hebergement, maintenance et gestion du back office Follow AP                                                                                                          |        | 16/05/2022      | 16 200              | 16 200          | 18           | 07/11/2023             |                                 |                             | 7/11/23                     |                              | 1                    | 93%                   |                           | 100%                 | En cours | Application accessible en ligne                                                                                      |
| C243          | Projet "Biochar"                                                                                                                                                      | 304    | 01/06/2022      | 39 678              | 39 678          | 12           | 27/05/2023             |                                 | 7                           | 23/12/23                    | -3                           |                      | 77%                   |                           | 100%                 | En cours | Rapport intermédiaire Mai 2023                                                                                       |

moyenne PPECF → 92% 91%

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Délais dépassé de plus de 6 mois                    |
|  | Date non échue ou délais dépassé de moins de 6 mois |
|  | Contrat clôturé                                     |

## Contrats hors coaching PPECF III (en cours au 31 août 2023)

| N° de contrat | Libellé                                                                                                                                                               | N° DNO | Date de contrat | Montant contrat (€) | Montant liquidé | Durée (Mois) | Date de fin de contrat | Extension due au COVID19 (mois) | Avenant sur la durée (mois) | Date révisée fin de contrat | Dépassement de délais (mois) | Temps restant (mois) | %tage de temps écoulé | %tage exécution technique | %tage budget liquidé | Statut   | Observation CgP                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| C184          | Programme marketing de promotion des bois africains certifiés                                                                                                         | 255    | 21/04/2020      | 189 000             | 189 000         | 36           | 06/04/2023             |                                 |                             | 6/04/23                     |                              | -6                   | 117%                  |                           | 100%                 | Clôturé  | Rapport ATIBT sur le marketing en 2022 disponible |
| C185          | Projet Guide des arbres d'Afrique centrale                                                                                                                            | 220    | 29/05/2020      | 180 833             | 153 012         | 42           | 10/11/2023             |                                 | 12                          | 4/11/24                     |                              | 13                   | 68%                   | 50%                       | 85%                  | En cours | Rapport intermédiaire août 21 disponible          |
| C186          | Projet Guide des arbres d'Afrique centrale                                                                                                                            | 220    | 29/05/2020      | 229 236             | 131 193         | 42           | 10/11/2023             |                                 | 12                          | 4/11/24                     |                              | 13                   | 68%                   | 50%                       | 57%                  | En cours | Rapport intermédiaire août 21 disponible          |
| C189          | Développer de manière durable et responsable la filière « bois africains » à travers la promotion et la valorisation commerciales de ses produits légaux et certifiés | 259    | 29/09/2020      | 322 000             | 288 241         | 36           | 14/09/2023             |                                 |                             | 14/09/23                    |                              | -1                   | 102%                  |                           | 90%                  | En cours | Rapport ATIBT sur le marketing en 2021 disponible |
| C194          | Prolongation contrat des points focaux R. Congo                                                                                                                       | 267    | 01/11/2020      | 31 332              | 10 716          | 25           | 21/11/2022             | 4                               | 9                           | 16/12/23                    |                              | 3                    | 90%                   | NA                        | 34%                  | En cours | activité permanente                               |
| C195          | Prolongation contrat des points focaux Gabon                                                                                                                          | 267    | 01/11/2020      | 222 180             | 221 876         | 25           | 21/11/2022             | 4                               | 9                           | 16/12/23                    |                              | 3                    | 90%                   | NA                        | 100%                 | En cours | activité permanente                               |
| C196          | Prolongation contrat des points focaux RDC                                                                                                                            | 267    | 01/11/2020      | 33 332              | 10 716          | 25           | 21/11/2022             | 4                               |                             | 21/03/23                    |                              | -7                   | 126%                  | NA                        | 32%                  | En cours | activité permanente                               |
| C200          | Projet Thémis                                                                                                                                                         | 241    | 16/09/2021      | 12 750              | 10 500          | 20           | 09/05/2023             |                                 |                             | 9/05/23                     |                              | -5                   | 124%                  |                           | 82%                  | En cours | Rapport intermédiaire Oct 21 disponible           |
| C222          | Etude et test complémentaires promotion du Gombé                                                                                                                      | 268    | 02/02/2021      | 112 790             | 101 400         | 16           | 28/05/2022             |                                 |                             | 28/05/22                    | 16                           |                      | 203%                  | 70%                       | 90%                  | En cours | Rapport n°4 déc 21 disponible                     |
| C223          | Analyse cycle de vie produits en bois                                                                                                                                 | 224    | 29/03/2021      | 140 900             | 126 000         | 18           | 20/09/2022             |                                 |                             | 20/09/22                    | 13                           |                      | 170%                  |                           | 89%                  | En cours | Aucun rapport                                     |
| C224          | Actualisation du statut de vulnérabilité des espèces ligneuses exploitées en Afrique centrale                                                                         | 263    | 27/10/2021      | 116 130             | 96 760          | 12           | 22/10/2022             |                                 | 6                           | 20/04/23                    | 6                            |                      | 146%                  |                           | 83%                  | En cours | Rapport final transmis en mars 2023               |
| C228          | Technologie RFID                                                                                                                                                      | 283    | 11/10/2021      | 50 000              | 30 000          | 6            | 09/04/2022             |                                 |                             | 9/04/22                     | 18                           |                      | 401%                  |                           | 60%                  | En cours | Rapport de démarrage Décembre 2022                |
| C230          | Actualisation du statut de vulnérabilité des espèces ligneuses exploitées en Afrique centrale                                                                         | 263    | 27/10/2021      | 42 525              | 42 525          | 12           | 22/10/2022             |                                 |                             | 22/10/22                    | 12                           |                      | 196%                  |                           | 100%                 | Clôturé  | Rapport final disponible                          |
| C231          | Assistants numériques pour monitoring EFIR                                                                                                                            | 275    | 03/11/2021      | 204 425             | 204 425         | 12           | 29/10/2022             |                                 |                             | 29/10/22                    | 11                           |                      | 194%                  | 98%                       | 100%                 | Clôturé  | Rapport avancement n°3 oct 22 disponible          |

| N° de contrat  | Libellé                                                             | N° DNO | Date de contrat | Montant contrat (€) | Montant liquidé | Durée (Mois) | Date de fin de contrat | Extension due au COVID19 (mois) | Avenant sur la durée (mois) | Date révisée fin de contrat | Dépassement de délais (mois) | Temps restant (mois) | %tage de temps écoulé | %tage exécution technique | %tage budget liquidé | Statut   | Observation CgP                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------|
| C232           | Accompagnement des sociétés certifiées Focus Forest FSC             | 292    | 23/11/2021      | 156 713             | 47 014          | 14           | 17/01/2023             |                                 |                             | 17/01/23                    |                              | -9                   | 161%                  |                           | 30%                  | En cours | Rapport intermédiaire juin 22 disponible     |
| C236           | Valoriser les services écosystémiques des forêts du bassin du Congo | 265    | 21/04/2022      | 142 267             | 59 752          | 22           | 10/02/2024             |                                 |                             | 10/02/24                    |                              | 4                    |                       |                           | 42%                  | En cours | Rapport final transmis le 1er septembre 2023 |
| C238           | Réalisation de films et photos Fair&Precious                        | 302    | 21/02/2022      | 89 140              | 89 140          | 4,5          | 06/07/2022             |                                 |                             | 6/07/22                     | 15                           |                      | 436%                  |                           | 100%                 | Clôturé  | Film disponibles en ligne                    |
| C246           | Brigade faunes mixte                                                | 306    | 15/09/2022      | 122 400             | 40 000          | 24           | 04/09/2024             |                                 |                             | 4/09/24                     |                              | 11                   | 53%                   |                           | 33%                  | En cours | Aucun rapport                                |
| C247           | Brigade faunes mixte                                                | 306    | 15/10/2022      | 31 500              | 28 350          | 24           | 04/10/2024             |                                 |                             | 4/10/24                     |                              | 12                   | 49%                   |                           | 90%                  | En cours | Aucun rapport                                |
| C248           | Animation de la Commission Carbone de l'ATIBT                       | NA     | 01/10/2022      | 16 000              | 16 000          | 7            | 29/04/2023             |                                 |                             | 29/04/23                    |                              | -5                   | 174%                  |                           | 100%                 | En cours | Veille N° disponible Avril 2023              |
| C250           | Inventaire faune et HVC de Ngombé                                   | 321    | 15/11/2022      | 110 400             | 88 000          | 12           | 10/11/2023             |                                 |                             | 10/11/23                    |                              | 1                    | 89%                   |                           | 80%                  | En cours | Aucun rapport                                |
| C251           | Inventaire faune et HVC de Ngombé                                   | 321    | 21/11/2022      | 68 900              | 55 120          | 12           | 16/11/2023             |                                 |                             | 16/11/23                    |                              | 2                    | 88%                   |                           | 80%                  | En cours | Aucun rapport                                |
| C255           | Arbres monumentaux et ressources genetiques                         | 333    | 06/03/2023      | 159 801             | 135 831         | 18           | 27/08/2024             |                                 |                             | 27/08/24                    |                              | 11                   | 39%                   |                           | 85%                  | En cours | Aucun rapport                                |
| C257           | Infographie métiers de la certification                             | 330    | 22/03/2023      | 147 875             | 80 331          | 15           | 14/06/2024             |                                 |                             | 14/06/24                    |                              | 9                    | 43%                   |                           | 54%                  | En cours | Rapport PHASE 1 transmis en Juillet 2023     |
| C258           | Prolongation point focal PPECF au Gabon                             | 369    | 01/11/2022      | 108 700             | 92 750          | 12           | 27/10/2023             |                                 |                             | 27/10/23                    |                              | 1                    | 93%                   |                           | 85%                  | En cours |                                              |
| C259           | Rédaction guide pratique CCTP                                       | 328    | 23/03/2023      | 41 465              | 20 000          | 12           | 17/03/2024             |                                 |                             | 17/03/24                    |                              | 6                    | 54%                   |                           | 48%                  | En cours |                                              |
| C260           | Projet Thémis phase II                                              | 319    | 13/04/2023      | 67 660              | 38 146          | 18           | 04/10/2024             |                                 |                             | 4/10/24                     |                              | 12                   | 32%                   |                           | 56%                  | En cours |                                              |
| C261           | Service d'accompagnement GES standard PAFC                          | 354    | 17/04/2023      | 20 000              | 5 000           | 17           | 08/09/2024             |                                 |                             | 8/09/24                     |                              | 11                   | 33%                   |                           | 25%                  | En cours |                                              |
| C262           | Traduction en anglais et en mandarin le Guide Forestier             | 257    | 15/04/2023      | 155 818             | 20 118          | 15           | 08/07/2024             |                                 |                             | 8/07/24                     |                              | 9                    | 38%                   |                           | 13%                  | En cours |                                              |
| C263           | Appui coaching PAFC/FSC d'AEH                                       | 345    | 23/05/2023      | 423 900             | 64 334          | 18           | 13/11/2024             |                                 |                             | 13/11/24                    |                              | 14                   | 24%                   |                           | 15%                  | En cours |                                              |
| C264           | Appui coaching PAFC de GWI/BSG                                      | 353    | 03/05/2023      | 557 425             | 48 546          | 18           | 24/10/2024             |                                 |                             | 24/10/24                    |                              | 13                   | 28%                   |                           | 9%                   | En cours |                                              |
| C266           | Installation logiciel ASSALA                                        | 278    | 10/08/2023      | 180 000             | 27 000          | 17           | 01/01/2025             |                                 |                             | 1/01/25                     |                              | 15                   | 10%                   |                           | 15%                  | En cours |                                              |
| Moyenne PPECF→ |                                                                     |        |                 |                     |                 |              |                        |                                 |                             |                             |                              |                      | 89%                   |                           | 68%                  |          |                                              |



## 6. Recommandations

### 6.1 La CgP recommande toujours de :

- soutenir la promotion de nouvelles essences à travers des tests d'emplois. Il en va de la pérennité du système actuel de concession forestière certifiée ;
- poursuivre l'élaboration d'« outils » individuels ou collectifs (logiciels métiers, centre de ressources documentaires, fiches d'évaluation environnementales, guides, modules de formation en e-learning, monitoring, etc.) ;
- continuer à améliorer la valorisation des forêts du bassin du Congo, par une approche élargie à d'autres valeurs que le bois (séquestration du carbone, promotion média de la grande faune, chimie verte, etc.) ;
- après quatre années de travail sur la revalorisation de l'image des bois tropicaux du bassin du Congo, on peut considérer que le travail sur l'image de la filière est correctement engagé, et qu'il faut aujourd'hui, la renforcer par une démarche « mise en marché » plus directe et plus autonome tel qu'exprimé par la KfW dans son courriel du 9 mars 2023 qui engage l'ATIBT à proposer un plan de phasing out du soutien PPECF.

Par ailleurs le solde non engagé de la convention BMZ 2018 67 845 (diminué des DNOS en cours d'instruction ci-dessus), est estimé au 30 septembre 23, à 404.232 euros (voir ci-dessous) qui doivent être réservés, en priorité à de nouvelles entreprises, souhaitant bénéficier d'un appui coaching et/ou des avenants à des contrats en cours, et/ou de nouvelles requêtes des acteurs de la filière;

- profiter de l'évaluation externe du PPECF pour engager une réflexion sur une phase IV du Programme.

### 6.2 Prolongation du PPECF jusqu'à juin 2025

La COMIFAC et la KfW ont donné leur accord de principe à prolonger le contrat d'assistance technique Eco Consult et Oréade-Brèche (quasi à coûts constants), jusqu'à juin 2025.

Au 30 septembre 2023, le solde non engagé de la convention BMZ 2018 67 845 s'établit à : 1.334.171 euros ;

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Somme liquidé et non liquidé sur contrats au 30 septembre 23 : | 7.592.291 euros     |
| Somme des DNO en cours en attente avis de non objection        | 930.119 euros       |
| Total                                                          | 8.522.410 euros (1) |
| Budget PPECF III                                               | 8.926.642 euros (2) |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Solde non affecté au 30 septembre 2023 (2)-(1) | <b>404.232 euros</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|

Par ailleurs, une revue des contrats au 30 septembre 2023 montre que 22 contrats ne pourront pas être clôturés avant décembre 2023. Engagements auxquels, il faut encore ajouter quelques nouveaux contrats : 1) coaching SEFF (Groupe James) ; 2) coaching STC -Congo ; test de monitoring faune

par la bioacoustique ; études et avenants divers aux contrats. **Soit environ vingt-cinq contrats qui s'achèveront courant 2024** (voir tableau suivant pour leur date prévisionnelle de clôture).

PPECF II & III – 12<sup>ème</sup> rapport semestriel – avril 2023 à septembre 2023

| Identification au 30 septembre 23 des contrats à clôturer en 2024                  |                 |                                      |                              |              |                 |         | 30/09/2023 |            |             |             |                      |                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    | Code analytique | Montant contrat (ou prévision) Euros | Date de démarrage            | Durée (mois) | Liquidé €       | Solde € | Sept.23    | Octobre 23 | Novembre 23 | Décembre 23 | Montant pour AF n° 9 | Durée prévisionnelle de clôture à partir septembre 23 (mois) | Date prévisionnelle de clôture (colonne O) |
| Contrat C236 "Procédure FSC 30-006"                                                | R.1.1           | 142 267                              | 21/02/2022                   | 22           | 59 752          | 82 515  |            |            | 50 000      |             | 50 000               | 5                                                            | 29/02/2024                                 |
| Contrat C232 "Focus Forest"                                                        | R.1.1           | 156 173                              | 23/11/2022                   | 14           | 47 014          | 109 159 |            |            | 30 000      | 30 000      | 60 000               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| Contrat C228 "Technologie RFID"                                                    | R.1.1           | 50 000                               | 16/07/2021                   | 8            | 30 000          | 20 000  |            | 20 000     |             |             | 20 000               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| Contrat C262 mise en ligne et traduction "Guide de certification"                  | R.1.1           | 155 818                              | 15/04/2023                   | 15           | 20 118          | 135 700 |            |            | 60 000      |             | 60 000               | 4                                                            | 30/01/2024                                 |
| Contrat C257 "caractérisation des métiers de la certification" (infographie)       | R.1.1           | 147 875                              | Mars 23                      | 12           | 80 331          | 67 544  |            |            | 20 000      | 20 000      | 40 000               | 1                                                            | 5/11/2023                                  |
| Contrat C261"Hotline GES versus PAFC"                                              | R.1.1           | 20 000                               | Mars 23                      | 6            | 5 000           | 15 000  |            |            | 5 000       |             | 5 000                | 7                                                            | 30/04/2024                                 |
|                                                                                    |                 | 940 227                              |                              |              |                 |         | 0          | 20 000     | 160 000     | 50 000      | 235 000              |                                                              |                                            |
| Contrat C246 "Brigade mixte LAB Ivindo"                                            | R.2.1           | 122 400                              | 15/09/2022                   | 24           | 40 000          | 82 400  | 20 000     |            | 15 000      | 15 000      | 50 000               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| Contrat C245 " Appui à UNICONGO (impact nouveau régime en partage de production) " | R.2.1           | 35 000                               | Avril 23                     | 3            | 31 606          | 3 394   |            |            |             |             | 0                    | 0                                                            | clôturé                                    |
| Contrat C227 "Upgrading BSO vers PAFC"                                             | R.2.1           | 317 182                              | 20/09/2001                   | 26           | 247 554         | 69 628  |            |            | 40 000      |             | 40 000               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| Contrat C239 "Coaching KHLL"                                                       | R.2.1           | 194 325                              | 30/03/2022                   | 20           | 160 959         | 33 366  | 33 366     |            |             |             | 33 366               | 4                                                            | 26/01/2024                                 |
| Contrat C244 "Reprise coaching ASI"                                                | R.2.1           | 135 825                              | 07/11/2022                   | 18           | 74 217          | 61 608  |            | 20 000     |             | 10 000      | 30 000               | 6                                                            | 12/04/2024                                 |
| Contrat C253 "Upgrading BH vers PAFC"                                              | R.2.1           | 294 375                              | 04/11/2022                   | 24           | 215 007         | 79 368  | 15 000     |            | 15 000      | 20 000      | 50 000               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| Contrat C254 "Upgrading SBL vers PAFC"                                             | R.2.1           | 262 500                              | Mars                         | 18           | 51 877          | 210 623 |            | 30 000     | 40 000      |             | 70 000               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| Contrat C 263 "Coaching AEH"                                                       | R.2.1           | 423 900                              | Avril 23                     | 18           | 64 334          | 359 566 |            | 20 000     | 20 000      | 30 000      | 70 000               | 10                                                           | 31/07/2024                                 |
| Contrat C264 "Upgrading groupe BSG-GWI vers PAFC"                                  | R.2.1           | 557 425                              | Avril 23                     | 18           | 48 546          | 508 879 |            |            | 40 000      | 30 000      | 70 000               | 10                                                           | 31/07/2024                                 |
| Contrat C261 "hotline GES-PAFC"                                                    | R.2.1           | 20 000                               | 17/04/2023                   | 17           | 5 000           | 15 000  |            |            |             | 5 000       | 5 000                | 15                                                           | 30/12/2024                                 |
|                                                                                    |                 | 2 362 932                            |                              |              |                 |         | 68 366     | 70 000     | 170 000     | 110 000     | 418 366              |                                                              |                                            |
| Contrat C224 "Révision du statut de vulnérabilités CITES-UICN" Nature +            | R.2.5           | 116 130                              | 01/01/2021                   | 24           | 96 760          | 19 370  |            |            | 19 370      |             | 19 370               | 0                                                            | clôturé                                    |
| Contrat C222 "Promotion de l'essence Gombe"                                        | R.2.1           | 112 790                              | 01/01/2021                   | 24           | 101 400         | 11 390  |            | 11 390     |             |             | 11 390               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
|                                                                                    |                 | 271 445                              |                              |              |                 |         | 0          | 11 390     | 19 370      | 0           | 30 760               |                                                              |                                            |
| C250 (Inventaire Faune IFO) subvention IFO                                         | R.2.8           | 110 400                              | 15/11/2022                   | 12           | 88 000          | 22 400  |            | 22 400     |             |             | 22 400               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
| C251 (Inventaire faune IFO) subvention Nature +                                    | R.2.8           | 68 900                               | 15/11/2022                   | 12           | 55 120          | 13 780  |            | 13 780     |             |             | 13 780               | 6                                                            | 31/03/2024                                 |
|                                                                                    |                 | 179 300                              |                              |              |                 |         | 0          | 36 180     | 0           | 0           | 36 180               |                                                              |                                            |
| C255 "Arbres monumentaux"                                                          | R.2.9           | 290 500                              | Mars 23                      | 18           | 135 831         | 154 669 |            | 50 000     |             | 50 000      | 100 000              | 4                                                            | 30/01/2024                                 |
|                                                                                    | R.2.9           | 290 500                              |                              |              |                 |         | 0          | 50 000     | 0           | 50 000      | 100 000              |                                                              |                                            |
| Contrat C185 "Guides arbres d'Afrique centrale" [Nature +]                         | R.3.1           | 180 833                              | 29/05/2020                   | 42           | 153 012         | 27 821  |            |            | 27 821      |             | 27 821               | 5                                                            | 29/02/2024                                 |
| Contrat C186 "Guides arbres d'Afrique centrale" [Gembloux Agro biotech]            | R.3.1           | 229 236                              | 29/05/2020                   | 42           | 131 192         | 98 044  | 40 000     |            |             |             | 40 000               | 5                                                            | 29/02/2024                                 |
|                                                                                    |                 | 410 069                              |                              |              |                 |         | 40 000     | 0          | 27 821      | 0           | 67 821               | 11                                                           |                                            |
| Contrat C223 "Analyse cycle vie bois du bassin du Congo'                           | R.3.3           | 140 900                              | 29/03/2021                   | 18           | 126 000         | 14 900  |            |            | 14 900      |             | 14 900               | 0                                                            | clôturé                                    |
|                                                                                    |                 | 140 900                              |                              |              |                 |         | 0          | 0          | 14 900      | 0           | 14 900               |                                                              |                                            |
| Contrat C189 "Programme marketing de l'ATIBT"                                      | R.3.4           | 322 000                              | 29/09/2020                   | 36           | 288 241         | 33 759  |            |            | 20 000      |             | 20 000               | 2                                                            | 30/11/2023                                 |
| Contrat C200 "Plateforme Thémis" [LCB]                                             | R.3.4           | 12 750                               | 16/09/2021                   | 20           | 10 000          | 2 750   |            |            | 2 750       |             | 2 750                | 0                                                            | clôturé                                    |
| Contrat C260 "Themis Phase II" [Probos]                                            | R.3.4           | 67 660                               | Mars 23                      | 12           | 38 147          | 29 513  |            | 10 000     | 10 000      | 5 000       | 25 000               | 5                                                            | 29/02/2024                                 |
| Contrat C259 "CCTP"                                                                | R.3.4           | 41 465                               | Mars 23                      | 4            | 20 000          | 21 465  |            | 10 000     | 5 000       |             | 15 000               | 3                                                            | 30/12/2023                                 |
| "Programme marketing 23-24"                                                        | R.3.4           | 466 600                              | Avril 23                     | 12           | 0               | 466 600 |            |            |             | 80 000      | 80 000               | 1                                                            | 19/10/2023                                 |
|                                                                                    |                 | 1 263 925                            |                              |              |                 |         | 0          | 20 000     | 37 750      | 5 000       | 142 750              | 3                                                            | 30/12/2023                                 |
| Avenant contrat C195 "point focal Gabon"                                           | R.3.6           | 45 000                               | rétroactif à fin décembre 22 | 18 mois      | 0               | 45 000  | 10 000     | 20 000     | 4 500       | 4 500       | 39 000               | 1                                                            | 30/10/2023                                 |
|                                                                                    |                 | 45 000                               |                              |              |                 |         | 10 000     | 20 000     | 4 500       | 4 500       | 39 000               |                                                              |                                            |
| Audit financier années 2022                                                        | Imprévus        | 20 000                               |                              |              |                 |         |            |            | 20 000      |             | 20 000               | 4                                                            | 30/01/2024                                 |
|                                                                                    |                 | 20 000                               |                              |              |                 |         |            |            | 20 000      |             | 20 000               |                                                              |                                            |
| GRAND TOTAUX                                                                       |                 | 5 949 523                            |                              |              | Grand total --> |         | 118 366    | 191 390    | 454 341     | 219 500     | 1 068 597            |                                                              |                                            |

## 7. Récapitulatif des principales activités de l'assistance technique

### 7.1. Préparation/suivi des DNO

| Instruction de DNO par la CgP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |      |                                                                                              |                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Rappel du processus d'instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n° DNO                                                                                                | Item | Date envoi à la KFW                                                                          | Date ANO COMIFAC | Date ANO KFW            |
| Demande de financement (Bénéficiaire)<br>↓<br>Elaboration d'une grille d'évaluation préliminaire de la requête (CgP)<br>↓<br>Préparation de la DNO / Consolidation (CgP & Bénéficiaire)<br>↓<br>Soumission de la DNO à la KFW pour non objection (CgP)<br>↓<br>Suivi des ajustement/modifications éventuellement demandés (CgP, KFW/COMIFAC, Bénéficiaire)<br>↓<br>Contractualisation (CgP, KFW/COMIFAC, bénéficiaire) | → Rejet<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>→ Rejet<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>→ Rejet | 385  | Appui coaching de SUTG au Gabon                                                              | 13/09/23         | 15/09/23<br>En attente  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 384  | Renforcement ACNP                                                                            | 25/08/23         | 15/09/23<br>En attente  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 381  | 2ème subvention à UNICONGO Loi 30-2020                                                       | 02/06/23         | 20/06/23<br>01/08/23    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 379  | Avenants aux contrats C250 et C251 : inventaire faunique complet de la concession « Ngombe » | 19/05/23         | 20/06/23<br>En attente  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 377  | Avenant n° 3 C123 ALEFI                                                                      | 19/04/23         | 20/06/23<br>En attente  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 375  | Inventaire faune par bioacoustique & ADN environnemental à la CIB-OLAM                       | 28/05/23         | 20/06/23<br>En attente  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 372  | Montée en puissance PAFC-BC                                                                  | 22/05/23         | 20/06/23<br>En attente  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 368  | Coaching STC                                                                                 | 07/04/23         | 11/08/23<br>19/06/23    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 353  | Appui coaching vers la certification PAFC pour BSG et GWI                                    | 10/01/23         | En attente<br>03/05/23  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 352  | Poursuite du programme marketing Fair&Precious dans le cadre du PPECF III 2023-2024          | 11/10/22         | 2/11/2022<br>06/07/23   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 318  | Suite d'assistants numériques pour le monitoring de la faune en concession certifiée         | 24/05/22         | 23/09/2022<br>Objection |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | 303  | Coaching SEEF-Cameroun                                                                       | 06/06/23         | 19/07/23<br>27/06/2023  |

## 7.2. Participation de la CgP aux réunions

Durant la période d'avril 2023 à Septembre 2023, la CgP a assisté aux réunions suivantes :

| N° d'ordre de mission | Lieu/ Période                      | Objet                                                                                  | Participants CgP | Cible                  | Réalisations / Résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104                   | Douala<br>17 au 19<br>juillet 2023 | 12ème Atelier de concertation des Coordinations Nationales COMIFAC                     | Eric DASSIE      | COMIFAC et partenaires | <ul style="list-style-type: none"> <li>réflexion pour la mutation des Coordinations Nationales COMIFAC en des Représentations Nationales COMIFAC à l'instar de la RDC et ce, conformément à l'article 29 du Traité de la COMIFAC ;</li> <li>situation des dossiers transmis aux pays notamment les projets de textes fondamentaux (Traité, Statut du personnel, Règlement Intérieur du Conseil des Ministres, Règlement intérieur du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC), les rapports d'audit pour les exercices 2020 et 2021, la situation de paiement des contributions et des arriérées dues à la COMIFAC, etc. ;</li> <li>partage des leçons apprises sur les bonnes pratiques de gestion responsable des forêts dans le cadre de la certification forestière en Afrique centrale ;</li> <li>échange sur le processus des campagnes de collecte des données 2022-2023 de la COMIFAC ;</li> <li>réflexion sur le processus de révision du Plan de Convergence.</li> </ul> |
| 105                   | Douala<br>20 au 21<br>juillet 2023 | Atelier sous régional du Groupe de Travail Gouvernance Forestière (GTGF) de la COMIFAC | Eric DASSIE      | COMIFAC et partenaires | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation des conclusions du CFM-15 ;</li> <li>Décryptage des résolutions de la 17<sup>ème</sup> session du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) ;</li> <li>Examen du cadre Logique de l'initiative Tropical Timber Trade (TTT) dans le cadre du Dialogue Chine Afrique ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |      |      |               |       |                                                                                                                                                                            |
|----|------|------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Examen de la nouvelle norme Européenne sur la « zéro déforestation » ;</li> <li>Examens des projets des décisions CEMAC.</li> </ul> |
| NA | date | item | Romain LORENT | Cible | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participation à diverses réunions teams (ACNP-CITES/N+ ; Consultant Simon Charre)</li> </ul>                                        |

### 7.3. Missions de diagnostic dans le cadre du coaching PPECF

| Entreprise                                                                                                                               | Pays     | Superficie (Ha) | Date diagnostic | Evaluateurs           | Date ANO COMIFAC | Date ANO KFW |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| Société SEEF James                                                                                                                       | Cameroun | 107 972         | Avril 2023      | Alain TIOTSOP         | 19/07/23         | 27/06/2023   |
| Société SUTG                                                                                                                             | Gabon    | 249 989         | Août 2023       | H. MOUIDY / A WESTEEL | 15/09/23         | En attente   |
| Total superficies diagnostiquées sur le semestre (Ha)                                                                                    |          | 357 961         |                 |                       |                  |              |
| Total superficies admises au coaching sur le semestre : ANO obtenus pour les coachings STC ; BSG/GWI ; SEEF James et SUTG (ANO COMIFAC). |          | 1 353 412       |                 |                       |                  |              |
